



PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BUZIOS

Estrada da Usina, 600
Centro
Armação dos Búzios - RJ

Abaixo assinado a seguir, qualificando, vem requerer.

Data de Abertura: **30/05/2018**

Procedência: **EXTERNA**

6445/2018

Assunto: **PROCESSO ADMINISTRATIVO**

Código da Taxa:

Nome Requerente: **SEC. MUN. DE OBRAS**

CPF/CNPJ:

Endereço: **PRACA SANTOS DUMONT, 111**

Município: **Armação dos Búzios**

Cep: **28950-000**

Bairro: **CENTRO**

UF:

Telefone:

Email:

Sector Requerente:

Súmula:

**MEMORANDO N° 115/2018, SOLICITANDO PROCESSO PARA PAGAMENTO REFERENTE À
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA CANTO DO CÉU E RUA MORRO DAS EMERÊNCIAS
(PARTE) NO BAIRRO DE JOSÉ GONÇALVES
PROCESSO DE ORIGEM N° 611/2017
CONTRATADA: DAFLA CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E GERENCIAMENTOS LTDA EPP,
COM CNPJ N° 12.603.970/0001-60**

Assinatura Servidor

CRISTINE PEREIRA DE SALES
Auxiliar Administrativo
Matrícula: 1429


Assinatura Requerente

Consulte a posição do seu processo pelo site WWW.BUZIOS.RJ.GOV.BR - Tel.: (22) 2633-6000

Ine Pereira de Sales

Impresso por: -

Página 1 de 1



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO

PROCESSO Nº

Rubrica

Fls

10445/2018
02

Armação dos Búzios, 30 de maio de 2018

Memorando nº 115/2018

Do: Secretário Municipal de Obras e Saneamento

Paulo Abranches Guedes Junior


Para: Secretaria Municipal de Administração

Setor de Protocolo Geral


Ref.: Abertura de processo administrativo

Venho por meio deste, solicitar a abertura do *Processo de Pagamento* referente à **Pavimentação e Drenagem da Rua Canto do Céu e Rua Morro das Emergências (parte) no bairro José Gonçalves; Processo de Origem: 611/2017; Contratada: DAFLA CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E GERENCIAMENTO LTDA EPP (CNPJ: 12.603.970/0001-60)**. Após a abertura do mesmo, solicito que seja encaminhado para esta Secretaria.

Atenciosamente,


Paulo Abranches Guedes Junior
Secretário Municipal de Obras e Saneamento

Eng. Paulo Abranches
SECRETÁRIO DE OBRAS
E SANEAMENTO
Mat. 12.974



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Armação dos Búzios

Folha nº 03

Folha de Informação

Anexada ao Processo nº


6445, 2018

Rubrica do Funcionário

Informação

Pela retenção do ISSQN, sabendo que a alíquota aplicada sobre o valor de R\$ 43684,88 da NFS nº 01/2018, às fls 88, é de 5% (cinco por cento).


Em: 15/06/2018


Vitor Claudio R. Ferreira
Secretário Especial de Receita
Matrícula. nº 3796

À Diviss

Para atender ao despacho supra.


Em: 15/06/2018


Vitor Cláudio R. Ferreira
Secretário Especial de Receita
Matrícula. nº 3796

A SEMOB,

Para prosseguimento


Em 30/05/2018


Coordenador Administrativo
MAT. 16539
Secretaria de Governo

Ao Patrimônio

Para os devidos lançamentos.


Em 13/06/2018


João Pedro Souza
Gerente de Bancamentos
MAT. 13500

A SER

Após feito o devido lançamento, anexe a folha nº 88. Envio para prosseguimento


Em 05/06/18


Dux. Schim / Tel. 3594

A liquidação,

encaminho-lhe o presente processo, após de emitido o Certificado de Retenção das notas fiscais nº 04/18, fl. 89.

Em 18/06/18


Denivaldo Pereira Alves
Secretário de SO II
Matrícula Nº 198

A RESPOSTA,
PARA CONCLUIR A OPERAÇÃO
DE PAGAMENTO NO SICONV. DA
NF. N° 2018000000000004.
Em 25/06/2018.

Alberto F.V. Cordeiro
Sec. Especial de Trib. e Contab.
Matr. 1356

A S.E.R

Após feito o devido lança-
mento, anexe a folha n° 159.
Envio para encaminhamento.

Em 24/07/18

Vitor Claudio
Aux. Adm. Matr. 3594

INAO MACA

Para Retenção a ISEN

SABENDO QUE A ALÍQUOTA
A SER APLICADA SOBRE
O VALOR DE R\$ 192.213,70,
DA NAS - R N° 08/2018, A S
FOLHA 100, É DE 5% (CINCO
POR CÉNTIMO). Em 30/07/18.

Vitor Claudio R. Ferreira
Secretário Especial de Trib. e Contab.
Matrícula. n° 3796

A DIUISS,

PARA ATENDER AO
DE PAGO SUPRA.
Em 30/07/2018.

Vitor Claudio
Vitor Claudio R. Ferreira
Secretário Especial de Trib. e Contab.
Matrícula. n° 3796

A Liquidação

Foi emitido o Reci-
bo Demonstrativo pa-
ra Retenção do ISS
- Folhas n° 160 - lan-
çamento n° 1894666.

Em 31/07/2018

Marcelo Rodrigues de S. Cunha
Matr. n° 1386

A COFIS

Após feito o devido lança-
mento, anexe a folha n° 342
Envio para encaminhamento. O
lançamento refere-se a nota
de pagamento 203. Em 13/06/18

JUNTEI A FOLHA N°

EM: ____/____/____



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO

PEDIDO DE PAGAMENTO

☐ Prestação de Serviço ☒ Obras ☐ Compras ☐ Locação ☐ Concessionárias

Órgão contratante:

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO

DADOS GERAIS: (*) Informações Obrigatórias

01 - Empresa / Fornecedor: **DAFLA CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E GERENCIAMENTO LTDA-EPP**

02 - CNPJ: **12.603.970/0001-60**

03 - Endereço: **Estrada Francisco da Cruz Nunes, nº 8.180-Sala 210- Itaipu- Niterói/ RJ - 24.340-000**

04 - Telefone: -

05 - Processo de Origem: **611/2017**

06 - N.º do Empenho: **257/18 e 258/18**

07 - N.º do Contrato: **010/2018**

08 - Objeto do Contrato: **Pavimentação e Drenagem na Rua Canto do Céu e Rua Morro das Emergências (Parte)**

Nota: PIS - Obrigatório somente para prestadores de serviços autônomos.

DOCUMENTOS OBRIGATORIOS: (*) Informações Obrigatórias

09 - Doc. Fiscal n.º: *	☒ NF / NFe	☐ RPA	☐ Recibo
10 - Cópia da nota de empenho *	☒ Sim	☐ Não	
11 - Certidão Negativa de Débito (INSS)*	☒ Sim	☐ Não	
12 - Certidão de Regularidade Fiscal (CRF)*	☒ Sim	☐ Não	
13 - Extrato do Simples Nacional	☐ Sim	☐ Não	☒ Não aplicável
14 - Cópia do Contrato (quando houver)	☒ Sim	☐ Não	☐ Não aplicável
15 - Cópia da publicação do extrato de contrato	☐ Sim	☐ Não	☒ Não aplicável
16 - Publicação do fiscal responsável pelo contrato	☐ Sim	☐ Não	☒ Não aplicável
17 - Relatório da Prestação do Serviço/Obra	☒ Sim	☐ Não	☐ Não aplicável
18 - Observação adicional:			

Atenção: 1- O documento fiscal deverá estar atestado por 03 servidores da unidade contratante devidamente identificados;

2- O documento fiscal deverá se encontrar dentro do prazo de validade para emissão, a CND e a CRF deverão estar dentro do período de validade e o extrato do Simples Nacional, quando a empresa for optante, deverá ser o do mês anterior ao da emissão da nota fiscal.

Paulo Abranches Guedes Junior
Secretário Municipal de Obras e Saneamento

Eng. Paulo Abranches
SECRETÁRIO DE OBRAS
E SANEAMENTO
Mat. 12.974

DAFLA CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E GERENCIAMENTO LTDA-EPP

Armação dos Búzios, 11 de junho de 2018.

À Secretaria Municipal de Obras e Saneamento de Armação dos Búzios

OBRA: Pavimentação e Drenagem da Rua Canto do Céu e Morro das Emerências no bairro José Gonçalves

LOCAL: José Gonçalves

Venho através desta encaminhar a 1ª medição da obra de **Pavimentação e Drenagem da Rua Canto do Céu e Rua Morro das Emerências no bairro José Gonçalves** no valor de 134.842,88 (cento e trinta e quatro mil oitocentos e quarenta e dois reais e oitenta e oito centavos), conforme nota fiscal, planilha de medição, memória de cálculo.

Atenciosamente,

DAFLA CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E GERENCIAMENTO LTDA-EPP



ATESTADO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

Ref.: OBJETO: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA CANTO DO CÉU E RUA MORRO DAS EMERÊNCIAS (PARTE)

PROCESSO Nº: 611/2017

Atestamos que os serviços de fornecimento constantes na 1ª medição referente ao período de 09 de abril de 2018 a 24 de maio 2018, e a respectiva fatura, referentes ao contrato firmado entre o Município de Armação dos Búzios e a empresa DAFLA CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E GERENCIAMENTO LTDA-EPP, foram executados de acordo com as especificações contratuais entre as partes e dentro do padrão de qualidade aceito pela Administração.

Segue abaixo, relatório de prazos e valores contratuais:

Data de início contratual: 09/04/2018

Prazo: 12 meses.

TERMO DE OCORRÊNCIA

1. Tipo de ocorrência (*):

- ☐ Falta de funcionário
- ☐ Falta na execução dos serviços
- ☐ Falta de pontualidade
- ☐ Falta de material
- ☒ Outros
- ☐ Nada a registrar


(*) detalhar em relatório em anexo, se for o caso.

2. Valor a ser glosado na fatura mensal: _____ (se for o caso)

3. Valor total a pagar referente aos serviços prestados do mês de abril a maio de 2018, referente à 1ª medição: R\$ 134.842,88 (cento e trinta e quatro mil oitocentos e quarenta e dois reais e oitenta e oito centavos).

Recebimento efetuado em 02 (duas) vias, sendo uma para o processo e outra para a empresa contratada.

Armação dos Búzios, 13 de junho de 2018.


João Pedro Souza
Engenheiro Civil

João Pedro Souza
Gerente de Saneamento
Mat.: 13800



PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO


PORTARIA Nº 21, DE 24 DE ABRIL DE 2018

○ ***SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO*** da cidade de Armação dos Búzios, no uso das atribuições que conferem a legislação em vigor,

RESOLVE:

DESIGNAR, a contar de 09 de abril de 2018, o servidor João Pedro Santos de Souza, Engenheiro Civil, Portaria nº 453/2014, como fiscal da obra de **Pavimentação e Drenagem da Rua Canto do Céu e Rua Morro das Emergências (parte) no bairro José Gonçalves**. Processo Administrativo nº 611/2017, Ata de Concorrência Pública nº 005/2017.

Armação dos Búzios, 24 de Abril de 2018


Paulo Abranches Guedes Junior
Secretário Municipal de Obras e Saneamento



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



20180611u12603970000160

Número da Nota 201800000000004	Data e Hora de Emissão 11/06/2018 11:18:42	Competência 06/2018	Código de Verificação RFGB-HCDR
Exigibilidade Exigível em Armação dos Búzios/RJ	Localidade da Prestação Armação dos Búzios/RJ		

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 12.603.970/0001-60 Inscrição Municipal: 01531680
Nome/Razão Social: DAFLA CONSTRUCAO, SERVICOS E GERENCIAMEN
Endereço: FRANCISCO DA CRUZ NUNES 8180, 0210 - ITAIPU - CEP: 24340-000
Município: Niterói UF: RJ

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
CPF/CNPJ: 01.616.171/0001-02 Inscrição Municipal: ----
Endereço: ES da Usina Velha 600 - Centro - CEP: 28950-000
Município: Armação dos Búzios UF: RJ E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Objeto: Serviços de Recuperação da Estrada Morro das Emerências.

Nota Fiscal refere-se ao Pagamento da 1ª Medição.

Contrato: 831101/2016
Ministério da Integração Nacional

Valor da Nota Fiscal: R\$134.842,88
40% Mão de Obra: R\$ 53.937,15
60% Material: R\$ 80.905,73

Dados Bancários:
Caixa Econômica Federal
Ag: 3022
Op: 003
CC: 624-9

CNAE: 4213800 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
Subitem: 07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétric...

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 134.842,88

Valor Total das Deduções (R\$) 80.905,73	Base de Cálculo (R\$) 53.937,15	Alíquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 2.696,85	Crédito p/ Abatimento do IPTU 0,00
--	---	------------------------------	---------------------------------------	--

OUTRAS INFORMAÇÕES

- A legislação tributária de Niterói pode ser consultada em www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao
- O ISS desta NFS-e será RETIDO. (Competência JUN / 2018)
- Esta NFS-e não gera crédito. Serviço prestado em outro município.
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 132.146,03
- Departamento de Lançamento e Fiscalização - Rua da Conceição, 100 - Centro - 24020-082 - Niterói - RJ.
- PROCON: Rua Visc. de Sepetiba 519, Térreo, Centro, Niterói, Tel. 151. CODECON: Rua da Alfândega 08, Térreo, Centro, RJ, Tel. 0800 282-7060.

AUTENTICAÇÃO

[Handwritten signature]



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Contrato: 831101/2016

Pavimentação e Drenagem da Rua Canto do Céu e Rua Morro das Emerências (Parte)

Bairro: José Gonçalves

Sinapi Julho/2017

Não Desonerada

BDI = 20,97%

Contratada: Dafia Construção Serviços e Gerenciamento LTDA-EPP
Período: 09/04/2018 a 24/05/2018
Engenheiro Fiscal: João Pedro Souza

CONTRATO																	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO C/BDI	PREÇO TOTAL	1ª MEDIÇÃO			ACÚMULADO			SALDO			
ITEM	FONTE	CODIGO						Quant. Média	Valor Médio	% Média	Quant. Acumulada	Valor Acumulado	% Acumulada	Quant. Saldo	Valor Saldo	% Saldo	
1.1 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL							70.316,00	6.546,42			9,31%	6.546,42			9,31%	63.769,58	90,69%
1.1.1	COMP	COMP 21	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	%	100,00	703,16	70.316,00	9,31	6.546,42	9,31%	9,31	6.546,42	9,31%	90,69	63.769,58	90,69%	
1.2 CANTIEIRO DE OBRAS E SERVIÇOS PRELIMINARES							53.246,14	54.951,03			88,94%	54.951,03			88,94%	6.456,11	11,06%
1.2.1	SINAPI	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00	529,63	3.177,78	6,00	3.177,78	100,00%	6,00	3.177,78	100,00%	-	-	0,00%	
1.2.2	SINAPI	74220/001	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	M2	147,40	79,58	11.730,09	147,40	11.730,09	100,00%	147,40	11.730,09	100,00%	-	-	0,00%	
1.2.3	SINAPI	93208	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTIEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF 02/2016	M2	17,50	604,68	10.581,90	17,50	10.581,90	100,00%	17,50	10.581,90	100,00%	-	-	0,00%	
1.2.4	SINAPI	93212	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTIEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF 02/2016	M2	12,50	801,28	10.016,00	12,50	10.016,00	100,00%	12,50	10.016,00	100,00%	-	-	0,00%	
1.2.5	SINAPI	93207	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTIEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF 02/2016	M2	18,00	806,83	14.522,94	18,00	14.522,94	100,00%	18,00	14.522,94	100,00%	-	-	0,00%	
1.2.6	SINAPI	41598	ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AEREA TRIFÁSICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN	1,00	1.862,32	1.862,32	1,00	1.862,32	100,00%	1,00	1.862,32	100,00%	-	-	0,00%	
1.2.7	SINAPI	74022/013	ENSAIO DE COMPACTAÇÃO - AMOSTRAS TRABALHADAS - SOLOS	UN	5,00	211,43	1.057,15	-	-	0,00%	-	-	0,00%	5,00	1.057,15	100,00%	
1.2.8	SINAPI	73900/012	ENSAIOS DE CONCRETO ASFALTICO	T	12,53	66,34	831,24	-	-	0,00%	-	-	0,00%	12,53	831,24	100,00%	
1.2.9	SINAPI	74022/030	ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO	UN	24,00	190,28	4.566,72	-	-	0,00%	-	-	0,00%	24,00	4.566,72	100,00%	
1.3 - MOVIMENTO DE TERRA, CARGA, TRANSPORTE E DRENAGEM							853.314,69	76.405,43			11,70%	76.405,43			11,70%	576.909,26	88,30%
1.3.1	SINAPI	90106	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTENCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 01/2015	M3	1.862,43	13,25	24.677,20	125,01	1.656,38	6,71%	125,01	1.656,38	6,71%	1.737,42	23.020,82	93,29%	

João Pedro Souza
Gerente de Saneamento
Mat.: 13800



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Contrato: 831101/2016

Pavimentação e Drenagem da Rua Canto do Céu e Rua Morro das Emerências (Parte)

Bairro: José Gonçalves

Sinapi Julho/2017

Não Desonerada

BDI = 20,97%

Contratada: Dafra Construção Serviços e Gerenciamento LTDA-EPP
Período: 09/04/2018 a 24/05/2018
Engenheiro Fiscal: João Pedro Souza

CONTRATO																
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO C/BDI	PREÇO TOTAL	1ª MEDIÇÃO			ACUMULADO			SALDO		
								Quant. Medida	Valor Medido	% Medida	Quant. Acumulada	Valor Acumulado	% Acumulada	Quant. Saldo	Valor Saldo	% Saldo
1.3.2	SINAPI	90108	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE)UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 01/2015	M3	2.351,92	11,91	28.011,37	473,81	5.643,08	20,15%	473,81	5.643,08	20,15%	1.878,11	22.368,29	79,85%
1.3.3	SINAPI	93379	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 04/2016	M3	1.480,82	18,07	26.758,42	96,63	1.746,10	6,53%	96,63	1.746,10	6,53%	1.384,19	25.012,32	93,47%
1.3.4	SINAPI	93381	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 04/2016	M3	1.829,66	8,98	16.430,62	377,56	3.390,49	20,64%	377,56	3.390,49	20,64%	1.452,13	13.040,13	79,36%
1.3.5	SINAPI	72844	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)	T	744,13	0,81	602,75	243,02	196,85	32,66%	243,02	196,85	32,66%	501,11	405,90	67,34%
1.3.6	SINAPI	72887	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	M3XKM	2.480,46	1,17	2.902,14	810,09	947,81	32,66%	810,09	947,81	32,66%	1.670,37	1.954,33	67,34%
1.3.7	SINAPI	73817/001	EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - PO DE PEDRA 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	M3	204,86	112,30	23.005,78	34,33	3.855,26	16,76%	34,33	3.855,26	16,76%	170,53	19.150,52	83,24%
1.3.8	SINAPI	95566	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 12/2015	M	87,00	111,38	9.690,06	-	-	0,00%	-	-	0,00%	87,00	9.690,06	100,00%
1.3.9	SINAPI	92220	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 12/2015	M	716,01	163,97	117.404,15	120,00	19.676,40	16,76%	120,00	19.676,40	16,76%	596,01	97.727,75	83,24%

João Pedro Souza
Gerente de Sanamento
Mat.: 13800



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Contrato: 831101/2016

Pavimentação e Drenagem da Rua Canto do Céu e Rua Morro das Emergências (Parte)

Bairro: José Gonçalves

Sinapi Julho/2017

Não Desonerada

BDI = 20,97%

Contratada: Dafia Construção Serviços e Gerenciamento LTDA-EPP
Período: 09/04/2018 a 24/05/2018
Engenheiro Fiscal: João Pedro Souza

CONTRATO																
CONTRATO				1ª MEDIÇÃO				ACUMULADO				SALDO				
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL	Quant. Medida	Valor Medido	% Medida	Quant. Acumulada	Valor Acumulado	% Acumulada	Quant. Saldo	Valor Saldo	% Saldo
1.3.10	SINAPI	92221	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF. 12/2015	M	204,79	205,76	42.137,59	32,00	6.584,32	15,63%	32,00	6.584,32	15,63%	172,79	35.553,27	84,37%
1.3.11	SINAPI	92223	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF. 12/2015	M	404,46	302,09	122.183,32	58,00	17.521,22	14,34%	58,00	17.521,22	14,34%	346,46	104.662,10	85,66%
1.3.12	COMP	COMP 01	POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO (15 x 20 x 40cm) COM PAREDES DE 15CM, PARA REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS COM DIMENSÕES INTERNAS DE 1,20M X 1,20M X 1,50M	UN	1,00	1.882,14	1.882,14	1,00	1.882,14	100,00%	1,00	1.882,14	100,00%	-	-	0,00%
1.3.13	COMP	COMP 02	POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO (15 x 20 x 40cm) COM PAREDES DE 15CM, PARA REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS COM DIMENSÕES INTERNAS DE 1,20M X 1,20M X 2,00M	UN	3,00	2.318,96	6.956,88	1,00	2.318,96	33,33%	1,00	2.318,96	33,33%	2,00	4.637,92	66,67%
1.3.14	COMP	COMP 03	POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO (15 x 20 x 40cm) COM PAREDES DE 15CM, PARA REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS COM DIMENSÕES INTERNAS DE 1,50M X 1,50M X 1,90M	UN	1,00	2.675,53	2.675,53	-	-	0,00%	-	-	0,00%	1,00	2.675,53	100,00%
1.3.15	COMP	COMP 04	POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO (15 x 20 x 40cm) COM PAREDES DE 15CM, PARA REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS COM DIMENSÕES INTERNAS DE 2,00M X 2,00M X 1,20M	UN	1,00	2.691,29	2.691,29	-	-	0,00%	-	-	0,00%	1,00	2.691,29	100,00%
1.3.16	COMP	COMP 05	POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO (15 x 20 x 40cm) COM PAREDES DE 15CM, PARA REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS COM DIMENSÕES INTERNAS DE 2,00M X 2,00M X 2,08M	UN	1,00	3.268,48	3.268,48	-	-	0,00%	-	-	0,00%	1,00	3.268,48	100,00%
1.3.17	COMP	COMP 06	POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO (15 x 20 x 40cm) COM PAREDES DE 15CM, PARA REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS COM DIMENSÕES INTERNAS DE 1,20M X 1,20M X 2,14M	UN	1,00	2.379,77	2.379,77	-	-	0,00%	-	-	0,00%	1,00	2.379,77	100,00%
1.3.18	COMP	COMP 07	POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO (15 x 20 x 40cm) COM PAREDES DE 15CM, PARA REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS COM DIMENSÕES INTERNAS DE 2,00M X 2,00M X 1,87M	UN	1,00	3.128,77	3.128,77	-	-	0,00%	-	-	0,00%	1,00	3.128,77	100,00%
1.3.19	COMP	COMP 08	POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO (15 x 20 x 40cm) COM PAREDES DE 15CM, PARA REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS COM DIMENSÕES INTERNAS DE 2,00M X 2,00M X 1,60M	UN	3,00	2.952,56	8.857,68	-	-	0,00%	-	-	0,00%	3,00	8.857,68	100,00%

João Pedro Souza
Gerente de Planejamento
Mat. 1380



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Contrato: 831101/2016

Pavimentação e Drenagem da Rua Canto do Céu e Rua Morro das Emerências (Parte)

Bairro: José Gonçalves

Sinapi Julho/2017

Não Desonerada

BDI = 20,97%

Contratada: Dalia Construção Serviços e Gerenciamento LTDA-EPP
Período: 09/04/2018 a 24/05/2018
Engenheiro Fiscal: João Pedro Souza

CONTRATO																
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO (C/ BDI)	PREÇO TOTAL	1ª MEDIÇÃO			ACUMULADO			SALDO		
								Quant. Medida	Valor Medido	% Medida	Quant. Acumulada	Valor Acumulado	% Acumulada	Quant. Saldo	Valor Saldo	% Saldo
1.3.20	COMP	COMP 09	POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO (15 x 20 x 40cm) COM PAREDES DE 15CM, PARA REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS COM DIMENSÕES INTERNAS DE 2,00M X 2,00M X 1,50M	UN	4,00	2.885,74	11.542,96	3,00	8.657,22	75,00%	3,00	8.657,22	75,00%	1,00	2.885,74	25,00%
1.3.21	COMP	COMP 10	POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO (15 x 20 x 40cm) COM PAREDES DE 15CM, PARA REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS COM DIMENSÕES INTERNAS DE 1,20M X 1,20M X 1,20M	UN	10,00	2.003,01	20.030,10	-	-	0,00%	-	-	0,00%	10,00	20.030,10	100,00%
1.3.22	COMP	COMP 11	POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO (15 x 20 x 40cm) COM PAREDES DE 15CM, PARA REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS COM DIMENSÕES INTERNAS DE 1,50M X 1,50M X 2,50M	UN	1,00	2.973,22	2.973,22	-	-	0,00%	-	-	0,00%	1,00	2.973,22	100,00%
1.3.23	COMP	COMP 12	POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO (15 x 20 x 40cm) COM PAREDES DE 15CM, PARA REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS COM DIMENSÕES INTERNAS DE 1,50M X 1,50M X 1,20M	UN	13,00	2.329,20	30.279,60	1,00	2.329,20	7,69%	1,00	2.329,20	7,69%	12,00	27.950,40	92,31%
1.3.24	COMP	COMP 13	POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO (15 x 20 x 40cm) COM PAREDES DE 15CM, PARA REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS COM DIMENSÕES INTERNAS DE 1,50M X 1,50M X 1,30M	UN	1,00	2.383,86	2.383,86	-	-	0,00%	-	-	0,00%	1,00	2.383,86	100,00%
1.3.25	COMP	COMP 14	POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO (15 x 20 x 40cm) COM PAREDES DE 15CM, PARA REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS COM DIMENSÕES INTERNAS DE 1,50M X 1,50M X 2,00M	UN	1,00	2.724,11	2.724,11	-	-	0,00%	-	-	0,00%	1,00	2.724,11	100,00%
1.3.26	COMP	COMP 15	POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO (15 x 20 x 40cm) COM PAREDES DE 15CM, PARA REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS COM DIMENSÕES INTERNAS DE 1,20M X 1,20M X 1,30M	UN	1,00	2.039,50	2.039,50	-	-	0,00%	-	-	0,00%	1,00	2.039,50	100,00%
1.3.27	SINAPI	83627	TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P = CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E	UN	43,00	619,17	26.624,31	-	-	0,00%	-	-	0,00%	43,00	26.624,31	100,00%

João Pedro Souza
Gerente de Sanamento
Data: 13/05/18



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Contrato: 831101/2016

Pavimentação e Drenagem da Rua Canto do Céu e Rua Morro das Emergências (Parte)

Bairro: José Gonçalves

Sinapi Julho/2017

Não Desonerada

BDI = 20,97%

Contratada: Dafla Construção Serviços e Gerenciamento LTDA-EPP

Período: 09/04/2018 a 24/05/2018

Engenheiro Fiscal: João Pedro Souza

CONTRATO																
				1ª MEDIÇÃO					ACUMULADO				SALDO			
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO C/BDI	PREÇO TOTAL	Quant. Média	Valor Média	% Média	Quant. Acumulada	Valor Acumulado	% Acumulada	Quant. Saldo	Valor Saldo	% Saldo
1.3.28	COMP	COMP 16	CAIXA DE RALO EM CONCRETO PRE-MOLDADO, COM PAREDE DE 0,06M, NAS DIMENSÕES INTERNAS DE (0,30X0,90X0,90)M, PARA AGUAS PLUVIAIS, COM BASE EM CONCRETO SIMPLES (FCk=11 MPa), PREENCHIMENTO DA PERIFERIA DA GRELHA EM CONCRETO SIMPLES (FCk=15 MPa), REJUNTE DA BOLSA DO TUBO E DO PESCOÇO DA CAIXA PRE-MOLDADA EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:4, EM VOLUME, GRELHA DE FERRO FUNDIDO DE 135KG, EXCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO (DESONERADO)	UN	86,00	820,63	70.574,18	-	-	0,00%	-	-	0,00%	86,00	70.574,18	100,00%
1.3.29	COMP	COMP 17	CAIXA DE AREIA PARA RETENÇÃO DE RESÍDUOS EXECUADA EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL (14 X 19 X 29 CM) COM DIMENSÕES DE 6,00M X 1,20M E TAMPA ESTRUTURADA COM PERFIS METÁLICOS	UN	4,00	3.482,46	13.929,84	-	-	0,00%	-	-	0,00%	4,00	13.929,84	100,00%
1.3.30	SINAPI	85366	DEMOLICAO MANUAL DE PAVIMENTACAO EM CONCRETO ASFALTICO, ESPESSURA 5CM	M2	285,00	31,35	8.934,75	-	-	0,00%	-	-	0,00%	285,00	8.934,75	100,00%
1.3.31	COMP	COMP 20	ARRANCAMENTO E REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS COM LIMPEZA DE BETUME, ADERENTE SOBRE COLCHAO DE PO-DE-PEDRA, INCLUINDO FORNECIMENTO DO PO-DE-PEDRA, EXCLUSIVE REJUNTAMENTO E FORNECIMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS.	M2	312,00	50,11	15.634,32	-	-	0,00%	-	-	0,00%	312,00	15.634,32	100,00%
1.4 - PAVIMENTAÇÃO							573.662,91	0,00	0,00%	0,00%	0,00	573.662,91	0,00%			100,00%
1.4.1	SINAPI	74154/001	ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M3, DMT 50 A 200M	M3	1.253,31	5,06	6.341,75	-	-	0,00%	-	-	0,00%	1.253,31	6.341,75	100,00%
1.4.2	SINAPI	72844	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)	T	2.443,95	0,81	1.979,60	-	-	0,00%	-	-	0,00%	2.443,95	1.979,60	100,00%
1.4.3	SINAPI	72887	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	M3XKM	8.146,51	1,17	9.531,42	-	-	0,00%	-	-	0,00%	8.146,51	9.531,42	100,00%
1.4.4	SINAPI	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	6.266,58	1,49	9.337,20	-	-	0,00%	-	-	0,00%	6.266,58	9.337,20	100,00%
1.4.5	SINAPI	73817/001	EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - PO DE PEDRA	M3	626,65	112,30	70.372,80	-	-	0,00%	-	-	0,00%	626,65	70.372,80	100,00%
1.4.6	SINAPI	73711	BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA CORRIDA, INCLUSIVE COMPACTACAO	M3	626,65	114,76	71.914,35	-	-	0,00%	-	-	0,00%	626,65	71.914,35	100,00%

João Pedro Souza
Gerente de Planejamento
Raf. 13800



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Contrato: 831101/2016

Pavimentação e Drenagem da Rua Canto do Céu e Rua Morro das Emerências (Parte)

Bairro: José Gonçalves

Sinapi Julho/2017

Não Desonerada

BDI = 20,97%

Contratada: Dafra Construção Serviços e Gerenciamento LTDA-EPP
Período: 09/04/2018 a 24/05/2018
Engenheiro Fiscal: João Pedro Souza

CONTRATO																
CONTRATO			1ª MEDIÇÃO				ACUMULADO				SALDO					
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO C/BDI	PREÇO TOTAL	Quant. Medida	Valor Medido	% Medida	Quant. Acumulada	Valor Acumulado	% Acumulada	Quant. Saldo	Valor Saldo	% Saldo
1.4.7	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	2.396,36	43,20	103.522,75	-	-	0,00%	-	-	0,00%	2.396,36	103.522,75	100,00%
1.4.8	SINAPI	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	180,50	48,06	8.674,83	-	-	0,00%	-	-	0,00%	180,50	8.674,83	100,00%
1.4.9	SINAPI	72945	IMPRIMAÇÃO DE BASE DE PAVIMENTAÇÃO COM ADP CM-30	M2	6.266,58	5,05	31.646,23	-	-	0,00%	-	-	0,00%	6.266,58	31.646,23	100,00%
1.4.10	SINAPI	95993	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 4,0 CM EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	250,66	1.034,82	259.387,98	-	-	0,00%	-	-	0,00%	250,66	259.387,98	100,00%
1.4.11	SINAPI	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	20,00	47,70	954,00	-	-	0,00%	-	-	0,00%	20,00	954,00	100,00%
1.5 - CALÇADA							66.080,48	0,00		0,00%	0,00		0,00%	66.080,48		100,00%
1.5.1	SINAPI	85422	PREPARO MANUAL DE TERRENO S/ RASPAGEM SUPERFICIAL	M2	1.198,18	9,64	11.550,46	-	-	0,00%	-	-	0,00%	1.198,18	11.550,46	100,00%
1.5.2	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	95,85	568,91	54.530,02	-	-	0,00%	-	-	0,00%	95,85	54.530,02	100,00%
1.6 - SINALIZAÇÃO VIÁRIA							26.129,88	0,00		0,00%	0,00		0,00%	26.129,88		100,00%
1.6.1	SINAPI	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	352,22	26,02	9.164,76	-	-	0,00%	-	-	0,00%	352,22	9.164,76	100,00%
1.6.2	COMP	COMP 18	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NÚM 16 COM PINTURA REFLETIVA - FORNECIMENTO E FIXAÇÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, EXCLUSIVE O TUBO	M2	8,04	946,24	7.607,77	-	-	0,00%	-	-	0,00%	8,04	7.607,77	100,00%
1.6.3	COMP	COMP 19	TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, COM DIÂMETRO DE 2", DIN-2440. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	155,00	60,37	9.357,35	-	-	0,00%	-	-	0,00%	155,00	9.357,35	100,00%
TOTAL							1.447.850,10	134.842,88		9,31%	134.842,88		9,31%	1.313.007,22		90,69%

João Pedro Souza
Gerente de Saneamento
Mat. 13600



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

MEMÓRIA DE CÁLCULO - 1ª MEDIÇÃO

Pavimentação e Drenagem da Rua Canto do Céu e Rua Morro das Emergências (Parte)

Bairro José Gonçalves

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.1.1 COMP 21 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

9,31 %

COD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PR. UNITÁRIO	PR. TOTAL
2707	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO	H	2,80	R\$ 105,12	R\$ 294,34
4069	MESTRE DE OBRAS	H	5,60	R\$ 53,85	R\$ 301,56
				TOTAL UNITÁRIO	R\$ 595,90

CANTEIRO DE OBRAS E SERVIÇOS PRELIMINARES

1.2.1 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO

6,00 M2

Quantidade 1 x Altura 2,00m x Largura 3,00m = 6,00m²

1.2.2 74220/1 TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X

147,40 M2

67,00m x 2,20m = 147,40m²

1.2.3 93208 EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016

17,50 M2

1 unidade x 5,00m x 3,50m = 17,50m²

1.2.4 93212 EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016

12,50 M2

1 unidade x 2,50m x 5,00m = 12,50m²

1.2.5 93207 EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

18,00 M2

1 unidade x 6,00m x 3,00m = 18,00m²

1.2.6 41598 ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA TRIFÁSICA 40A EM POSTE MADEIRA

1,00 UN

1.2.7 74022/13 ENSAIO DE COMPACTAÇÃO - AMOSTRAS TRABALHADAS - SOLOS

UN

Segundo o método DNER-ME 049 deve ser coletada uma amostra para cada 300m de pista, porém para áreas menores que 4.000m² o número mínimo de amostras é de 5.

JOÃO PEDRO SOUZA
Gerente de Planejamento
Matr. 13808



MEMÓRIA DE CÁLCULO - 1ª MEDIÇÃO

Pavimentação e Drenagem da Rua Canto do Céu e Rua Morro das Emerências (Parte)

Bairro José Gonçalves

1.2.8 73900/12 ENSAIO DE CONCRETO ASFALTICO

Massa de CBUQ Taxa de ensaio Total
0,00 T x 5,00% = 0,00 T

1.2.9 74022/30 ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO

Volume do Caminhão 8,00 m³ 2 amostras/caminhão x 0 caminhões = 0 amostras

Amostras por caminhão 2 unidades

Volume de Concreto das calçadas 0,00 m³ 1ª Amostra - 21 dias 2ª Amostra - 28 dias

MOVIMENTO DE TERRA, CARGA, TRANSPORTE E DRENAGEM

1.3.1 90106 ESCAVACÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

Anexo Memória de Cálculo das Escavações, Reaterros, Embasamento

= 125,01 m³

125,01 M3

1.3.2 90108 ESCAVACÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

Anexo Memória de Cálculo das Escavações, Reaterros, Embasamento

= 473,81 m³

473,81 M3

1.3.3 93379 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

Anexo Memória de Cálculo das Escavações, Reaterros, Embasamento

= 96,63 m³

96,63 M3

1.3.4 93381 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

Anexo Memória de Cálculo das Escavações, Reaterros, Embasamento

= 377,56 m³

377,56 M3

1.3.5 72844 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)

Terra Volume a Carregar 124,63 m³ x Empolamento (%) 1,30 m³/m³ x Total 1,50 T/m³ = 243,02 T

243,02 T

1.3.6 72887 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA

Carga 124,63 m³ x Distância Média 6,50 km = 810,09 m³ x Km

810,09 M3XKM

JOÃO PAULO BOMBA
Gerente de Planejamento
RFB-13804



MEMÓRIA DE CÁLCULO - 1ª MEDIÇÃO

Pavimentação e Drenagem da Rua Canto do Céu e Rua Morro das Emerências (Parte)

Bairro José Gonçalves

1.3.7	73817/1	EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - PO DE PEDRA			34,33	M3
		Anexo Memória de Cálculo das Escavações, Reaterros, Embasamento	=	34,33 m³		
1.3.8	95566	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015			0,00	M
		Anexo Memória de Cálculo das Escavações, Reaterros, Embasamento	=	0,00 m³		
1.3.9	92220	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015			120,00	M
		Anexo Memória de Cálculo das Escavações, Reaterros, Embasamento	=	120,00 m³		
1.3.10	92221	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015			32,00	M
		Anexo Memória de Cálculo das Escavações, Reaterros, Embasamento	=	32,00 m³		
1.3.11	92223	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015			58,00	M
		Anexo Memória de Cálculo das Escavações, Reaterros, Embasamento	=	58,00 m³		
1.3.12	COMP 01	POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO (15 x 20 x 40cm) COM PAREDES DE 15CM, PARA REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS COM DIMENSÕES INTERNAS DE 1,20M X 1,20M X 1,50M			1,00	UN
		PV 38				
1.3.13	COMP 02	POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO (15 x 20 x 40cm) COM PAREDES DE 15CM, PARA REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS COM DIMENSÕES INTERNAS DE 1,20M X 1,20M X 2,00M			1,00	UN
		PV 37				
1.3.14	COMP 03	POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO (15 x 20 x 40cm) COM PAREDES DE 15CM, PARA REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS COM DIMENSÕES INTERNAS DE 1,50M X 1,50M X 1,90M			0,00	UN
1.3.15	COMP 04	POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO (15 x 20 x 40cm) COM PAREDES DE 15CM, PARA REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS COM DIMENSÕES INTERNAS DE 2,00M X 2,00M X 1,20M			0,00	UN
1.3.16	COMP 05	POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO (15 x 20 x 40cm) COM PAREDES DE 15CM, PARA REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS COM DIMENSÕES INTERNAS DE 2,00M X 2,00M X 2,08M			0,00	UN
1.3.17	COMP 06	POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO (15 x 20 x 40cm) COM PAREDES DE 15CM, PARA REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS COM DIMENSÕES INTERNAS DE 1,20M X 1,20M X 2,14M			0,00	UN

JOÃO PAULO SOUZA
Secretário de Planejamento
RFA-123800



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

MEMÓRIA DE CÁLCULO - 1ª MEDIÇÃO

Pavimentação e Drenagem da Rua Canto do Céu e Rua Morro das Emerências (Parte)

Bairro José Gonçalves

1.3.18	COMP 07	POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO (15 x 20 x 40cm) COM PAREDES DE 15CM, PARA REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS COM DIMENSÕES INTERNAS DE 2,00M X 2,00M X 1,87M	0,00	UN
1.3.19	COMP 08	POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO (15 x 20 x 40cm) COM PAREDES DE 15CM, PARA REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS COM DIMENSÕES INTERNAS DE 2,00M X 2,00M X 1,60M	0,00	UN
1.3.20	COMP 09	POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO (15 x 20 x 40cm) COM PAREDES DE 15CM, PARA REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS COM DIMENSÕES INTERNAS DE 2,00M X 2,00M X 1,50M	3,00	UN
	PV 27			
	PV 28			
	PV 15			
1.3.21	COMP 10	POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO (15 x 20 x 40cm) COM PAREDES DE 15CM, PARA REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS COM DIMENSÕES INTERNAS DE 1,20M X 1,20M X 1,20M	0,00	UN
1.3.22	COMP 11	POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO (15 x 20 x 40cm) COM PAREDES DE 15CM, PARA REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS COM DIMENSÕES INTERNAS DE 1,50M X 1,50M X 2,50M	0,00	UN
1.3.23	COMP 12	POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO (15 x 20 x 40cm) COM PAREDES DE 15CM, PARA REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS COM DIMENSÕES INTERNAS DE 1,50M X 1,50M X 1,20M	1,00	UN
	PV 14			
1.3.24	COMP 13	POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO (15 x 20 x 40cm) COM PAREDES DE 15CM, PARA REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS COM DIMENSÕES INTERNAS DE 1,50M X 1,50M X 1,30M	0,00	UN
1.3.25	COMP 14	POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO (15 x 20 x 40cm) COM PAREDES DE 15CM, PARA REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS COM DIMENSÕES INTERNAS DE 1,50M X 1,50M X 2,00M	0,00	UN
1.3.26	COMP 15	POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO (15 x 20 x 40cm) COM PAREDES DE 15CM, PARA REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS COM DIMENSÕES INTERNAS DE 1,20M X 1,20M X 1,30M	0,00	UN
1.3.27	83627	TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P = CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	0,00	UN
1.3.28	COMP 16	CAIXA DE RALO EM CONCRETO PRE-MOLDADO, COM PAREDE DE 0,06M, NAS DIMENSÕES INTERNAS DE (0,30X0,90X0,90M, PARA ÁGUAS PLUVIAIS, COM BASE EM CONCRETO SIMPLES (FCK=11 MPa), PREENCHIMENTO DA PERIFERIA DA GRELHA EM CONCRETO SIMPLES (FCK=15 MPa), REJUNTE DA BOLSA DO TUBO E DO PESCOÇO DA CAIXA PRE-MOLDADA EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:4, EM VOLUME, GRELHA DE FERRO FUNDIDO DE 135KG, EXCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO.(DESONERADO)	0,00	UN
1.3.29	COMP 17	CAIXA DE AREIA PARA RETENÇÃO DE RESÍDUOS EXECUADA EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL (14 X 19 X 29 CM) COM DIMENSÕES DE 6,00M X 1,00M X 1,20M E TAMPA ESTRUTURADA COM PERFIS METÁLICOS	0,00	UN
1.3.30	85366	DEMOLICAO MANUAL DE PAVIMENTACAO EM CONCRETO ASFALTICO, ESPESSURA 5CM	0,00	M2
1.3.31	COMP 20	ARRANCAMENTO E REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS COM LIMPEZA DE BETUME, ADERENTE SOBRE COLCHAO DE PO-DE-PEDRA, INCLUINDO FORNECIMENTO DO PO-DE-PEDRA, EXCLUSIVE REJUNTAMENTO E FORNECIMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS.(DESONERADO)	0,00	M2

João Pedro Souza
Gerente de Sanitário
Matr. 13889

Pavimentação e Drenagem da Rua Canto do Céu e Rua Morro das Emergências (Parte)

Bairro José Gonçalves

PAVIMENTAÇÃO

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Observações
1.4.1	74154/1 ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CAÇAMBA 6M3, DMT 50'A 200M	6.266,58m³ x 0,20m = 1.253,31m³			M3
1.4.2	72844 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MÃO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)				0,00 T
1.4.3	72887 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA				0,00 M3XKM
1.4.4	72961 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA				0,00 M2
1.4.5	73817/1 EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - PO DE PEDRA				0,00 M3
1.4.6	73711 BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA CORRIDA, INCLUSIVE COMPACTACAO				0,00 M3
1.4.7	94273 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016				0,00 M
1.4.8	94274 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016				0,00 M
1.4.9	72945 IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM ADP CM-30				0,00 M2
1.4.10	95993 CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 4,0 CM EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017				0,00 M3

$$0,00\text{m}^2 \times 0,04\text{m} = 0,00\text{m}^3$$

60-7000-1000



MEMÓRIA DE CÁLCULO - 1ª MEDIÇÃO

Pavimentação e Drenagem da Rua Canto do Céu e Rua Morro das Emerências (Parte)

Bairro José Gonçalves

1.4.11 94281 EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 0,00 M

CALÇADAS E GRAMADOS

1.5.1 85422 PREPARO MANUAL DE TERRENO S/ RASPAGEM SUPERFICIAL 1.198,18m² 0,00 M2

1.5.2 94991 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 0,00 M3

1.198,18m² x 0,08m = 95,85m³

SINALIZAÇÃO VIÁRIA

1.6.1 72947 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO 0,00 M2


	Extensão	Largura média	Quantidade	Área
Rua Morro das Emerências Contínua	515,68 m x	0,10 m x	2,00 =	103,13m²
Rua Morro das Emerências Seccionada 1:3	515,68 m x	0,10 m x	1,00 =	13,75m²
Rua Canto do Céu Contínua	682,50 m x	0,10 m x	2,00 =	136,50m²
Rua Canto do Céu Seccionada	682,50 m x	0,10 m x	1,00 =	18,20m²

	Área	Quantidade
Travessias - Rua Morro das Emerências	13,44m²	2,00 =
Travessias - Rua Canto do Céu	13,44m²	4,00 =

1.6.2 COMP 18 PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA - FORNECIMENTO E FIXAÇÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, EXCLUSIVE O TUBO 0,00 M2

Placa	Quant.	Dimensões	Área	Área total
 30 9 Velocidade máxima permitida	15 unidades	D= 40cm	0,12	1,8
 5-6a Proibido Estacionar	16 unidades	D= 40cm	0,12	1,92
 28 Sentido Duplo de Circulação	9 unidades	D= 40cm	0,12	1,08


JOSE PEDRO SOUZA
MUNICÍPIO DE Búzios
16/07/2016



MEMÓRIA DE CÁLCULO - 1ª MEDIÇÃO

Pavimentação e Drenagem da Rua Canto do Céu e Rua Morro das Emerências (Parte)


Bairro José Gonçalves

	2 unidades	D= 40cm	0,12	0,24
	16 unidades	50cm x 25cm	0,125	2
	2 unidades	50cm x 50cm	0,25	0,5
	2 unidades	50cm x 50cm	0,25	0,5
				8,04

1.6.3 COMP 19 TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, COM DIÂMETRO DE 2", DIN-2440. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (DESONERADO)

0,00 M

62 placas x 2,50m = 155,00m



 João Pedro Gonçalves
 Gerente de Engenharia
 15/07/2020




Pavimentação e Drenagem da Rua Canto do Céu e Rua Morro das Emergências (Parte)
Bairro: José Gonçalves
Sinapi Julho/2017

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS Búzios
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO														
	1º MES	2º MES	3º MES	4º MES	5º MES	6º MES	7º MES	8º MES	9º MES	10º MES	11º MES	12º MES	TOTAL	%
1.1 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 6.546,42	R\$ 3.332,98	R\$ 3.332,98	R\$ 3.332,98	R\$ 3.332,98	R\$ 3.332,98	R\$ 3.332,98	R\$ 3.332,98	R\$ 3.332,98	R\$ 3.332,98	R\$ 3.332,98	R\$ 3.332,98	R\$ 70.316,00	4,88%
1.2 CANTIERO DE OBRAS E SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 61.691,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 59.346,14	4,03%
1.3 - MOVIMENTO DE TERRA, CARGA, TRANSPORTE E DRENAGEM	R\$ 76.405,43	R\$ 65.331,47	R\$ 65.331,47	R\$ 65.331,47	R\$ 65.331,47	R\$ 65.331,47	R\$ 65.331,47	R\$ 65.331,47	R\$ 65.331,47	R\$ 65.331,47	R\$ 65.331,47	R\$ 65.331,47	R\$ 653.814,60	45,12%
1.4 - PAVIMENTAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 573.652,91	39,62%
1.5 - CALÇADA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 65.000,46	4,50%
1.6 - SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 28.129,89	1,80%
	R\$ 138.842,86	R\$ 68.664,45	R\$ 68.664,45	R\$ 68.664,45	R\$ 68.664,45	R\$ 68.664,45	R\$ 68.664,45	R\$ 68.664,45	R\$ 68.664,45	R\$ 68.664,45	R\$ 68.664,45	R\$ 68.664,45	R\$ 1.447.850,10	100,00%

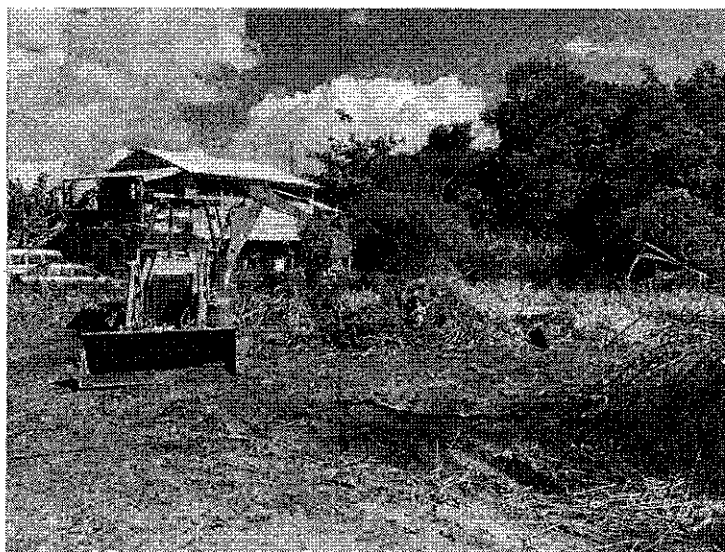

João Pedro Souza
Gerente de Sanamento
Mat. 1360



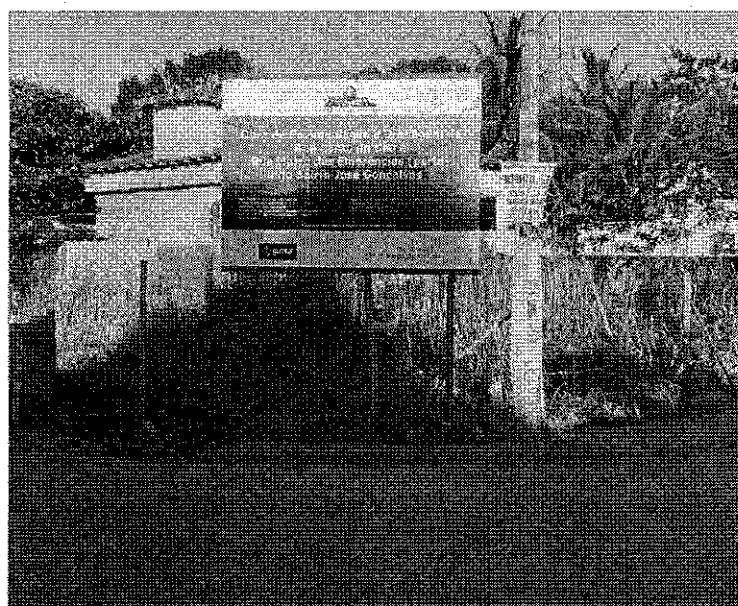
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DA ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Obra:	Pavimentação e Drenagem da Rua Canto do Céu e Rua Morro das Emerências
Local:	José Gonçalves
Empresa:	Dafla Construção Serviços e Gerenciamento LTDA-EPP
Engenheiro Fiscal:	João Pedro Souza

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 1ª MEDIÇÃO



Limpeza do Terreno para instalação do Canteiro de Obras





Placa de Obra

Folha
___/___

Contratada

Engenheiro da Contratante


João Pedro Souza
Engenheiro de Saneamento
Mat.: 13608



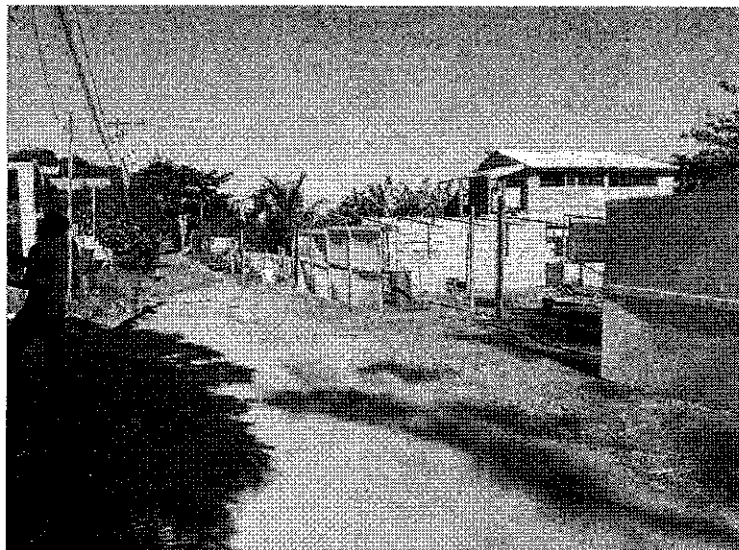
Estado do Rio de Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DA ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

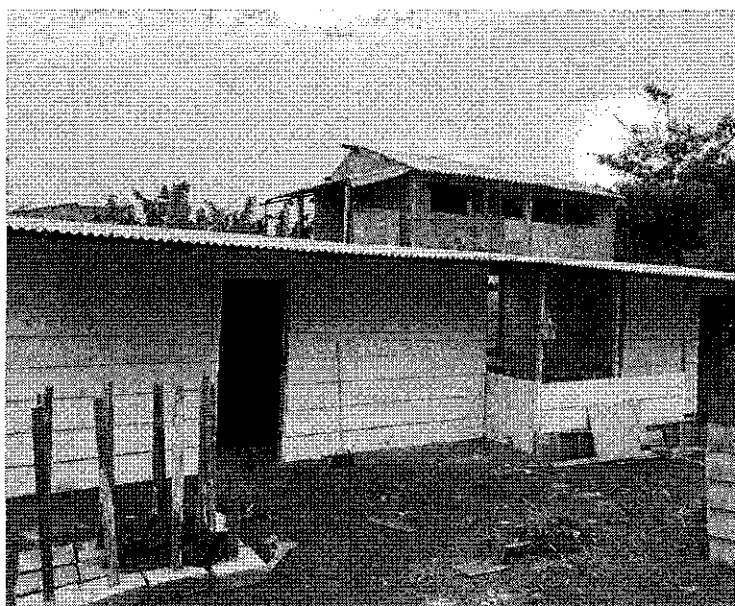
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Obra:	Pavimentação e Drenagem da Rua Canto do Céu e Rua Morro das Emerências
Local:	José Gonçalves
Empresa:	Dafra Construção Serviços e Gerenciamento LTDA-EPP
Engenheiro Fiscal:	João Pedro Souza

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 1ª MEDIÇÃO




Execução do Tapume e Barracão de Obra



Barracão de Obra

Folha ___/___	Contratada	Engenheiro da Contratante
------------------	------------	---------------------------

João Pedro Souza
João Pedro Souza
Engenheiro de Sançamento
Rég. 173600



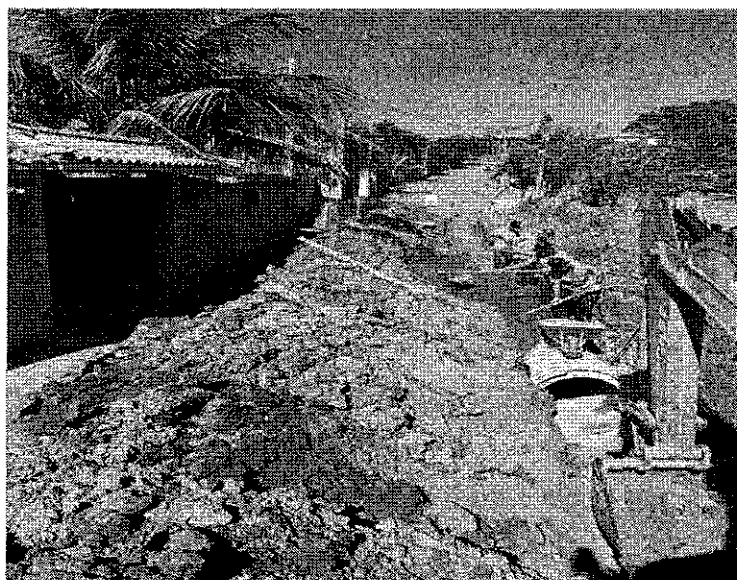
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DA ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Obra:	Pavimentação e Drenagem da Rua Canto do Céu e Rua Morro das Emerências
Local:	José Gonçalves
Empresa:	Dafra Construção Serviços e Gerenciamento LTDA-EPP
Engenheiro Fiscal:	João Pedro Souza

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 1ª MEDIÇÃO




Assentamento tubulação de 800mm



Reaterro de Vala

Folha ___/___	Contratada	Engenheiro da Contratante
------------------	------------	---------------------------

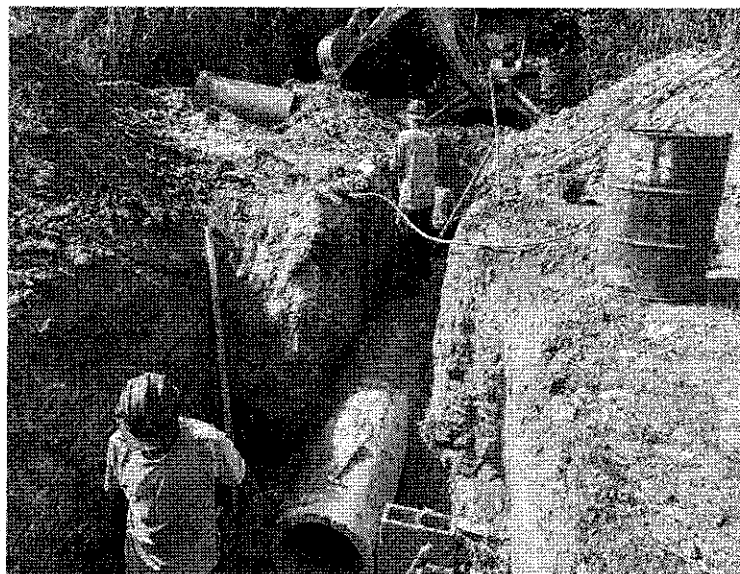
João Pedro Souza
Engenheiro de Sanitamento
Matr. 140008



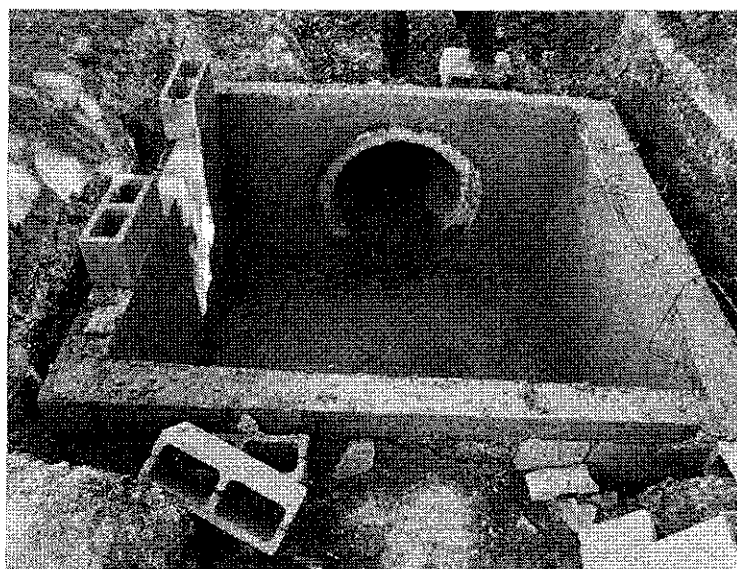
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DA ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Obra:	Pavimentação e Drenagem da Rua Canto do Céu e Rua Morro das Emerências
Local:	José Gonçalves
Empresa:	Dafra Construção Serviços e Gerenciamento LTDA-EPP
Engenheiro	João Pedro Souza
Fiscal:	

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 1ª MEDIÇÃO



Assentamento tubulação de 500mm



Execução de PV

Folha
___/___

Contratada

Engenheiro da Contratante

João Pedro Souza
João Pedro Souza
Engenheiro de Sanamento
Mat. 13600



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DAFLA CONSTRUCAO SERVICOS E GERENCIAMENTO LTDA
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 12.603.970/0001-60
Certidão nº: 149230257/2018
Expedição: 30/04/2018, às 12:48:08
Validade: 26/10/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que DAFLA CONSTRUCAO SERVICOS E GERENCIAMENTO LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 12.603.970/0001-60, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação. Prévia.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: DAFLA CONSTRUCAO SERVICOS E GERENCIAMENTO LTDA - EPP
CNPJ: 12.603.970/0001-60

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 07:38:06 do dia 19/01/2018 <hora e data de Brasília>.

Válida até 18/07/2018.

Código de controle da certidão: 4824.9D58.DCAB.5049

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR

VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF****Inscrição:** 12603970/0001-60**Razão Social:** DAFLA CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E GERENCIAMENTO LTDA EPP**Endereço:** EST FRANCISCO DA CRUZ NUNES 8180 SALA 210 / ITATPU /
NITEROI / RJ / 24340-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 30/05/2018 a 28/06/2018**Certificação Número:** 2018053016144941951959

Informação obtida em 11/06/2018, às 11:29:39.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

OK

Armação dos Búzios

DIAS CORRIDO 1

CONTRATO Nº 010/2018

OBRA

16-abr-18

Segunda-Feira

OBRA DE PAV. E DRENAGEM DA RUA CANTO DO CÉU E RUA MORRO DAS EMERÊNCIAS
(PARTE) NO BAIRRO JOSÉ GOLÇALVES

TEMPO CLIMA

BOM	X	INSTÁVEL		CHUVOSO		IMPRATICÁVEL	
-----	---	----------	--	---------	--	--------------	--

Pessoal	
Função	Quant.
Engenheiro	1
Encarregado	
Pedreiro	1
Servente	2
Carpinteiro/Armador	
Calceteiro	

Equipamento	
Descrição	Quant.
Caminhão Toco	
Compactador sapo	
Retro escavadeira	

Serviços Realizados

*LIMPEZA DO TERRENO PARA INSTALAÇÃO DO CANTEIRO

COMENTARIOS DO FISCAL:

COMENTÁRIOS DA EMPRESA:

RESP. PELA EMPRESA

José Roberto Marques Cruz
Engenheiro Civil
CREA-RJ: 198410303

ENG. FISCAL

[Assinatura]
Pedro Santa
Engenheiro de Sanamento
Mat: 20360



DAFLA
CONSTRUÇÃO | SERVIÇOS | GERENCIAMENTO

Diário de Obras

DIAS CORRIDO 2

Armação dos Búzios

CONTRATO Nº 010/2018

OBRA

17-abr-18

Terça-Feira

OBRA DE PAV. E DRENAGEM DA RUA CANTO DO CÉU E RUA MORRO DAS EMERÊNCIAS (PARTE)
NO BAIRRO JOSÉ GOLÇALVES

TEMPO CLIMA

BOM	X	INSTÁVEL		CHUVOSO		IMPRATICÁVEL	
-----	---	----------	--	---------	--	--------------	--

Pessoal	
Função	Quant.
Engenheiro	1
Encarregado	
Pedreiro	1
Servente	3
Carpinteiro/Armador	
Calceteiro	

Equipamento	
Descrição	Quant.
Caminhão Toco	
Compactador sapo	
Retro escavadeira	

Serviços Realizados

*LIMPEZA DO TERRENO PARA INSTALAÇÃO DO CANTEIRO

COMENTÁRIOS DO FISCAL:

COMENTÁRIOS DA EMPRESA:

RESP. PELA EMPRESA: Roberto Marques Cruz
Engenheiro Civil
CREA RJ 139910933

ENG. FISCAL

João Pedro Sousa
Gerente de Manutenção
Mat. 17300

DIAS CORRIDO 3

Armação dos Búzios

CONTRATO Nº

010/2018

OBRA

18-abr-18

Quarta-Feira

 OBRA DE PAV. E DRENAGEM DA RUA CANTO DO CÉU E RUA MORRO DAS EMERÊNCIAS
 (PARTE) NO BAIRRO JOSÉ GOLÇALVES

TEMPO CLIMA

BOM	X	INSTÁVEL		CHUVOSO		IMPRATICÁVEL	
-----	---	----------	--	---------	--	--------------	--

Pessoal	
Função	Quant.
Engenheiro	1
Encarregado	
Pedreiro	1
Servente	3
Carpinteiro/Armador	
Calceteiro	

Equipamento	
Descrição	Quant.
Caminhão Toco	1
Compactador sapo	
Retro escavadeira	1

Serviços Realizados

*LIMPEZA DO TERRENO PARA INSTALAÇÃO DO CANTEIRO


*RETIRADA DO MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DO CANTEIRO

COMENTÁRIOS DO FISCAL:
COMENTÁRIOS DA EMPRESA:

RESP. PELA EMPRESA

ENG. FISCAL

 João Pedro Silva
 Engenheiro Civil
 CREA 123456789


 João Pedro Silva
 Gerente de Construção
 Matr. 123456

Armação dos Búzios

CONTRATO Nº 010/2018

OBRA

19-abr-18

Quinta-Feira

OBRA DE PAV. E DRENAGEM DA RUA CANTO DO CÉU E RUA MORRO DAS EMERÊNCIAS
(PARTE) NO BAIRRO JOSÉ GOLÇALVES

TEMPO CLIMA

BOM	X	INSTÁVEL		CHUVOSO		IMPRATICÁVEL	
-----	---	----------	--	---------	--	--------------	--

Pessoal	
Função	Quant.
Engenheiro	1
Encarregado	
Pedreiro	1
Servente	3
Carpinteiro/Armador	
Calceteiro	

Equipamento	
Descrição	Quant.
Caminhão Toco	1
Compactador sapo	
Retro escavadeira	1

Serviços Realizados

- *LIMPEZA DO TERRENO PARA INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
- *RETIRADA DO MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DO CANTEIRO

COMENTÁRIOS DO FISCAL:

COMENTÁRIOS DA EMPRESA:

RESP. PELA EMPRESA: **Roberto Marques Cruz**
 Engenheiro Civil
 CREA-RJ: 193910083

ENG. FISCAL

[Handwritten Signature]
 Gerente de Manutenção
 161.10000

DIAS CORRIDO 5

Armação dos Búzios

CONTRATO Nº 010/2018

OBRA

20-abr-18

Sexta-Feira

OBRA DE PAV. E DRENAGEM DA RUA CANTO DO CÉU E RUA MORRO DAS EMERÊNCIAS (PARTE) NO BAIRRO JOSÉ GOLÇALVES

TEMPO CLIMA

BOM	X	INSTÁVEL		CHUVOSO		IMPRATICÁVEL	
-----	---	----------	--	---------	--	--------------	--

Pessoal	
Função	Quant.
Engenheiro	1
Encarregado	
Pedreiro	1
Servente	3
Carpinteiro/Armador	
Calceteiro	

Equipamento	
Descrição	Quant.
Caminhão Toco	1
Compactador sapo	
Retro escavadeira	1

Serviços Realizados

*LIMPEZA DO TERRENO PARA INSTALAÇÃO DO CANTEIRO

*RETIRADA DO MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DO CANTEIRO


COMENTÁRIOS DO FISCAL:

COMENTÁRIOS DA EMPRESA:

RESP. PELA EMPRESA

 José Roberto Marques Cruz
 Engenheiro Civil
 CRP 199019000

ENG. FISCAL


 João Carlos Silva
 Engenheiro de Segurança
 CRP 199019000

DIAS CORRIDO 6 7

Armação dos Búzios

CONTRATO Nº 010/2018

OBRA 21-abr-18 22-abr-18 Sábado Domingo

OBRA DE PAV. E DRENAGEM DA RUA CANTO DO CÉU E RUA MORRO DAS EMERÊNCIAS
(PARTE) NO BAIRRO JOSÉ GOLÇALVES

TEMPO CLIMA

BOM		INSTÁVEL		CHUVOSO		IMPRATICÁVEL	
-----	--	----------	--	---------	--	--------------	--

Pessoal	
Função	Quant.
Engenheiro	
Encarregado	
Pedreiro	
Servente	
Carpinteiro/Armador	
Calceteiro	

Equipamento	
Descrição	Quant.
Caminhão Toco	
Compactador sapo	
Retro escavadeira	

Serviços Realizados

COMENTÁRIOS DO FISCAL:

COMENTÁRIOS DA EMPRESA:

RESP. PELA EMPRESA

ENG. FISCAL

[Handwritten Signature]
 Eng.º Paulo Sérgio
 Diretor de Engenharia
 Matr. nº 1604



36

Armação dos Búzios

CONTRATO Nº	010/2018
-------------	----------

OBRA

23-abr-18

Segunda-Feira

OBRA DE PAV. E DRENAGEM DA RUA CANTO DO CÉU E RUA MORRO DAS EMERÊNCIAS
(PARTE) NO BAIRRO JOSÉ GOLÇALVES

TEMPO CLIMA

BOM	X	INSTÁVEL		CHUVOSO		IMPRATICÁVEL	
-----	---	----------	--	---------	--	--------------	--

Pessoal	
Função	Quant.
Engenheiro	1
Encarregado	1
Pedreiro	1
Servente	3
Carpinteiro/Armador	
Calceteiro	

Equipamento	
Descrição	Quant.
Caminhão Toco	
Compactador sapo	
Retro escavadeira	

[illegible]

*CHEGADA DE MATERIAL PARA EXECUÇÃO DO CANTERIO

*LOCAÇÃO DO CANTEIRO

*COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA

COMENTÁRIOS DO FISCAL:

COMENTÁRIOS DA EMPRESA:

RESP. PELA EMPRESA José Roberto Marques Cruz
Engenharia Civil
CREA-SP: 198010093

ENG. FISCAL

3000 Franklin Avenue
New York, N.Y. 10017
Tel. (212) 691-1100

DIAS CORRIDO 9

Armação dos Búzios

CONTRATO Nº

010/2018

OBRA

24-abr-18

Terça-Feira

**OBRA DE PAV. E DRENAGEM DA RUA CANTO DO CÉU E RUA MORRO DAS EMERÊNCIAS
(PARTE) NO BAIRRO JOSÉ GOLÇALVES**

TEMPO CLIMA

BOM	X	INSTÁVEL		CHUVOSO		IMPRATICÁVEL	
-----	---	----------	--	---------	--	--------------	--

Pessoal	
Função	Quant.
Engenheiro	1
Encarregado	1
Pedreiro	1
Servente	3
Carpinteiro/Armador	
Calceteiro	

Equipamento	
Descrição	Quant.
Caminhão Toco	
Compactador sapo	
Retro escavadeira	

Serviços Realizados

- *EXECUÇÃO DE TAPUME E BARRAÇÃO DE OBRA
- *EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
- *LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E CADASTRAL

COMENTÁRIOS DO FISCAL:

COMENTÁRIOS DA EMPRESA:

RESP. PELA EMPRESA

ENG. FISCAL

Roberto Marques Cruz
Engenheiro Civil
CPF: 190.110.33

João Paulo Silva
 Gerente de Engenharia
 11/04/2018



DAFLA
CONSTRUÇÃO | SERVIÇOS | GERENCIAMENTO

Diário de Obras

DIAS CORRIDO 10

Armação dos Búzios

CONTRATO Nº 010/2018

OBRA

25-abr-18

Quarta-Feira

OBRA DE PAV. E DRENAGEM DA RUA CANTO DO CÉU E RUA MORRO DAS EMERÊNCIAS
(PARTE) NO BAIRRO JOSÉ GOLÇALVES

TEMPO CLIMA

BOM	X	INSTÁVEL		CHUVOSO		IMPRATICÁVEL	
-----	---	----------	--	---------	--	--------------	--

Pessoal	
Função	Quant.
Engenheiro	1
Encarregado	1
Pedreiro	1
Servente	3
Carpinteiro/Armador	
Calceteiro	

Equipamento	
Descrição	Quant.
Caminhão Toco	
Compactador sapo	
Retro escavadeira	

Serviços Realizados

*EXECUÇÃO DE TAPUME E BARRAÇÃO DE OBRA

*LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E CADASTRAL

COMENTÁRIOS DO FISCAL:

COMENTÁRIOS DA EMPRESA:

RESP. PELA EMPRESA

ENG. FISCAL

João Paulo Costa
Gerente de Engenharia



DAFLA
CONSTRUÇÃO | SERVIÇOS | GERENCIAMENTO

Diário de Obras

DIAS CORRIDO 11

Armação dos Búzios

CONTRATO Nº 010/2018

OBRA

26-abr-18

Quinta-Feira

OBRA DE PAV. E DRENAGEM DA RUA CANTO DO CÉU E RUA MORRO DAS EMERÊNCIAS
(PARTE) NO BAIRRO JOSÉ GOLÇALVES

TEMPO CLIMA

BOM	X	INSTÁVEL		CHUVOSO		IMPRATICÁVEL	
-----	---	----------	--	---------	--	--------------	--

Pessoal	
Função	Quant.
Engenheiro	1
Encarregado	1
Pedreiro	1
Servente	3
Carpinteiro/Armador	
Calceteiro	

Equipamento	
Descrição	Quant.
Caminhão Toco	
Compactador sapo	
Retro escavadeira	

Serviços Realizados

*EXECUÇÃO DE TAPUME E BARRAÇÃO DE OBRA

COMENTÁRIOS DO FISCAL:

COMENTÁRIOS DA EMPRESA:

RESP. PELA EMPRESA

José Roberto Marques Cruz
Eng. Civil
CREA-RJ: 199910093

ENG. FISCAL

[Assinatura]
José Roberto Marques Cruz
Eng. Civil
CREA-RJ: 199910093

**DAFLA**

CONSTRUÇÃO | SERVIÇOS | GERENCIAMENTO

Diário de Obras

DIAS CORRIDO 12

Armação dos Búzios

CONTRATO Nº

010/2018

OBRA

27-abr-18

Sexta-Feira

OBRA DE PAV. E DRENAGEM DA RUA CANTO DO CÉU E RUA MORRO DAS EMERÊNCIAS (PARTE)
NO BAIRRO JOSÉ GOLÇALVES

TEMPO CLIMA

BOM

X

INSTÁVEL

CHUVOSO

IMPRATICÁVEL

Pessoal

Função	Quant.
Engenheiro	1
Encarregado	1
Pedreiro	2
Servente	4
Carpinteiro/Armador	
Calceteiro	

Equipamento

Descrição	Quant.
Caminhão Toco	
Compactador sapo	
Retro escavadeira	1

Serviços Realizados

*EXECUÇÃO DE TAPUME E BARRAÇÃO DE OBRA

*CHEGADA DE MANILHAS DE 800MM

COMENTÁRIOS DO FISCAL:

COMENTÁRIOS DA EMPRESA:

RESP. PELA EMPRESA

José Roberto Marques Lima

Engenheiro Civil

CPF: 034.199.013-03

ENG. FISCAL

João Paulo Silva
Engenheiro de Segurança
14.11.2008



DAFLA
CONSTRUÇÃO | SERVIÇOS | GERENCIAMENTO

Diário de Obras

DIAS CORRIDO 13 14

Armação dos Búzios

CONTRATO Nº 010/2018

OBRA 28-abr-18 29-abr-18 Sábado Domingo

OBRA DE PAV. E DRENAGEM DA RUA CANTO DO CÉU E RUA MORRO DAS EMERÊNCIAS
(PARTE) NO BAIRRO JOSÉ GOLÇALVES

TEMPO CLIMA

BOM		INSTÁVEL		CHUVOSO		IMPRATICÁVEL	
-----	--	----------	--	---------	--	--------------	--

Pessoal	
Função	Quant.
Engenheiro	
Encarregado	
Pedreiro	
Servente	
Carpinteiro/Armador	
Calceteiro	

Equipamento	
Descrição	Quant.
Caminhão Toco	
Compactador sapo	
Retro escavadeira	

Serviços Realizados

COMENTÁRIOS DO FISCAL:

COMENTÁRIOS DA EMPRESA:

RESP. PELA EMPRESA José Roberto Marques Cruz
Engenheiro Civil
CREA RJ: 120040003

ENG. FISCAL

[Assinatura]
1250 Paulo Sérgio
Engenheiro de Engenharia
Matr: 13600



DAFLA
CONSTRUÇÃO | SERVIÇOS | GERENCIAMENTO

Diário de Obras

DIAS CORRIDO 15

Armação dos Búzios

CONTRATO Nº

010/2018

OBRA

30-abr-18

Segunda-Feira

OBRA DE PAV. E DRENAGEM DA RUA CANTO DO CÉU E RUA MORRO DAS EMERÊNCIAS
(PARTE) NO BAIRRO JOSÉ GOLÇALVES

TEMPO CLIMA

BOM	X	INSTÁVEL		CHUVOSO		IMPRATICÁVEL	
-----	---	----------	--	---------	--	--------------	--

Pessoal	
Função	Quant.
Engenheiro	1
Encarregado	1
Pedreiro	2
Servente	4
Carpinteiro/Armador	
Calceteiro	

Equipamento	
Descrição	Quant.
Caminhão Toco	
Compactador sapo	
Retro escavadeira	1

Serviços Realizados

*EXECUÇÃO DE TAPUME E BARRAÇÃO DE OBRA

*LIMPEZA E MELHORIA NA RUA CANTINHO DO CÉU PARA MELHOR ACESSO AO CANTEIRO

COMENTÁRIOS DO FISCAL:

COMENTÁRIOS DA EMPRESA:

RESP. PELA EMPRESA

João Pedro Souza
Engenheiro Civil
CPF: 123.456.789

ENG. FISCAL

[Assinatura]

João Pedro Souza
Gerente de Engenharia
Mat. 123456



DAFLA
CONSTRUÇÃO | SERVIÇOS | GERENCIAMENTO

Diário de Obras

DIAS CORRIDO 16

Armação dos Búzios

CONTRATO Nº 010/2018

OBRA

01-mai-18

Terça-Feira

OBRA DE PAV. E DRENAGEM DA RUA CANTO DO CÉU E RUA MORRO DAS EMERÊNCIAS
(PARTE) NO BAIRRO JOSÉ GOLÇALVES

TEMPO CLIMA

BOM

INSTÁVEL

CHUVOSO

IMPRATICÁVEL

Pessoal

Função	Quant.
Engenheiro	
Encarregado	
Pedreiro	
Servente	
Carpinteiro/Armador	
Calceteiro	

Equipamento

Descrição	Quant.
Caminhão Toco	
Compactador sapo	
Retro escavadeira	

Serviços Realizados

*FERIADO DIA DO TRABALHO

COMENTÁRIOS DO FISCAL:

COMENTÁRIOS DA EMPRESA:

RESP. PELA EMPRESA José Roberto Marques Cruz
Engenheiro Civil
CREA-RN: 199910083

ENG. FISCAL

João Paulo Souza
engenheiro de planejamento
Mat.: 13660

DIAS CORRIDO 17

Armação dos Búzios

CONTRATO Nº 010/2018

OBRA

02-mai-18

Quarta-Feira

 OBRA DE PAV. E DRENAGEM DA RUA CANTO DO CÉU E RUA MORRO DAS EMERÊNCIAS
 (PARTE) NO BAIRRO JOSÉ GOLÇALVES

TEMPO CLIMA

BOM	X	INSTÁVEL		CHUVOSO		IMPRATICÁVEL	
-----	---	----------	--	---------	--	--------------	--

Pessoal	
Função	Quant.
Engenheiro	1
Encarregado	1
Pedreiro	2
Servente	4
Carpinteiro/Armador	
Calceteiro	

Equipamento	
Descrição	Quant.
Caminhão Toco	1
Compactador sapo	
Retro escavadeira	1

Serviços Realizados

*ARRANCAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS EXISTENTE DO PV-29 AO PV-27

*TRANPORTE DOS PARALELEPÍPEDOS

*LOCAÇÃO DA REDE


COMENTÁRIOS DO FISCAL:

COMENTÁRIOS DA EMPRESA:

RESP. PELA EMPRESA

 José Roberto Marques Cruz
 Engenheiro Civil
 CREA-RJ: 199018083

ENG. FISCAL



 João Pedro Souza
 Gerente de Manutenção
 Matr. 13500

DIAS CORRIDO 18

Armação dos Búzios

CONTRATO Nº 010/2018

OBRA

03-mai-18

Quinta-Feira

 OBRA DE PAV. E DRENAGEM DA RUA CANTO DO CÉU E RUA MORRO DAS EMERÊNCIAS
 (PARTE) NO BAIRRO JOSÉ GOLÇALVES

TEMPO CLIMA

BOM		INSTÁVEL		CHUVOSO	X	IMPRATICÁVEL	
-----	--	----------	--	---------	---	--------------	--

Pessoal	
Função	Quant.
Engenheiro	1
Encarregado	1
Pedreiro	2
Servente	4
Carpinteiro/Armador	
Calceteiro	

Equipamento	
Descrição	Quant.
Caminhão Toco	1
Compactador sapo	1
Retro escavadeira	1

Serviços Realizados

*DIA CHUVOSO NÃO TRABALHAMOS


COMENTÁRIOS DO FISCAL:

COMENTÁRIOS DA EMPRESA:

RESP. PELA EMPRESA

 José Roberto Marques Cruz
 Engenheiro Civil
 CREA-RJ: 199010063

ENG. FISCAL


 José Roberto Marques Cruz
 Engenheiro Civil
 Matr. 173000

DIAS CORRIDO 19

Armação dos Búzios

CONTRATO Nº

010/2018

OBRA

04-mai-18

Sexta-Feira

**OBRA DE PAV. E DRENAGEM DA RUA CANTO DO CÉU E RUA MORRO DAS EMERÊNCIAS
(PARTE) NO BAIRRO JOSÉ GOLÇALVES**

TEMPO CLIMA

BOM	X	INSTÁVEL		CHUVOSO		IMPRATICÁVEL	
-----	---	----------	--	---------	--	--------------	--

Pessoal	
Função	Quant.
Engenheiro	1
Encarregado	1
Pedreiro	2
Servente	4
Carpinteiro/Armador	
Calceteiro	

Equipamento	
Descrição	Quant.
Caminhão Toco	1
Compactador sapo	1
Retro escavadeira	1

Serviços Realizados

- *EXECUÇÃO DE ESCAVAÇÃO DO PV-29 AO PV 28
- *COLOCAÇÃO DE TUBO DE 800MM
- *EMBASAMENTO DE TUBULAÇÃO
- *REATERRO MANUAL DE VALA E COMPACTAÇÃO
- *LOCAÇÃO DA REDE

COMENTÁRIOS DO FISCAL:
COMENTÁRIOS DA EMPRESA:

*TRANSPORTE DE PÓ DE PEDRA EM CARRINHOS DE MÃO PARA EMBASAMENTO. PELO FATO DAS RUAS SEREM MUITO ESTREITAS NÃO CONSEGUIMOS DESCARREGAR O PÓ DE PEDRA PROXIMO A VALA ESCAVADA PORTANTO TIVEMOS QUE TRANSPORTAR O MATERIAL MAUALMENTE.

*REATERRO MANUAL DE VALA E COMPACTAÇÃO. PELO FATO DAS RUAS SEREM MUITO ESTREITAS DIFICULTANDO O ACESSO DA RETRO A VALA ESCAVADA. O REATERRO ESTÁ SENDO FEITO MANUAL!

RESP. PELA EMPRESA

José Roberto Marques Cruz
 Engenheiro Civil
 CREA-RJ: 199910083

ENG. FISCAL

[Assinatura]
 João Roberto Cruz
 Gerente de Obra
 Matr: 12009



DAFLA
CONSTRUÇÃO | SERVIÇOS | GERENCIAMENTO

Diário de Obras

DIAS CORRIDO 20 21

Armação dos Búzios

CONTRATO Nº 010/2018

OBRA 05-mai-18 06-mai-18 Sábado Domingo

OBRA DE PAV. E DRENAGEM DA RUA CANTO DO CÊU E RUA MORRO DAS EMERÊNCIAS
(PARTE) NO BAIRRO JOSÉ GOLÇALVES

TEMPO CLIMA

BOM	X	INSTÁVEL		CHUVOSO		IMPRATICÁVEL	
-----	---	----------	--	---------	--	--------------	--

Pessoal	
Função	Quant.
Engenheiro	
Encarregado	
Pedreiro	
Servente	
Carpinteiro/Armador	
Calceteiro	

Equipamento	
Descrição	Quant.
Caminhão Toco	
Compactador sapo	
Retro escavadeira	

Serviços Realizados

COMENTÁRIOS DO FISCAL:

COMENTÁRIOS DA EMPRESA:

RESP. PELA EMPRESA ~~João Roberto Marques Cruz~~
Engenheiro Civil
CREA-RJ: 199010083

ENG. FISCAL

[Handwritten signature]
João Roberto Marques Cruz
Engenheiro Civil
CREA-RJ: 199010083

DIAS CORRIDO 22

Armação dos Búzios

CONTRATO Nº

010/2018

OBRA

07-mai-18

Segunda-Feira

**OBRA DE PAV. E DRENAGEM DA RUA CANTO DO CÉU E RUA MORRO DAS EMERÊNCIAS
(PARTE) NO BAIRRO JOSÉ GOLÇALVES**

TEMPO CLIMA

BOM	X	INSTÁVEL		CHUVOSO		IMPRATICÁVEL	
-----	---	----------	--	---------	--	--------------	--

Pessoal	
Função	Quant.
Engenheiro	1
Encarregado	1
Pedreiro	3
Servente	7
Carpinteiro/Armador	
Caçeteiro	

Equipamento	
Descrição	Quant.
Caminhão Toco	1
Compactador sapo	2
Retro escavadeira	1

Serviços Realizados

- *EXECUÇÃO DE ESCAVAÇÃO DO PV-28 AO PV 27
- *COLOCAÇÃO DE TUBO DE 800MM
- *EMBASAMENTO DE TUBULAÇÃO
- *REATERRO MANUAL DE VALA E COMPACTAÇÃO

COMENTÁRIOS DO FISCAL:
COMENTÁRIOS DA EMPRESA:

RESP. PELA EMPRESA

João Paulo de Moraes Cruz
 Eng. Civil
 CREA-PA 190010000

ENG. FISCAL

[Assinatura]
 1000 PAVO LITE
 1000 DA SERRA
 1000000

Diário de Obras

DIAS CORRIDO 23

Armação dos Búzios

CONTRATO Nº

010/2018

OBRA

08-mai-18

Terça-Feira

 OBRA DE PAV. E DRENAGEM DA RUA CANTO DO CÉU E RUA MORRO DAS EMERÊNCIAS
 (PARTE) NO BAIRRO JOSÉ GOLÇALVES

TEMPO CLIMA

BOM

X

INSTÁVEL

CHUVOSO

IMPRATICÁVEL

Pessoal

Função	Quant.
Engenheiro	1
Encarregado	1
Pedreiro	3
Servente	7
Carpinteiro/Armador	
Calceteiro	

Equipamento

Descrição	Quant.
Caminhão Toco	1
Compactador sapo	2
Retro escavadeira	1

Serviços Realizados

- *EXECUÇÃO DE ESCAVAÇÃO DO PV-28 AO PV 27
- *COLOCAÇÃO DE TUBO DE 800MM
- *EMBASAMENTO DE TUBULAÇÃO
- *REATERRO MANUAL DE VALA E COMPACTAÇÃO

COMENTÁRIOS DO FISCAL:

COMENTÁRIOS DA EMPRESA:


RESP. PELA EMPRESA

José Roberto Marques Cruz

Engenheiro Civil

CREA-RJ: 199010033

ENG. FISCAL


 José Roberto Marques Cruz
 Engenheiro Civil
 Matr. 199010033

Armação dos Búzios

CONTRATO Nº 010/2018

OBRA

09-mai-18

Quarta-Feira

 OBRA DE PAV. E DRENAGEM DA RUA CANTO DO CÉU E RUA MORRO DAS EMERÊNCIAS
 (PARTE) NO BAIRRO JOSÉ GOLÇALVES

TEMPO CLIMA

BOM	X	INSTÁVEL		CHUVOSO		IMPRATICÁVEL	
-----	---	----------	--	---------	--	--------------	--

Pessoal	
Função	Quant.
Engenheiro	1
Encarregado	1
Pedreiro	3
Servente	7
Carpinteiro/Armador	
Calceteiro	

Equipamento	
Descrição	Quant.
Caminhão Toco	1
Compactador sapo	2
Retro escavadeira	1

Serviços Realizados

- *EXECUÇÃO DE ESCAVAÇÃO DO PV-28 AO PV 27
- *COLOCAÇÃO DE TUBO DE 800MM
- *EMBASAMENTO DE TUBULAÇÃO
- *REATERRO MANUAL DE VALA E COMPACTAÇÃO
- *EXECUÇÃO DE PV


COMENTÁRIOS DO FISCAL:

COMENTÁRIOS DA EMPRESA:

RESP. PELA EMPRESA

 José Roberto Marques C.
 Engenheiro Civil
 CREA-RJ: 139816333

ENG. FISCAL


 José Roberto Marques C.
 Engenheiro Civil
 CREA-RJ: 139816333

DIAS CORRIDO 25

Armação dos Búzios

CONTRATO Nº

010/2018

OBRA

10-mai-18

Quinta-Feira

OBRA DE PAV. E DRENAGEM DA RUA CANTO DO CÉU E RUA MORRO DAS EMERÊNCIAS
(PARTE) NO BAIRRO JOSÉ GOLÇALVES

TEMPO CLIMA

BOM	X	INSTÁVEL		CHUVOSO		IMPRATICÁVEL	
-----	---	----------	--	---------	--	--------------	--

Pessoal	
Função	Quant.
Engenheiro	1
Encarregado	1
Pedreiro	3
Servente	7
Carpinteiro/Armador	
Calceteiro	

Equipamento	
Descrição	Quant.
Caminhão Toco	1
Compactador sapo	2
Retro escavadeira	1

Serviços Realizados

- *EXECUÇÃO DE ESCAVAÇÃO DO PV-29 AO PV 28
- *COLOCAÇÃO DE TUBO DE 800MM
- *EMBASAMENTO DE TUBULAÇÃO
- *REATERRO MANUAL DE VALA E COMPACTAÇÃO
- *EXECUÇÃO DE PV

COMENTÁRIOS DO FISCAL:

COMENTÁRIOS DA EMPRESA:

RESP. PELA EMPRESA

José Roberto Marques CENG. FISCAL
Engenheiro Civil
CREA-RJ: 199913033

[Assinatura]
 José Roberto Marques
 Gerente de Manutenção
 10/05/2018

**DAFLA**

CONSTRUÇÃO | SERVIÇOS | GERENCIAMENTO

Diário de Obras

DIAS CORRIDO 26

Armação dos Búzios

CONTRATO Nº

010/2018

OBRA

11-mai-18

Sexta-Feira

OBRA DE PAV. E DRENAGEM DA RUA CANTO DO CÉU E RUA MORRO DAS EMERÊNCIAS
(PARTE) NO BAIRRO JOSÉ GOLÇALVES

TEMPO CLIMA

BOM

X

INSTÁVEL

CHUVOSO

IMPRATICÁVEL

Pessoal

Função	Quant.
Engenheiro	1
Encarregado	1
Pedreiro	3
Servente	7
Carpinteiro/Armador	
Calceteiro	

Equipamento

Descrição	Quant.
Caminhão Toco	1
Compactador sapo	2
Retro escavadeira	1

Serviços Realizados

- *EXECUÇÃO DE ESCAVAÇÃO DO PV-15 AO PV 37
- *COLOCAÇÃO DE TUBO DE 800MM
- *EMBASAMENTO DE TUBULAÇÃO
- *REATERRO MANUAL DE VALA E COMPACTAÇÃO
- *EXECUÇÃO DE PV

COMENTÁRIOS DO FISCAL:

COMENTÁRIOS DA EMPRESA:

RESP. PELA EMPRESA

José Roberto Marques Cruz
Engenheiro Civil
CREA-RJ: 199910033

ENG. FISCAL

José Roberto Marques Cruz
Engenheiro Civil
CREA-RJ: 199910033

DIAS CORRIDO 27 28

Armação dos Búzios

CONTRATO Nº 010/2018

OBRA 12-mai-18 13-mai-18 Sábado Domingo

OBRA DE PAV. E DRENAGEM DA RUA CANTO DO CÉU E RUA MORRO DAS EMERÊNCIAS
(PARTE) NO BAIRRO JOSÉ GOLÇALVES

TEMPO CLIMA

BOM		INSTÁVEL		CHUVOSO		IMPRATICÁVEL	
-----	--	----------	--	---------	--	--------------	--

Pessoal	
Função	Quant.
Engenheiro	
Encarregado	
Pedreiro	
Servente	
Carpinteiro/Armador	
Calceteiro	

Equipamento	
Descrição	Quant.
Caminhão Toco	
Compactador sapo	
Retro escavadeira	

Serviços Realizados

COMENTÁRIOS DO FISCAL:

COMENTÁRIOS DA EMPRESA:

RESP. PELA EMPRESA Jose Roberto Marques Cruz
Engenheiro Civil
CREA-21-109010023

ENG. FISCAL

[Assinatura]

Jose Roberto Marques Cruz
Gerente de Manutenção
Matr. 11000

DIAS CORRIDO 29

Armação dos Búzios

CONTRATO Nº

010/2018

OBRA

14-mai-18

Segunda-Feira

**OBRA DE PAV. E DRENAGEM DA RUA CANTO DO CÉU E RUA MORRO DAS EMERÊNCIAS
(PARTE) NO BAIRRO JOSÉ GOLÇALVES**

TEMPO CLIMA

BOM	X	INSTÁVEL		CHUVOSO		IMPRATICÁVEL	
-----	---	----------	--	---------	--	--------------	--

Pessoal	
Função	Quant.
Engenheiro	1
Encarregado	1
Pedreiro	3
Servente	7
Carpinteiro/Armador	
Calceteiro	

Equipamento	
Descrição	Quant.
Caminhão Toco	1
Compactador sapo	2
Retro escavadeira	1

Serviços Realizados


- *EXECUÇÃO DE ESCAVAÇÃO DO PV-15 AO PV 37
- *COLOCAÇÃO DE TUBO DE 800MM
- *EMBASAMENTO DE TUBULAÇÃO
- *REATERRO MANUAL DE VALA E COMPACTAÇÃO

COMENTÁRIOS DO FISCAL:

COMENTÁRIOS DA EMPRESA:

RESP. PELA EMPRESA **José Roberto Marques Cruz**
Engenheiro Civil
CREA-RJ: 199010693

ENG. FISCAL


2018 05 14 14:00
Gerente de Engenharia
1141-12600

Armação dos Búzios

CONTRATO Nº

010/2018

OBRA

15-mai-18

Terça-Feira

**OBRA DE PAV. E DRENAGEM DA RUA CANTO DO CÉU E RUA MORRO DAS EMERÊNCIAS
(PARTE) NO BAIRRO JOSÉ GOLÇALVES****TEMPO CLIMA**

BOM	X	INSTÁVEL		CHUVOSO		IMPRATICÁVEL	
-----	---	----------	--	---------	--	--------------	--

Pessoal	
Função	Quant.
Engenheiro	1
Encarregado	1
Pedreiro	3
Servente	7
Carpinteiro/Armador	
Calceteiro	

Equipamento	
Descrição	Quant.
Caminhão Toco	1
Compactador sapo	2
Retro escavadeira	1

Serviços Realizados


- *EXECUÇÃO DE ESCAVAÇÃO DO PV-37 AO PV 38
- *COLOCAÇÃO DE TUBO DE 500MM
- *EMBASAMENTO DE TUBULAÇÃO
- *REATERRO MANUAL DE VALA E COMPACTAÇÃO
- *EXECUÇÃO DE PV

COMENTÁRIOS DO FISCAL:**COMENTÁRIOS DA EMPRESA:**

RESP. PELA EMPRESA

José Roberto Marques Cruz
Engenheiro Civil
CREA/RJ: 199010083

ENG. FISCAL


Carimbo circular: "CARIMBO FISCAL DO CREA/RJ" e "CARIMBO DA EMPRESA" com data "15/05/2018".



DAFLA
CONSTRUÇÃO | SERVIÇOS | GERENCIAMENTO

Diário de Obras

DIAS CORRIDO 31

Armação dos Búzios

CONTRATO Nº

010/2018

OBRA

16-mai-18

Quarta-Feira

OBRA DE PAV. E DRENAGEM DA RUA CANTO DO CÉU E RUA MORRO DAS EMERÊNCIAS
(PARTE) NO BAIRRO JOSÉ GOLÇALVES

TEMPO CLIMA

BOM	X	INSTÁVEL		CHUVOSO		IMPRATICÁVEL	
-----	---	----------	--	---------	--	--------------	--

Pessoal	
Função	Quant.
Engenheiro	1
Encarregado	1
Pedreiro	3
Servente	7
Carpinteiro/Armador	
Calceteiro	

Equipamento	
Descrição	Quant.
Caminhão Toco	1
Compactador sapo	2
Retro escavadeira	1

Serviços Realizados

- *EXECUÇÃO DE ESCAVAÇÃO DO PV-37 AO PV 38
- *COLOCAÇÃO DE TUBO DE 500MM
- *EMBASAMENTO DE TUBULAÇÃO
- *REATERRO MANUAL DE VALA E COMPACTAÇÃO
- *EXECUÇÃO DE PV

COMENTÁRIOS DO FISCAL:

COMENTÁRIOS DA EMPRESA:

RESP. PELA EMPRESA José Roberto Marques Cruz
Engenheiro Civil
CREA RJ: 199010083

ENG. FISCAL

[Assinatura]
José Roberto Marques Cruz
Engenheiro Civil
CREA RJ: 199010083

Armação dos Búzios

CONTRATO Nº

010/2018

OBRA

17-mai-18

Quinta-Feira

 OBRA DE PAV. E DRENAGEM DA RUA CANTO DO CÉU E RUA MORRO DAS EMERÊNCIAS
 (PARTE) NO BAIRRO JOSÉ GOLÇALVES

TEMPO CLIMA

BOM	X	INSTÁVEL		CHUVOSO		IMPRATICÁVEL	
-----	---	----------	--	---------	--	--------------	--

Pessoal	
Função	Quant.
Engenheiro	1
Encarregado	1
Pedreiro	3
Servente	7
Carpinteiro/Armador	
Calceteiro	

Equipamento	
Descrição	Quant.
Caminhão Toco	1
Compactador sapo	2
Retro escavadeira	1

Serviços Realizados


- *EXECUÇÃO DE ESCAVAÇÃO DO PV-37 AO PV 38
- *COLOCAÇÃO DE TUBO DE 500MM
- *EMBASAMENTO DE TUBULAÇÃO
- *REATERRO MANUAL DE VALA E COMPACTAÇÃO
- *EXECUÇÃO DE PV

COMENTÁRIOS DO FISCAL:

COMENTÁRIOS DA EMPRESA:

 RESP. PELA EMPRESA **José Roberto Marques Cruz**
 Engenheiro Civil
 CREA-RJ: 133913933

ENG. FISCAL


João Pedro Souza
 Gerente de Planejamento
 Matr. 13399



DAFLA
CONSTRUÇÃO | SERVIÇOS | GERENCIAMENTO

Diário de Obras

DIAS CORRIDO 33

Armação dos Búzios

CONTRATO Nº

010/2018

OBRA

18-mai-18

Sexta-Feira

OBRA DE PAV. E DRENAGEM DA RUA CANTO DO CÉU E RUA MORRO DAS EMERÊNCIAS
(PARTE) NO BAIRRO JOSÉ GOLÇALVES

TEMPO CLIMA

BOM

X

INSTÁVEL

CHUVOSO

IMPRATICÁVEL

Pessoal

Função	Quant.
Engenheiro	1
Encarregado	1
Pedreiro	3
Servente	7
Carpinteiro/Armador	
Calceteiro	

Equipamento

Descrição	Quant.
Caminhão Toco	1
Compactador sapo	2
Retro escavadeira	1

Serviços Realizados

- *EXECUÇÃO DE ESCAVAÇÃO DO PV-37 AO PV 38
- *COLOCAÇÃO DE TUBO DE 500MM
- *EMBASAMENTO DE TUBULAÇÃO
- *REATERRO MANUAL DE VALA E COMPACTAÇÃO
- *EXECUÇÃO DE PV

COMENTÁRIOS DO FISCAL:

COMENTÁRIOS DA EMPRESA:

RESP. PELA EMPRESA

José Roberto Marques Cruz
Engenheiro Civil
CREA-RJ: 193010983

ENG. FISCAL

João Paulo Souza
Gerente de Engenharia
Matr. 172500

**DAFLA**

CONSTRUÇÃO | SERVIÇOS | GERENCIAMENTO

Diário de Obras

DIAS CORRIDO 34 35

Armação dos Búzios

CONTRATO Nº 010/2018

OBRA

19-mai-18

20-mai-18

Sábado Domingo

OBRA DE PAV. E DRENAGEM DA RUA CANTO DO CÉU E RUA MORRO DAS EMERÊNCIAS
(PARTE) NO BAIRRO JOSÉ GOLÇALVES

TEMPO CLIMA

BOM		INSTÁVEL		CHUVOSO		IMPRATICÁVEL	
-----	--	----------	--	---------	--	--------------	--

Pessoal	
Função	Quant.
Engenheiro	
Encarregado	
Pedreiro	
Servente	
Carpinteiro/Armador	
Calceteiro	

Equipamento	
Descrição	Quant.
Caminhão Toco	
Compactador sapo	
Retro escavadeira	

Serviços Realizados

COMENTÁRIOS DO FISCAL:

COMENTÁRIOS DA EMPRESA:

RESP. PELA EMPRESA

José Roberto Marques Cruz
Engenheiro Civil
CREA-RS: 199010033

ENG. FISCAL

João Pedro Souza
Técnico de Planejamento
Matr. 12550



DAFLA
CONSTRUÇÃO | SERVIÇOS | GERENCIAMENTO

Diário de Obras

DIAS CORRIDO 36

Armação dos Búzios

CONTRATO Nº

010/2018

OBRA

21-mai-18

Segunda-Feira

OBRA DE PAV. E DRENAGEM DA RUA CANTO DO CÉU E RUA MORRO DAS EMERÊNCIAS (PARTE)
NO BAIRRO JOSÉ GOLÇALVES

TEMPO CLIMA

BOM	X	INSTÁVEL		CHUVOSO		IMPRATICÁVEL	
-----	---	----------	--	---------	--	--------------	--

Pessoal	
Função	Quant.
Engenheiro	1
Encarregado	1
Pedreiro	3
Servente	7
Carpinteiro/Armador	
Calceteiro	

Equipamento	
Descrição	Quant.
Caminhão Toco	1
Compactador sapo	2
Retro escavadeira	1

Serviços Realizados

- *EXECUÇÃO DE ESCAVAÇÃO DO PV-38 AO PV 39
- *COLOCAÇÃO DE TUBO DE 500MM
- *EMBASAMENTO DE TUBULAÇÃO
- *REATERRO MANUAL DE VALA E COMPACTAÇÃO
- *EXECUÇÃO DE PV

COMENTÁRIOS DO FISCAL:

COMENTÁRIOS DA EMPRESA:

RESP. PELA EMPRESA

José Roberto Marques Cruz
Engenheiro Civil
CREA/RJ: 199010033

ENG. FISCAL

José Roberto Marques Cruz
Engenheiro Civil
CREA/RJ: 199010033



DAFLA
CONSTRUÇÃO | SERVIÇOS | GERENCIAMENTO

Diário de Obras

DIAS CORRIDO 37

Armação dos Búzios

CONTRATO Nº

010/2018

OBRA

21-jun-18

Terça-Feira

OBRA DE PAV. E DRENAGEM DA RUA CANTO DO CÉU E RUA MORRO DAS EMERÊNCIAS
(PARTE) NO BAIRRO JOSÉ GOLÇALVES

TEMPO CLIMA

BOM	X	INSTÁVEL		CHUVOSO		IMPRATICÁVEL	
-----	---	----------	--	---------	--	--------------	--

Pessoal

Função	Quant.
Engenheiro	1
Encarregado	1
Pedreiro	3
Servente	7
Carpinteiro/Armador	
Calceteiro	

Equipamento

Descrição	Quant.
Caminhão Toco	1
Compactador sapo	2
Retro escavadeira	1

Serviços Realizados

- *EXECUÇÃO DE ESCAVAÇÃO DO PV-38 AO PV 39
- *COLOCAÇÃO DE TUBO DE 500MM
- *EMBASAMENTO DE TUBULAÇÃO
- *REATERRO MANUAL DE VALA E COMPACTAÇÃO
- *EXECUÇÃO DE PV

COMENTÁRIOS DO FISCAL:

COMENTÁRIOS DA EMPRESA:

RESP. PELA EMPRESA

José Roberto Marques Cruz
Engenheiro Civil
CREA-RJ: 199010083

ENG. FISCAL

José Pedro Santos
Gerente de Planejamento
Mat.: 13004

DIAS CORRIDO 38

Armação dos Búzios

CONTRATO Nº 010/2018

OBRA

22-jun-18

Quarta-Feira

OBRA DE PAV. E DRENAGEM DA RUA CANTO DO CÉU E RUA MORRO DAS EMERÊNCIAS
(PARTE) NO BAIRRO JOSÉ GOLÇALVES

TEMPO CLIMA

BOM	X	INSTÁVEL		CHUVOSO		IMPRATICÁVEL	
-----	---	----------	--	---------	--	--------------	--

Pessoal	
Função	Quant.
Engenheiro	1
Encarregado	1
Pedreiro	3
Servente	7
Carpinteiro/Armador	
Calceteiro	

Equipamento	
Descrição	Quant.
Caminhão Toco	1
Compactador sapo	2
Retro escavadeira	1

Serviços Realizados

- *EXECUÇÃO DE ESCAVAÇÃO DO PV-15 AO PV 14
- *COLOCAÇÃO DE TUBO DE 600MM
- *EMBASAMENTO DE TUBULAÇÃO
- *REATERRO MANUAL DE VALA E COMPACTAÇÃO
- *EXECUÇÃO DE PV

COMENTÁRIOS DO FISCAL:


COMENTÁRIOS DA EMPRESA:


DEVIDO A GREVE DOS CAMINHONEIROS ESTAMOS COM DIFICULDADES DE ENTREGA DE MATERIAL E ABASTECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS.

RESP. PELA EMPRESA


 José Roberto Marques Cruz
 Engenheiro Civil
 CREA-RJ-199010033

ENG. FISCAL




 DAFLA
 CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS



DAFLA
CONSTRUÇÃO | SERVIÇOS | GERENCIAMENTO

Diário de Obras

Armação dos Búzios

DIAS CORRIDO 39

CONTRATO Nº 010/2018

OBRA

23-jun-18

Quinta-Feira

OBRA DE PAV. E DRENAGEM DA RUA CANTO DO CÉU E RUA MORRO DAS EMERÊNCIAS (PARTE)
NO BAIRRO JOSÉ GOLÇALVES

TEMPO CLIMA

BOM	X	INSTÁVEL		CHUVOSO		IMPRATICÁVEL	
-----	---	----------	--	---------	--	--------------	--

Pessoal	
Função	Quant.
Engenheiro	1
Encarregado	1
Pedreiro	3
Servente	7
Carpinteiro/Armador	
Calceteiro	

Equipamento	
Descrição	Quant.
Caminhão Toco	1
Compactador sapo	2
Retro escavadeira	1

Serviços Realizados

- *EXECUÇÃO DE ESCAVAÇÃO DO PV-15 AO PV 14
- *COLOCAÇÃO DE TUBO DE 600MM
- *EMBASAMENTO DE TUBULAÇÃO
- *REATERRO MANUAL DE VALA E COMPACTAÇÃO
- *EXECUÇÃO DE PV

COMENTÁRIOS DO FISCAL:

COMENTÁRIOS DA EMPRESA:

RESP. PELA EMPRESA

José Roberto Marques Cruz
Engenheiro Civil
CREA-RJ 139010063

ENG. FISCAL

João Pedro Santos
Engenheiro de Edificação
MRL 13600



DAFLA
CONSTRUÇÃO | SERVIÇOS | GERENCIAMENTO

Diário de Obras

DIAS CORRIDO 40

Armação dos Búzios

OBRA:

CONTRATO Nº

010/2018

24-jun-18

Sexta-Feira

OBRA DE PAV. E DRENAGEM DA RUA CANTO DO CÉU E RUA MORRO DAS EMERÊNCIAS (PARTE)
NO BAIRRO JOSÉ GOLÇALVES

TEMPO CLIMA

BOM	X	INSTÁVEL		CHUVOSO		IMPRATICÁVEL	
-----	---	----------	--	---------	--	--------------	--

Pessoal

Função	Quant.
Engenheiro	1
Encarregado	1
Pedreiro	3
Servente	7
Carpinteiro/Armador	
Calceteiro	

Equipamento

Descrição	Quant.
Caminhão Toco	1
Compactador sapo	2
Retro escavadeira	1

Serviços Realizados

- *EXECUÇÃO DE ESCAVAÇÃO DO PV-14 AO PV 13
- *COLOCAÇÃO DE TUBO DE 600MM
- *EMBASAMENTO DE TUBULAÇÃO
- *REATERRO MANUAL DE VALA E COMPACTAÇÃO
- *EXECUÇÃO DE PV

COMENTÁRIOS DO FISCAL:

COMENTÁRIOS DA EMPRESA:

RESP. PELA EMPRESA

José Roberto Marques Cruz
Engenheiro Civil
CREA-RJ: 199019883

ENG. FISCAL

John Andre Soares
Gerente de Planejamento
E-mail: jsoares@dafla.com.br

Armação dos Búzios

CONTRATO Nº 010/2018

OBRA 25-jun-18 26-jun-18 Sábado Domingo

OBRA DE PAV. E DRENAGEM DA RUA CANTO DO CÉU E RUA MORRO DAS EMERÊNCIAS (PARTE)

TEMPO CLIMA

BOM		INSTÁVEL		CHUVOSO		IMPRATICÁVEL	
-----	--	----------	--	---------	--	--------------	--

Pessoal	
Função	Quant.
Engenheiro	
Encarregado	
Pedreiro	
Servente	
Carpinteiro/Armador	
Calceteiro	

Equipamento	
Descrição	Quant.
Caminhão Toco	
Compactador sapo	
Retro escavadeira	

Serviços Realizados


COMENTÁRIOS DO FISCAL:

COMENTÁRIOS DA EMPRESA:

RESP. PELA EMPRESA

 José Roberto Marques Cruz
 Engenheiro Civil
 CREA-RJ: 138010003

ENG. FISCAL



 José Roberto Marques Cruz
 Engenheiro Civil
 CREA-RJ: 138010003

CONTRATO N° 010/2018Processo Administrativo N° 611/2017

**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE
ENGENHARIA NO MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO
DOS BÚZIOS QUE FAZEM ENTRE SI O
MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS E A
EMPRESA DAFLA CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E
GERENCIAMENTO LTDA EPP**

O MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS, pessoa jurídica de direito público interno, devidamente inscrito no CNPJ/MF sob n.º 01.616.171/0001-02, com sede administrativa situada na Estrada da Usina Velha, n.º 600, Centro, Armação dos Búzios - RJ, representado neste ato pela Secretaria Municipal de Obras e Saneamento, através do secretário nomeado pela portaria sob o n.º 608/2014, Sr. Paulo Abranches Guedes Junior, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade profissional n.º 169.628-D, expedido pelo CREA/RJ e no Cadastro de Pessoas Físicas sob o n.º 079.320.508-55, doravante denominado **CONTRATANTE** e a empresa **DAFLA CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E GERENCIAMENTO LTDA EPP**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 12.603.970/0001-60, com sede na Estrada Francisco da Cruz Nunes, n.º 8.180 - Sala 210 - Itaipu - Niterói/RJ - CEP: 24.340-000, neste ato representado por seus administradores Sr. Flávio Leal Pinto, brasileiro, casado, empresário, portador da carteira de identidade n.º 11943036-1 expedida pelo IFP, inscrito no CPF sob o n.º 078.623.967-07, residente e domiciliado na Rua São Fábio, n.º 40, apto. 304, Itaipu, Niterói/RJ - CEP: 24.355-230 e Sr. Danilo Braz Pereira, brasileiro, casado, empresário, portador da carteira de identidade n.º 13287187-2 expedida pelo IFP, inscrito no CPF sob o n.º 096.787.977-98, residente e domiciliado na Avenida Silvio Picanço, n.º 615-A, apto 402, Charitas, Niterói - RJ, CEP: 24.360-030, doravante denominada **CONTRATADA**, nos autos do processo administrativo n.º 611/17, mediante Concorrência Pública n.º 005/2017, e perante as testemunhas abaixo firmadas, pactuam o presente contrato, na do Contrato n.º 017/2015, tem entre si ajustados o aditivo do

ESTRADA DA USINA, 600 - CENTRO - CEP: 28950-000

PROCURADORIA@BUZIOS.RJ.GOV.BR



forma da Lei n.º 8.666/93, e suas alterações, perante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

1.1. O presente contrato administrativo tem por objeto a Contratação de Empresa Especializada para Obra de Pavimentação, drenagem da Rua Canto do Céu e Rua Morro das Emerências (parte) no Bairro José Gonçalves.

1.2 Conforme projeto básico, planta de localização e proposta apresentada que, para todos os fins e efeitos legais, são partes integrantes deste contrato.

1.3. O objeto deste contrato somente será recebido, nos termos do Art. 73, inciso I e parágrafos, da Lei Federal n.º 8666/93, se estiver plenamente de acordo com as especificações constantes dos documentos citados no projeto básico.

CLÁUSULA SEGUNDA: REGIME DE EXECUÇÃO

2.1. Obriga-se a CONTRATADA a executar o objeto deste Contrato pelo regime de execução por preço unitário, nos termos do artigo 10, II, "b" da Lei n.º 8.666/1993.

2.2. Os serviços deverão ser executados obedecendo, fiel e integralmente, a todas as normas, itens, elementos, especificações, condições, projetos, perfis e desenhos constantes do Processo, Edital, Anexos e instruções que forem fornecidas pelo Município.

2.3. Os documentos referidos no parágrafo antecedente, aceitos e conferidos pela CONTRATADA, passam juntamente com sua proposta, a constituir parte integrante deste Contrato para todos os fins e efeitos.

CLÁUSULA TERCEIRA: DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

3.1. Para a prestação dos serviços a serem realizados é estipulado o valor global de R\$ 1.447.850,10 (hum milhão, quatrocentos e quarenta e sete mil, oitocentos e cinquenta e reais e dez centavos).



3.2. Os valores serão pagos, após o respectivo adimplemento das obrigações constantes no edital e projeto básico, devendo as faturas serem apresentadas na Secretaria Municipal de Obras do Município de Armação dos Búzios - RJ, juntamente com as notas de empenho correspondentes.

3.3. A realização de todo e qualquer pagamento devido à CONTRATADA, em decorrência do presente Contrato, e de eventuais aditamentos, só se efetivará mediante autorização da CONTRATANTE, observada a legislação de Administração Financeira e Contabilidade Pública.

3.4. O prazo para pagamento é de 30 (trinta) dias contados a partir do adimplemento de cada parcela, a contar do protocolo de entrega das faturas, devidamente atestadas na Secretaria Municipal de Obras e Saneamento, como forma de permitir o cálculo de multa por atraso e descontos por eventuais antecipações de pagamentos.

3.4.1. Na hipótese de atraso no pagamento, desde que decorra de culpado Município, incidirá multa na ordem de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor da fatura e originará compensação financeira na ordem de 0,033% (trinta e três milésimos por cento) por dia de atraso, calculado sobre a parcela devida.

3.4.2. Na hipótese de antecipação de pagamento, o valor sofrerá desconto de 1% (um por cento) ao mês, calculado com base nos índices da IPCA, "pro rata die", considerando-se data de vencimento o trigésimo dia após a data do protocolo do documento de cobrança na Secretaria.

3.5. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

3.6. As despesas decorrentes deste contrato correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias:

I) Empenho n°. 000257

Prog. Trabalho n° 15.451.0028.1.304

Despesa n° 4.4.90.51.00



Fonte - 004

Valor: R\$ 10.000,00

II) Empenho n°. 000258

Prog. Trabalho n° 15.451.0028.1.304

Despesa n° 4.4.90.51.00

Fonte - 123 - Convênio

Valor: R\$ 1.000.000,00

3.7. Fica assegurada a correção do presente contrato através dos índices legais.

3.8. O valor do contrato é fixo e irreajustável, até o prazo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias consecutivos, prazo após o qual será admitido, na hipótese de prorrogação do Contrato, em havendo justificativa, reajuste do valor, somente em suas parcelas remanescentes, obedecendo à variação dos índices IPCA, correspondente às famílias constantes da planilha orçamentária, consoante a fórmula contida no item 26 do Edital e tendo como data base a data da apresentação da proposta pela CONTRATADA.

3.9. O pagamento será efetivado mediante crédito em conta bancária que o beneficiário informará.


3.10. Informar o número do Convênio nas notas fiscais.

CLÁUSULA QUARTA: DO PRAZO

4.1. O prazo para execução dos serviços ora contratados será de 12 (doze) meses, a contar do recebimento da Ordem de serviço inaugural.

4.2. Quanto à prorrogação, será observado o que dispõe o parágrafo primeiro do artigo 57 da Lei Federal n° 8666/93.

4.3. O cronograma de desembolso do pagamento do objeto deste Contrato será efetuado conforme especificações do Edital de Licitação, ficando a CONTRATADA obrigada executar os serviços



dentro do prazo fixado, independente dos valores medidos durante a execução.

CLÁUSULA QUINTA: DA MANUTENÇÃO E FISCALIZAÇÃO

5.1. O CONTRATANTE deverá promover a fiscalização sistemática da realização dos serviços contratados através da juntada do material de publicidade nos autos do procedimento administrativo.

5.2. A fiscalização da prestação de serviço caberá ao CONTRATANTE, notada à unidade requisitante, ou a quem dele preposto seja, a quem incumbirá a pratica de todos e quaisquer atos próprios ao exercício desse procedimento, definidos na legislação pertinente e, em especial, na especificação do serviço, inclusive quanto à aplicação das penalidades previstas neste contrato.

5.3. A CONTRATADA declara antecipadamente, aceitar todas as decisões, métodos e processos de inspeção, verificação e controle adotados pelo CONTRATANTE, obrigando-se a fornecer os dados, elementos, explicações, esclarecimentos e comunicações de que este necessitar e que forem julgados necessários ao desempenho de suas atividades.

5.4. Compete à CONTRATADA fazer minucioso exame das especificações dos serviços, de modo a permitir, a tempo e por escrito, apresentar à fiscalização todas as divergências ou dúvidas porventura encontradas, para o devido esclarecimento, que venham a impedir o bom desempenho do contrato. O silêncio implica total aceitação das condições estabelecidas.

5.5. A atuação fiscalizadora em nada restringirá a responsabilidade única, integral e exclusiva da CONTRATADA no que concerne ao serviço prestado, à sua entrega e às consequências e implicações, próximas ou remotas, perante o CONTRATANTE, ou perante terceiros, do mesmo modo que a ocorrência de eventuais irregularidades na entrega dos mesmos não implicará em co-responsabilidade do CONTRATANTE e de seus prepostos.

5.6. A fiscalização quanto ao atendimento das necessidades técnico-operacionais do serviço ficará a cargo da Secretaria



Municipal de Obras e Saneamento, nos termos do artigo 67, da Lei Federal nº 8.666/93.

5.7 Os fiscais designados pela Secretaria Municipal de Obras e Saneamento do Município anotaram em registro próprio as ocorrências relativas à execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. No que exceder à sua competência, comunicará o fato ao Secretário Municipal de Obras e Saneamento, em tempo hábil, para adoção das medidas cabíveis.


5.8 A CONTRATADA deverá manter nos locais dos serviços, prepostos aceitos pelo MUNICÍPIO, para prover ao que disser respeito à regular execução do contrato.

5.9 A fiscalização exercerá rigoroso controle em relação à quantidade, particularidade e qualidade na execução do contrato, aplicando as penalidades previstas, quando não atendidas às disposições contratuais respectivas.

5.10 O responsável pela fiscalização da execução dos serviços será indicado pela Secretaria Municipal de Obras e Saneamento, devendo a CONTRATADA se submeter a todas as medidas, processos e procedimentos adotados. Os atos de supervisão, inclusive inspeções e testes executados ou atestados pelo MUNICÍPIO ou por seus prepostos, não eximem a CONTRATADA de suas obrigações no que se refere ao cumprimento do projeto e de suas especificações, nem de qualquer de suas responsabilidades legais e contratuais, em especial, as vinculadas à qualidade dos materiais utilizados na execução dos serviços, os quais deverão obedecer a todas as normas técnicas pertinentes e, em especial, àquelas expedidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.

5.11 A CONTRATADA se obriga a permitir ao pessoal da Fiscalização acesso a todas as dependências, possibilitando o exame das instalações e também das anotações relativas às máquinas, ao pessoal e ao material, fornecendo, quando solicitado, todos os dados e elementos referentes à execução do contrato.

5.12 A existência e atuação da Fiscalização em nada restringem a responsabilidade única, integral e exclusiva da CONTRATADA, no que concerne aos serviços, à sua execução e as suas consequências, próximas ou remotas, perante o MUNICÍPIO ou terceiros, de modo que a ocorrência de eventuais



irregularidades, na execução dos serviços contratados, não implica em co-responsabilidade do MUNICÍPIO e/ou preposto.

5.13 Em caso de atraso no cronograma por culpa da CONTRATADA, poderá a Fiscalização determinar a execução dos serviços em horário extraordinário, correndo por conta da CONTRATADA as despesas decorrentes.

5.14 É facultado à Fiscalização determinar, no interesse da Administração a suspensão ou diminuição do ritmo dos trabalhos, com a consequente adaptação do cronograma.

CLÁUSULA SEXTA: DAS PENALIDADES

6.1. O inadimplemento total ou parcial de qualquer das obrigações ora estabelecidas, implicará, além das sanções previstas na Lei n.º 8.666/93, artigo 86 a 88, as seguintes penalidades:

- a) Advertência;
- b) Multa administrativa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, sem prejuízo de perdas e danos e da multa moratória cabíveis;
- c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a PMAC, por prazo não superior a 02 (dois) anos.
- d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o CONTRATADO ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicável, conforme letra c desta cláusula.

6.1.1. A penalidade estabelecida no subitem anterior é de competência do Prefeito Municipal.

6.1.2. Após o décimo dia de atraso ou no caso de reincidência na execução imperfeita do contrato, poderá restar caracterizado o descumprimento total da obrigação assumida, ensejando a rescisão unilateral de relação contratual e/ou cancelamento da respectiva nota de empenho pela Administração. Sujeita-se, ainda, a CONTRATADA às sanções previstas nessa cláusula.



6.1.3. O valor da multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontado da garantia do respectivo contratado, se essa tiver sido exigida.

6.1.4. Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o CONTRATADO por sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou, ainda, quando for o caso, cobrado judicialmente.

6.1.5. A multa a que alude este item não impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique cumulativamente as sanções previstas pela Lei 8.666/1993.

6.1.6. Quem, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, ensejar o retardamento da execução de seu objeto por não celebrar o contrato, deixar de entregar o objeto, apresentar documentação falsa exigida para o certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar a execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com o Município e será descredenciado no sistema de cadastramento de fornecedores a que se refere o artigo 4º, inciso XIV da Lei nº 10.520/2002, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas para o caso.

6.1.7. As penalidades poderão ser registradas no sistema de cadastro de fornecedores e, no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas para o caso.

6.1.8. A multa não exime a CONTRATADA de responsabilidade por perdas e danos decorrentes de infrações cometidas.

6.2. Nas hipóteses de aplicação das penalidades, será garantido contraditório e ampla defesa em processo administrativo.

CLÁUSULA SÉTIMA: DA RESCISÃO

7.1. A contratante poderá rescindir administrativamente o presente contrato, nas hipóteses previstas no Art. 78, incisos I ao XII, da Lei 8.666/93, sem que acarrete, para a contratada, direito a indenização, sem prejuízo das penalidades pertinentes.



7.2. Na hipótese de rescisão administrativa, além das demais sanções previstas na legislação pertinente, ficará a CONTRATADA sujeita, ainda, à multa de até 20% (vinte por cento) do valor global atualizado do Contrato, sem prejuízo da reposição das importâncias indevidamente recebidas e das perdas e danos que forem apurados.

7.3. A rescisão administrativa observará o disposto no artigo 80 da Lei Federal nº. 8.666/1993.

CLÁUSULA OITAVA: DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA

8.1 O presente não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no seu todo ou em parte, exceto nos casos permitidos de subcontratação e/ou sub-rogação, com prévio e expresse consentimento do MUNICIPIO, sob pena de imediata rescisão.

CLÁUSULA NONA: DAS RESPONSABILIDADES

9.1. A CONTRATADA assume, na forma do Art. 70 e seguintes da Lei 8.666/93, como exclusivamente seus, os riscos e as despesas decorrentes do fornecimento de material, mão-de-obra, aparelhos e equipamentos necessários a boa e perfeita execução dos serviços contratados. Responsabilizando-se também, pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, prepostos ou subordinados, e ainda, por quaisquer prejuízos que sejam causados a CONTRATANTE ou a terceiros.

9.2. O CONTRATANTE não responderá por quaisquer ônus, direitos ou obrigações vinculadas à legislação tributária, trabalhista, previdenciária securitária, e decorrente da execução do presente contrato, cujo cumprimento e responsabilidade caberão exclusivamente à CONTRATADA.

9.3. A CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

9.4. A CONTRATADA deverá manter durante toda a execução do contrato as condições de habilitação e qualificação que lhe foram exigidas no processo.

**CLAUSULA DÉCIMA: DAS OBRIGAÇÕES****10.1 - Do CONTRATANTE:**

10.1.1 - Executar fielmente o contrato, de acordo com as cláusulas avençadas, respondendo pelas consequências de sua inexecução total ou parcial;

10.1.2 - Atestar nas notas fiscais/faturas o efetivo a efetiva prestação do objeto deste contrato;

10.1.3 - Aplicar à empresa vencedora penalidades, quando for o caso;

10.1.4 - Prestar à CONTRATADA toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária à perfeita execução do Contrato;

10.1.5 - Efetuar o pagamento à Contratada no prazo avençado, após a entrega das faturas no setor competente, devidamente atestada por servidor deste setor, conforme alínea "a", inciso XIV, do artigo 40, da Lei n°. 8.666/1993;

10.1.6 - Notificar, por escrito, à CONTRATADA da aplicação de qualquer sanção;

10.1.7 - Fiscalizar a execução do contrato, com o direito de impugnar tudo o que estiver em desacordo com estas instruções e a boa técnica de execução;

10.2 - Da CONTRATADA:

10.2.1 - Executar fielmente o contrato, de acordo com as cláusulas avençadas e exigidas no edital e seus anexos, bem como na nota de empenho, dentro do prazo estipulado, respondendo pelas consequências de sua inexecução total ou parcial;

10.2.2 - Prestar o serviço no local determinado no edital;

10.2.3 - Manter contato permanente com a Secretaria responsável pela retirada da nota de empenho;

10.2.4 - Pagar todos os tributos que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre os produtos e serviços;



- 10.2.5 - Manter, durante a execução do contrato, as mesmas condições de habilitação;
- 10.2.6 - Tomar medidas preventivas necessárias para evitar danos a terceiros, em consequência da prestação de serviço. Será de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA a obrigação de reparar os prejuízos que vier a causar a quem quer que seja e quaisquer que tenham sido as medidas preventivas acaso adotadas;
- 10.2.7 - Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no quantitativo do objeto desta licitação, até o limite legal;
- 10.2.8 - atender a determinações e exigências formuladas pelo CONTRATANTE;
- 10.2.9 - Executar o objeto licitado, no preço, prazo e forma estipulados na proposta, no edital e seus anexos;
- 10.2.10 - Executar o objeto com boa qualidade, dentro dos padrões exigidos neste edital;
- 10.2.11 - refazer, por sua conta e responsabilidade, a qualquer época, o serviço prestado, desde que fique comprovada a existência de não conformidade com o exigido no certame, somente possível de aferição com a devida utilização;
- 10.2.12 - reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem os vícios, defeitos ou incorreções resultantes de execução ou de materiais empregados;
- 10.2.13 - Não subcontratar, ceder ou transferir a terceiros a execução do objeto, ainda que parcial, sendo nulo de pleno direito qualquer ato nesse sentido, além de constituir infração passível de penalidade, salvo em caso de autorização expressa do CONTRATANTE;
- 10.2.14 - Ser responsável pelos danos causados diretamente à contratante ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato;
- 10.2.15 - Responder pelo pagamento dos salários devidos pela mão-de-obra empregada nos serviços, pelos encargos trabalhistas, fiscais e previdenciários respectivos, e por



tudo mais que, como empregadora deve satisfazer, além de ficar sob sua integral responsabilidade e observância das leis trabalhistas, previdenciárias e fiscais, assim como os registros, seguros contra riscos de acidente do trabalho, impostos e outras providências e obrigações necessárias à execução dos serviços;

10.2.16 - Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito ou de força maior, por qualquer causa de destruição, danificação, defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens do contratante, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos na via pública junto à execução dos serviços;

10.2.17 - Executar o objeto contratado com completa organização, elevada qualidade e no prazo estipulado;

10.2.18 - Realizar com seus próprios recursos todas as obrigações relacionadas com o objeto desta licitação, de acordo com as especificações determinadas neste edital e em seus anexos;

10.2.19 - Cumprir a legislação federal, estadual e municipal pertinente, bem como se responsabilizar pelos danos e encargos de qualquer espécie decorrentes de ações ou omissões, culposas ou dolosas, que praticar durante a execução do contrato;

10.2.20 - A CONTRATADA se obriga a cumprir fielmente, durante a execução do contrato, todas as determinações constantes do Edital e seus anexos, as condições de habilitação assumidas, sua Proposta de Preços, bem como a legislação invocada no preâmbulo do instrumento contratual.

10.2.21 - A CONTRATADA deverá executar os serviços decorrentes do respectivo contrato em estrita conformidade com as orientações e descrições previstas no Edital. A não observância desta obrigatoriedade implicará em sua correção pelas CONTRATADAS, sem qualquer ônus para o MUNICÍPIO, bem como na eventual aplicação de sanções por atraso ou qualquer outra irregularidade na execução do contrato.

10.2.22 - Compete à CONTRATADA responder por todos os ônus, encargos e obrigações comerciais, fiscais, tributárias e trabalhistas, por todas as despesas decorrentes de eventuais



tudo mais que, como empregadora deve satisfazer, além de ficar sob sua integral responsabilidade e observância das leis trabalhistas, previdenciárias e fiscais, assim como os registros, seguros contra riscos de acidente do trabalho, impostos e outras providências e obrigações necessárias à execução dos serviços;

10.2.16 - Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito ou de força maior, por qualquer causa de destruição, danificação, defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens do contratante, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos na via pública junto à execução dos serviços;

10.2.17 - Executar o objeto contratado com completa organização, elevada qualidade e no prazo estipulado;

10.2.18 - Realizar com seus próprios recursos todas as obrigações relacionadas com o objeto desta licitação, de acordo com as especificações determinadas neste edital e em seus anexos;

10.2.19 - Cumprir a legislação federal, estadual e municipal pertinente, bem como se responsabilizar pelos danos e encargos de qualquer espécie decorrentes de ações ou omissões, culposas ou dolosas, que praticar durante a execução do contrato;

10.2.20 - A CONTRATADA se obriga a cumprir fielmente, durante a execução do contrato, todas as determinações constantes do Edital e seus anexos, as condições de habilitação assumidas, sua Proposta de Preços, bem como a legislação invocada no preâmbulo do instrumento contratual.

10.2.21 - A CONTRATADA deverá executar os serviços decorrentes do respectivo contrato em estrita conformidade com as orientações e descrições previstas no Edital. A não observância desta obrigatoriedade implicará em sua correção pelas CONTRATADAS, sem qualquer ônus para o MUNICÍPIO, bem como na eventual aplicação de sanções por atraso ou qualquer outra irregularidade na execução do contrato.

10.2.22 - Compete à CONTRATADA responder por todos os ônus, encargos e obrigações comerciais, fiscais, tributárias e trabalhistas, por todas as despesas decorrentes de eventuais



trabalhos noturnos e por todos os danos e prejuízos que, a qualquer título, venha a causar a terceiros, em especial, à concessionária de serviços públicos, em virtude da execução dos serviços a seu encargo, respondendo por si, seus empregados, prepostos e seus assessores.

10.2.23 - A CONTRATADA se obriga a manter constante e permanente vigilância sobre os serviços executadas, até a sua aceitação definitiva, bem como sobre os materiais e equipamentos utilizados, cabendo-lhe todas as responsabilidades por qualquer perda ou dano que venham aqueles a sofrer.

10.2.24 - A substituição de qualquer profissional da equipe técnica só poderá ocorrer com a anuência do MUNICÍPIO CONTRATANTE.

10.2.25 - Compete, ainda, à CONTRATADA, reparar, corrigir, remover ou reconstituir, às suas expensas, no total ou em parte, bens ou serviços objeto do CONTRATO, em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da sua execução ou da má qualidade dos materiais empregados.

10.2.26 - O MUNICÍPIO não é responsável por quaisquer ônus, direito, obrigações vinculadas à legislação tributária, trabalhista, previdenciária ou securitária, decorrentes da execução do presente contrato, cujo cumprimento e responsabilidade caberão exclusivamente à CONTRATADA.

10.2.27 - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança do serviço, nem a ético-profissional, pela perfeita execução do contrato.

10.2.28 - A CONTRATADA será obrigada a afastar do serviço qualquer membro de sua equipe técnica que a juízo da Secretaria Municipal de Obras e Saneamento seja considerado prejudicial ao bom andamento e perfeição dos trabalhos.

10.2.29 - A CONTRATADA promoverá a remoção imediata de todo e qualquer material ou equipamento, cujo emprego seja impugnado pela fiscalização.

10.2.30 - A CONTRATADA deverá colocar uniformes dos funcionários e equipamentos que estarão "A Serviço da Prefeitura Municipal de Armação dos Búzios".



10.2.31 - A CONTRATADA deverá disponibilizar, juntamente com os projetos executivos, as memórias de cálculo de dimensionamento a eles relativos, para fins de verificação de adequação da solução adequada.

10.2.32 - A CONTRATADA deverá observar na execução do contrato, os dispositivos estabelecidos na RESOLUÇÃO N° 307 de 05 de Julho de 2002, do CONAMA (Conselho Nacional de Meio Ambiente), no que tange à gestão de resíduos da construção civil.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA RESPONSABILIDADE PELOS SERVIÇOS

11.1 O profissional responsável pela execução dos serviços obriga-se a cumprir, dentro do prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da assinatura do presente Contrato, o que determina a Lei n°. 6.496, de 07/12/77, e a Resolução n°. 287, do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, sob pena de ser aplicada à CONTRATADA a multa de 5% (cinco por cento) do valor do contrato e/ou a suspensão dos pagamentos até o efetivo cumprimento dessa obrigação por parte do referido engenheiro.


CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA ACEITAÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO

12.1 A aceitação do serviço se dará mediante a avaliação de funcionários do CONTRATANTE que constatarão se o projeto atende a todas as especificações contidas no edital.

12.2. Na recusa de aceitação por não atenderem às exigências do CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá refazer qualquer serviço defeituoso ou qualitativamente inferiores, passando a contar os prazos para pagamento e demais compromissos da CONTRATANTE a partir da data da efetiva aceitação.

12.3. A aceitação do serviço será provisório para efeito de posterior verificação da conformidade do serviço com a especificação e, definitivo após a verificação da qualidade e quantidade do serviço e conseqüente aceitação.

12.4. Salvo se houver exigência a ser cumprida pelo adjudicatário, o processamento da aceitação provisória ou definitiva deverá ficar concluído no prazo de 30 (trinta) dias úteis, contados da entrada do respectivo requerimento no protocolo da repartição interessada.



12.5. Para os itens a que porventura esta determinação for aplicável, só serão aceitas as entregas cujos serviços tenham garantia não inferior a 12 (doze) meses.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DAS CLÁUSULAS EXORBITANTES

13.1 Fazem parte do presente contrato as prerrogativas constantes do artigo 58, da Lei n°. 8.666/1993.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DOS TRIBUTOS E DESPESAS

14.1 Constituirá encargo exclusivo da CONTRATADA o pagamento de tributos, tarifas, emolumentos e despesas decorrentes da formalização deste contrato e da execução de seu objeto.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DA GARANTIA

15.1 Para fiel cumprimento das obrigações assumidas, a Contratada prestará garantia contratual em quantia equivalente a 5% do valor total contratado, através de uma das modalidades previstas no art. 56 da Lei Federal n° 8.666/1993.

15.2 A CONTRATADA deverá manter as garantias atualizadas durante a vigência do contrato, complementando-a, no prazo de 05 (cinco) dias, sempre que notificada para tanto.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DAS MEDIÇÕES

16.1 As medições serão realizadas em conformidade com a apropriação dos serviços, obedecendo aos quantitativos dos serviços realmente executados pela CONTRATADA e deverão ser pagas pelo custo unitário estimado pela CONTRATANTE com o mesmo desconto legal ofertado.

16.2 A cada alteração contratual necessária, por acréscimo ou redução do objeto, valor ou prazo do contrato, observado o limite legal de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato, será acordado novo cronograma, atendido o interesse da CONTRATANTE.



16.3 As quantidades eventualmente acrescidas, por termos aditivos, deverão ser pagas pelo custo unitário estimado pela CONTRATANTE com o mesmo desconto ou acréscimo global ofertado.

16.4 Em caso de necessidade de introdução de itens novos, será adotado o custo unitário constante da tabela EMOP/SCO, com a data base da proposta ofertada no processo licitatório, acrescido do percentual BDI correspondente, com o mesmo desconto em relação ao ofertado pela CONTRATADA. Em caso de preços unitários novos que não estejam previstos no referido catálogo, será adotado o menor preço, resultante de cotação de mercado, no mínimo com 03 (três) empresas especializadas, devendo as propostas serem anexadas aos autos do processo administrativo referente a esta obra, com a devida autorização da fiscalização, acrescido com o fator relativo da variação entre o valor total ofertado e o valor estimado.

16.5 Deverá ser elaborado pela CONTRATADA memória de cálculos detalhadas, para acompanhar as medições realizadas, com a indicação dos locais precisos da execução dos serviços e das dimensões e das dimensões de cada parte ou trecho do item medido;

16.6 As medições dos itens de transportes devem indicar a origem, o destino, o percurso e o equipamento utilizados.


CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA: DA PUBLICAÇÃO

17.1 Até o quinto dia útil do mês seguinte ao da assinatura do presente, será providenciada a publicação resumida deste contrato, na Imprensa Oficial, onde são publicadas os atos do Poder Executivo, para ocorrer no prazo de 20(vinte) dias daquela data (na forma do art. 61, Súnico).

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: DO FORO

18.1 Fica eleito o Foro da Cidade de Armação dos Búzios, com a exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser, para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios oriundos deste contrato.

E por estarem justos e acordados, firmam o presente ~~TERMO DE~~ CONTRATO em 5 (cinco) vias de igual forma e teor, mas para um



só e único e feito, que depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes contratantes e por duas testemunhas abaixo identificadas.

Armação dos Búzios, 20 de março de 2018.

MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Eng. Paulo Abranches

SECRETÁRIO DE OBRAS

E SANEAMENTO

Mat. 12.974

DAFLA CONSTRUÇÃO SERVIÇOS
E GERENCIAMENTO LTDA-EPP
CNPJ: 12.603.970/0001-80

DAFLA CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E GERENCIAMENTO LTDA EPP

Testemunha 01	Testemunha 02
Assinatura 	Assinatura
Nome Nicole Speroni Gomes	Nome João Pedro Santos de Souza
RG 21.334.307-2	RG 21.323-630-0
CPF 138.797.937-00	CPF 123.688.527-94



PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

ESTRADA DA USINA 0600 - CENTRO

C.N.P.J 01.616.171/0001-02

Emissão: 09/03/2018

Página: 1

NOTA DE EMPENHO

Exercício: 2018

EMPENHO: 000257	CONTRATO:
TIPO: GLOBAL	CONVÊNIO:
DATA DE EMISSÃO: 09/03/2018	MODALIDADE: LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA PÚBLICA
No.PROCESSO: 000/00611/17	LICITAÇÃO: 005/2017
	BASE LEGAL: 30 - Concorrência, Art. 22, Inciso I, Lei 8.666

Favorecido

NOME/R.SOCIAL: DAFLA CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E GERENCIAMENTO LTDA
CPF/CNPJ.....: 12.603.970/0001-60 R.G:
ENDEREÇO.....: ESTRADA FRANCISCO DA CRUZ NUNES NÚMERO 8180 SALA
IRRO.....: 210
 ITAIPU CIDADE: NITEROI U.F: RJ CEP: 24340000

Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO MORRO DAS EMERÊNCIAS CONFORME CONVÊNIO SICONV 831101/2016 (CONTRAPARTIDA) NO EXERCÍCIO DE 2018.

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Unid.Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO

Prog.Trabalho: 15.451.0028.1.304 - RECUPERAÇÃO DA ESTRADA MORRO DAS EMERÊNCIAS.

Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte: 004 - Roy. Prod.

Saldo Anterior 10.000,00

Valor: 10.000,00

Saldo 0,00

Valor do Empenho

R\$ 10.000,00

(DEZ MIL REAIS)

Declaramos que o valor acima foi deduzido do saldo da(s) respectiva(s) dotação(ões).

Foram conferidos os dados constantes desta nota de Empenho.

CRISTINA CABRAL COSTA
RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nota de Empenho emitida conforme autorização do Ordenador de Despesa.

PAULO ABRANCHES GUEDES JÚNIOR
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO

Eng. Paulo Abranches
SECRETÁRIO DE OBRAS
E SANEAMENTO
Mat. 12.974



PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

ESTRADA DA USINA 0600 - CENTRO

C.N.P.J 01.616.171/0001-02

Emissão: 09/03/2018

Página: 1

NOTA DE EMPENHO

Exercício: 2018

EMPENHO: 000258	CONTRATO:
TIPO: GLOBAL	CONVÊNIO: 831101/2016
DATA DE EMISSÃO: 09/03/2018	MODALIDADE: LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA PÚBLICA
No. PROCESSO: 000/00611/17	LICITAÇÃO: 005/2017
	BASE LEGAL: 30 - Concorrência, Art. 22, Inciso I, Lei 8.666

Favorecido

NOME/R.SOCIAL: DAFLA CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E GERENCIAMENTO LTDA
 CPF/CNPJ.....: 12.603.970/0001-60 R.G:
 ENDEREÇO.....: ESTRADA FRANCISCO DA CRUZ NUNES NÚMERO 8180 SALA
 210
 CIDADE: NITEROI U.F: RJ CEP: 24340000

Especificação:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO MORRO DAS EMERÊNCIAS CONFORME CONVÊNIO SICONV 831101/2016 NO EXERCÍCIO DE 2018.

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS	Saldo Anterior	1.000.000,00
Unid.Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO	Valor:	1.000.000,00
Prog.Trabalho: 15.451.0028.1.304 - RECUPERAÇÃO DA ESTRADA MORRO DAS EMERÊNCIAS.	Saldo	0,00
Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES		
Fonte: 123 - CONVÊNIO		

Valor do Empenho

R\$ 1.000.000,00 (HUM MILHÃO DE REAIS)

Declaramos que o valor acima foi deduzido do saldo da(s) respectiva(s) dotação(ões).


Foram conferidos os dados constantes desta nota de Empenho.

CRISTINA CABRAL COSTA
RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nota de Empenho emitida conforme autorização do Ordenador de Despesa.

PAULO ABRANCHES GUEDES JÚNIOR
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO

Eng. Paulo Abranches
SECRETÁRIO DE OBRAS
E SANEAMENTO
Mat. 12.974



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO


Processo: 611/2017

Convênio Nº: 831101/2007


Nota Fiscal nº: 201800000000004

Medição: 1ª

Valor total Nota Fiscal	R\$ 134.842,88	Empenho	Fonte
Repasse/Convênio	R\$ 124.842,88	258	123
Contrapartida	R\$ 10.000,00	257	004


Paulo Abranches Guedes Junior
Engenheiro – CREA 0601696285
Secretário Municipal de Obras e Saneamento

Eng. Paulo Abranches
SECRETÁRIO DE OBRAS
E SANEAMENTO
Mat. 12.874



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO

Processo Nº: 6445/2018 | Folha: 87

EXAME

CONTRATO: 10/2018

CONTRATADO: DAFLA CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E GERENCIAMENTO
LTDA-EPP

OBJETO: Pavimentação e Drenagem da Rua Canto do Céu e Rua Morro das
Emerências (Parte)

VALOR TOTAL DA OBRA: R\$ 1.447.850,10

VALOR DA 1ª MEDIÇÃO: R\$ 134.842,88

PERÍODO DA MEDIÇÃO: 09/04/2018 à 24/05/2018

TÉRMINO: 08/04/2019

ITEM	DESCRIÇÃO	CUMPRIMENTO		
		SIM	N.A.	FLS.
1	Foi apresentada Carta da Empresa?	X	-	05
2	Foi apresentado o Atestado de Execução do Contrato?	X	-	06
3	Existe vigência contratual para o período em questão?	X	-	66 à 83
4	Há Portaria de Nomeação Fiscal, caso tenha-se feito necessário?	X	-	07
5	Foi apresentada Nota Fiscal?	X	-	08
6	A Nota Fiscal está devidamente atestada por dois funcionários, sendo um deles o fiscal do contrato?	X	-	08
7	Foi apresentada Planilha de Medição a qual se refere?	X	-	09 à 14
8	Foi apresentada Memória de Cálculo?	X	-	15 à 21
9	Foi apresentado o Cronograma Físico-Financeiro?	X	-	22
10	Foi apresentado Relatório Fotográfico?	X	-	23 à 26
11	Foram apresentadas as certidões da empresa?	X	-	27 à 29
12	Foi anexado o Diário de Obra devidamente preenchido?	X	-	30 à 65
13	Foi anexada a cópia da Nota de Empenho?	X	-	84 e 85

Encaminham-se os autos para análise inicial do Patrimônio, Gerência de Fiscalização e posteriormente seja remetida à Liquidação para que sejam tomadas as devidas providências quanto ao pagamento por parte da Prefeitura Municipal de Armação dos Búzios.

Nicole Speroni Gomes

Supervisora

Nicole Speroni Gomes

SEC. DE OBRAS E SANEAMENTO

Supervisora

Mat. 16.626

884



PREFEITURA DA CIDADE DE ARMACAO DOS BUZIOS

15/06/2018 09:35:17

Estrada da Usina, 600
Centro
Armação dos Búzios
RJ

Detalhe do Bem

Código:	Nome:
---------	-------

66665 MORRO DAS EMERÊNCIAS - RECUPERAÇÃO DA ESTRADA

Nº da Plaqueta:	0051298	Data da Posse:	15/06/2018
Nº de Nota Fiscal:	201800000000004	Valor Incorporado:	134.842,88
Nº do Empenho:	258/2018	Nº do Processo:	6445/2018
Fornecedor	DAFLA CONSTRUCAO SERVICOS E GERENC	Nº da Licitação:	005/2017

Unidade Gestora

Prefeitura Municipal de Armação dos Búzios

Centro de Custo

SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SANEAMENTO

Local SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO

Plano de Contas	Grupo	Situação
301030202 BENS IMÓVEIS DE INFRA ESTRUTUR/	201	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM
		IMÓVEL

1ª MEDIÇÃO: Serviço de Recuperação da Estrada Morro das Emerências. Processo de Origem nº 00611/2017. Processo de Pagamento nº 06445/2018. Empenhos nº 000257 e 000258/2018. Nota Fiscal nº 201800000000004

Características Veículos

Placa:	Chassi:	Espécie - Tipo:
Combustível:	Ano Fabricação:	Renavam:
Ano - Modelo:	Cor Predominante:	



PREFEITURA DA CIDADE DE ARMACAO DOS BUZIOS
Secretária Municipal de Fazenda - SEMFA
ISS RETENCAO PREFEITURA

PRESTADOR CÓDIGO: 890913	PRESTADORA EMPRESA: DAFLA CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E GERENCIAMENTI		
TOMADORA CÓDIGO: 34881	TOMADORA EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BUZIOS		
TIPO / NOME LOGRADOURO: EST USINA VELHA	NÚMERO: 600		
COMPLEMENTO:	BAIRRO: CENTRO		
MUNICÍPIO: Armação dos Búzios	UF: RJ		
Nº DAM 16228002	Nº Lançamento 1890802		
BASE DE CÁLCULO: 134.842,88	ALÍQUOTA: 5,00 %	VALOR DO IMPOSTO: 6.742,14	VALOR TOTAL: 6.742,14
PARCELA: 1/1	MES REFERÊNCIA: JUNHO	EXERCÍCIO: 2018	DATA DE VENCIMENTO: 10/07/2018
OBSERVAÇÕES: NOTA FISCAL 04/2018, PROCESSO 6445/2018			

Data de Emissão 18/06/2018 14:26:02 Emitido por: denivaldo



PREFEITURA DA CIDADE DE ARMACAO DOS BUZIOS
Secretária Municipal de Fazenda - SEMFA
ISS RETENCAO PREFEITURA

PARCELA: 1/1		VENCIMENTO: 10/07/2018
INSCRIÇÃO:	EMPRESA: DAFLA CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E GERENCIA	Nº DAM: 16228002
INSTRUÇÕES:		
(+) VALOR DEVIDO - R\$	6.742,14	
(-) VALOR DESCONTO - R\$	0,00	
(+) CORREÇ. MONET. - R\$	0,00	
(+) MULTA DE MORA - R\$	0,00	
(+) JUROS DE MORA - R\$	0,00	
(+) TAXA EMIS. GUIA - R\$	0,00	
(=) VALOR A PAGAR - R\$	\$6.742,14	

81640000067.4 42144849201.5 80710000000.7 01622800205.7



Data de Emissão 18/06/2018 14:26:02 Emitido por: denivaldo

ISS RETIDO PELA PREFEITURA



PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
COORDENADORIA DE LIQUIDAÇÃO

DEMONSTRATIVO DE VALORES PARA RETENÇÃO

CONTRATO: 010/2018 **CONTRATADO:** DAFLA CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E GERENCIAMENTO LTDA EPP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM DA RUA CANTO DO CÉU E RUA MORRO DAS EMERÊNCIAS (PARTE) NO BAIRRO JOSÉ GONÇALVES.

VALOR BRUTO: R\$ 134.842,88 **PERÍODO:** 09/04/2018 À 24/05/2018 **TERMINO:** 08/04/2019

RETENÇÃO				
TRIBUTO	ALÍQUOTA	FATOR	VALOR	FUNDAMENTO
INSS	0%	100%	-	Art. 112, C/c Art. 149, VII, IN 971/2009 - Para os casos de obra
IR	0,0%	100,00	-	Exceção ao Art. 647, §1, 17.
ISS	5%	100%	6.742,14	Despacho exarado pela GEFIS à fl. 89

OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL: **NÃO**

VALOR TOTAL DA RETENÇÃO: **6.742,14**

VALOR LÍQUIDO A PAGAR: **128.100,74**

Armação dos Búzios, 19 de junho de 2018



PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
COORDENADORIA DE LIQUIDAÇÃO

EXAME PARA LIQUIDAÇÃO

CONTRATO: 010/2018

CONTRATADO: DAFLA CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E GERENCIAMENTO LTDA EPP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM DA RUA CANTO DO CÉU E RUA MORRO DAS EMERÊNCIAS (PARTE) NO BAIRRO JOSÉ GONÇALVES.

VALOR BRUTO: R\$ 134.842,88 **PERÍODO:** 09/04/2018 À 24/05/2018 **TERMINO:** 08/04/2019

ITEM	DESCRIÇÃO	CUMPRIMENTO		
		SIM	N.A	FLS
1	Foi apresentada relatório/medição do serviço?	X		9
2	Foi apresentada relatório do fiscal do contrato?	X		6
3	Os itens, quantidades e preços unitários estão de acordo com a proposta e com o cronograma físico financeiro ou cronograma de execução?	X		22
4	Em caso de registro de preço, foi verificado o saldo de ata?		X	-
5	Existe vigência contratual para o período em questão?	X		66
6	Há manifestação do setor de patrimônio quando se trata de bens permanentes ou obras	X		88
7	Há manifestação do setor de contabilidade quando se trata de bens permanentes ou obras		X	-
8	A nota fiscal está dentro da validade, sem rasuras, e foi verificada sua autenticidade?	X		8
9	A natureza da operação está de acordo com o tipo de documento fiscal emitido	X		8
10	A nota fiscal está atestada por 2 funcionários sendo um deles o fiscal do contrato	X		8
11	Se convênio, foi observado a indicação do mesmo na nota fiscal		X	-
12	a nota de empenho está assinada e preenchida corretamente	X		84/85
13	a fonte orçamentária está de acordo com a legislação em vigor	X		84/85
14	observou-se a retenção dos tributos (IRRF, ISSQN, INSS)	X		90
15	foi apresentada a regularidade perante o INSS e FGTS	X		28/29
16	o endereço e CNPJ das certidões é o mesmo da nota fiscal	X		8
17	Verificou-se GEFIP, bem como pagamento da GPS E GRF se o serviço envolve mão de obra?		X	-
18	Há saldo de empenho para quitação da despesa?	X		84/85
19	Há designação do gerente fiscal do contrato?	X		7
20	A nota está direcionada ao fundo competente?	X		8

ARECER CONCLUSIVO

Sr(a) Secretário(a),

Em análise da documentação acostada ao presente, não encontra esta coordenadoria de liquidação qualquer óbice para liquidação da despesa. Sugerindo desta forma a remessa à Coordenadoria do Tesouro para análise e emissão da ordem de pagamento.

Armação dos Búzios, 19 de junho de 2018

VICTOR AGUIAR DA SILVA
 Coordenador de Liquidação

De acordo, à Coordenadoria do Tesouro, autorizo o prosseguimento na liquidação da despesa e emissão da ordem de pagamento conforme informado acima.

PAULO ABRANCHES GUEDES JÚNIOR
 Secretário Municipal de Obras e Saneamento
 Ordenador da Despesa



PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

ESTRADA DA USINA 0600 - CENTRO

C.N.P.J 01.616.171/0001-02

Emissão: 21/06/2018

Hora: 12:31

Página: 1

ORDEN DE PAGAMENTO

Exercício: 2018

Processo....: 000/06445/18 de 30/05/2018

No.Ord.Pagamento: 181436

Autoriza o pagamento ao favorecido, na importância abaixo:

Valor Total.: R\$ 10.000,00

(DEZ MIL REAIS)

Credor.....: DAFLA CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E GERENCIAMENTO LTDA - Código: 9658

CPF/CNPJ: 12.603.970/0001-60

Endereço: ESTRADA FRANCISCO DA CRUZ NUNES NÚMERO 8180 SALA 210

Bairro: ITAIPU

U.F: RJ

CEP: 24340000

Especificação

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A RECUPERAÇÃO DA
ESTRADA DO MORRO DAS EMERÊNCIAS CONFORME CONVÊNIO SICONV 831101/2016
(CONTRAPARTIDA) REFERENTE AO PERÍODO DE 09/04 A 28/05/18 (1ª MEDIÇÃO)
CONFORME 201800000000004 À FL. 08.

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

No.Empenho.....: 000257

Órgão/Unid.Orç....: 02.0107 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO

Prog. Trabalho....: 15.451.0028.1.304 - RECUPERAÇÃO DA ESTRADA MORRO DAS EMERÊNCIAS.

Despesa.....: 4490.5100 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte.....: 004 - Roy. Prod.

Valor da Dotação.: 10.000,00

Valor Empenhado:	10.000,00	Valor Liquidado:	10.000,00	Valor a Liquidar:	0,00
------------------	-----------	------------------	-----------	-------------------	------

A Liquidação da despesa contraída pela nota de empenho acima citada foi realizada pela coordenadoria de liquidação através do laudo de conferência.

ARMAÇÃO DOS BÚZIOS, 21 de JUNHO de 2018.

ANA PAULA FIGUEIREDO NOGUEIRA
GERENTE DE ORDEM DE PAGAMENTO

Face a Liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou ao seu procurador conforme Artigo 64 da Lei 4.320/64.

PAULO ABRANCHES GUEDES JÚNIOR
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO



PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

ESTRADA DA USINA 0600 - CENTRO

C.N.P.J 01.616.171/0001-02

Emissão: 21/06/2018

Hora: 12:32

Página: 1

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2018

Processo....: 000/06445/18 de 30/05/2018

No.Ord.Pagamento: 181437

Autoriza o pagamento ao favorecido, na importância abaixo:

Valor Total: **R\$ 124.842,88**

(CENTO E VINTE E QUATRO MIL E OITOCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS)

Credor.....: **DAFLA CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E GERENCIAMENTO LTDA - Código: 9658**

CPF/CNPJ: 12.603.970/0001-60

Endereço: ESTRADA FRANCISCO DA CRUZ NUNES NÚMERO 8180 SALA 210

Bairro: ITAIPU

U.F: RJ

CEP: 24340000

Especificação

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A RECUPERAÇÃO DA
ESTRADA DO MORRO DAS EMERÊNCIAS CONFORME CONVÊNIO SICONV 831101/2016
REFERENTE AO PERÍODO DE 09/04 A 28/05/18 (1ª MEDIÇÃO) CONFORME
201800000000004 À FL. 08.

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

No.Empenho.....: 000258

Órgão/Unid.Orç....: 02.0107 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO

Prog. Trabalho....: 15.451.0028.1.304 - RECUPERAÇÃO DA ESTRADA MORRO DAS EMERÊNCIAS.

Despesa.....: 4490.5100 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte.....: 123 - CONVÊNIO

Valor da Dotação.: 124.842,88

Valor Empenhado: 1.000.000,00

Valor Liquidado:

124.842,88

Valor a Liquidar:

875.157,12

A Liquidação da despesa contraída pela nota de empenho acima citada foi realizada pela coordenação de liquidação através do laudo de conferência.

ARMAÇÃO DOS BÚZIOS, 21 de JUNHO de 2018.

ANA PAULA FIGUEIREDO NOGUEIRA
GERENTE DE ORDEM DE PAGAMENTO

Face a Liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou ao seu procurador conforme Artigo 64 da Lei 4.320/64.

PAULO ABRANCHES GUEDES JÚNIOR
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO

Coordenadoria do Tesouro, 21 de Junho de 2018.

À Secretaria Municipal de Obras e Saneamento,

Encaminhamos processo de pagamento para análise prévia e autorização do Ordenador de Despesa.

Atenciosamente,


Vladimir Sant'Ana de Farias
Coordenador do Tesouro

fechar X

Loading Image...

IT ANA DE FARIAS



Portal dos Convênios

Entrar no Sistema

Página Principal

Programas

Propostas

Execução

Inf. Gerenciais

Cadastros

Acomp. e Fiscalização

Prestação de Contas

Administração

Verificação de Regularidade

Principal Consultar Convênio Listar Movimentações Financeiras

Pagamento a Favorecido com OBTV

53000 - MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL

Convênio 831101/2016

Convênio Documento de Liquidação Detalhes do Pagamento Histórico Anexos

Dados Gerais

Número

4905621



Data

25/06/2018

Tipo

Transferência Bancária para Crédito em Conta-Corrente

Valor Original do Documento de Liquidação

R\$ 134.842,88

Valor Bruto do Documento de Liquidação

R\$ 134.842,88

Total de Tributos Retidos

R\$ 6.742,14

Valor Pago ao Favorecido

R\$ 128.100,74

Observação *

Pagamento 1ª medição

Rateio da Despesa por Fonte de Recursos

Valor Total Rateado

R\$ 134.842,88

Situação

Completa

Natureza de Despesa

Valor Apropriado (R\$)

44905199 - OBRAS E INSTALACOES - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES

134.842,88

Detalhar Fontes

Rateio dos Valores Pagos em Cada Meta/Etapa do Cronograma Físico

Meta Atendida	Etapas Atendida	Recurso do Repasse (R\$)	Recurso de Contrapartida (R\$)	Recurso de Rendimentos (R\$)
Recuperação da Estrada Morro da Emerências	Serviços Preliminares	100.000,00	0,00	0,00
Recuperação da Estrada Morro da Emerências	Drenagem	24.842,88	10.000,00	0,00

[Voltar](#)

Processo	6445118	Fls:	97
----------	---------	------	----

À Controladoria Geral,

Encaminhamos processo de pagamento para análise de prosseguimento.

Atenciosamente,


Vladimir Sant'Ana de Farias
Coordenador do Tesouro



PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BUZIOS
CONTROLADORIA -GERAL DO MUNICÍPIO

Processo: 6445/2018 -Fls.98

Armação dos Búzios, 29/06/2018

AO CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO:

Em atenção ao presente processo administrativo vimos tecer as seguintes considerações:
Trata-se de processo cujo pedido é a sua análise, por esta COGEM.

Neste sentido, no que tange ao procedimento de pagamento da despesa ora faturada, observa-se que foram atendidos os seguintes itens:

ITEM	DESCRIÇÃO	CUMPRIMENTO			FLS.
		SIM	NÃO	N. A.	
1	Foi realizado cálculo de retenção de impostos?	X			90
2	Foi Realizado exame para liquidação?	X			91
3	Os Documentos estão de acordo com o laudo de conferência de liquidação?	X			91
4	O Empenho está devidamente assinada pelo ordenador da despesa?	X			84/85
5	O Empenho está de acordo com o credor e o objeto?	X			84/85
6	A Ordem de Pagamento está devidamente assinada pelo ordenador da despesa?	X			92/95
7	O pagamento foi realizado através da conta bancária com recursos na mesma fonte de empenho?	X			95/96
8	O pagamento foi creditado devidamente na conta indicada pelo credor?	X			8

Observe-se que apesar de não haver indicação por parte do requerente de conta para o pagamento da verba pleiteada, o mesmo foi realizado em nome desta estando ao seu vinculado também ao seu CPF não restando assim, maior óbice quanto ao item 08.

Neste sentido, visto o atendimento dos itens acima, sugerimos o retorno dos autos à Secretaria de origem para prosseguimento do presente.

Atenciosamente,


Eduardo Vieira Tardelli
Supervisor II

De acordo, retornamos os autos à
Secretaria Municipal de Obras e Saneamento para prosseguimento.


Jeferson Teixeira Terra
Controlador Geral do Município



PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO

99

ATESTADO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

Ref.: OBJETO: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA CANTO DO CÉU E RUA MORRO DAS EMERÊNCIAS (PARTE)

PROCESSO Nº: 611/2017

Atestamos que os serviços de fornecimento constantes na **2ª medição** referente ao período de **25 de maio de 2018 a 24 de junho de 2018**, e a respectiva fatura, referentes ao contrato firmado entre o **Município de Armação dos Búzios** e a empresa **DAFLA CONSTRUÇÕES SERIÇOS E GERENCIAMENTO LTDA-EPP**, foram executados de acordo com as especificações contratuais entre as partes e dentro do padrão de qualidade aceito pela Administração.

Segue abaixo, relatório de prazos e valores contratuais:

Data de início contratual: **09/04/2018**

Prazo Inicial: **12 Meses**

TERMO DE OCORRÊNCIA

1. Tipo de ocorrência (*):

() Falta de funcionário

() Falta na execução dos serviços

() Falta de pontualidade

() Falta de material

(X) Outros

() Nada a registrar


(*) detalhar em relatório em anexo, se for o caso.

2. Valor a ser glosado na fatura mensal: _____ (se for o caso)


3. **Valor total a pagar referente aos serviços prestados nos meses de maio a junho de 2018, referente à 2ª medição: R\$ 192.212,70 (Cento e noventa e dois mil, duzentos e doze reais e setenta centavos).**

Recebimento efetuado em 02 (duas) vias, sendo uma para o processo e outra para a empresa contratada.

Armação dos Búzios, 17 de julho de 2018


João Pedro Souza
Engenheiro Civil

João Pedro Souza
Gerente de Saneamento
Mat.: 13800

		PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e															
Número da Nota 201800000000008		Data e Hora de Emissão 17/07/2018 14:45:36		Competência 07/2018													
Exigibilidade Exigível em Armação dos Búzios/RJ		Localidade da Prestação Armação dos Búzios/RJ		Código de Verificação AXEA-VQRH													
PRESTADOR DE SERVIÇOS																	
CPF/CNPJ: 12.603.970/0001-60 Inscrição Municipal: 01531680 Nome/Razão Social: DAFLA CONSTRUCAO, SERVICOS E GERENCIAMEN Endereço: ES FRANCISCO DA CRUZ NUNES 8180, 0210 - ITAIPU - CEP: 24340-000 Município: Niterói UF: RJ																	
TOMADOR DE SERVIÇOS																	
Nome/Razão Social: PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS CPF/CNPJ: 01.616.171/0001-02 Inscrição Municipal: --- Endereço: ES da Usina Velha 600 - Centro - CEP: 28950-000 Município: Armação dos Búzios UF: RJ E-mail: ---																	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS																	
Objeto: Serviços de Recuperação da Estrada Morro das Emerências																	
Nota Fiscal refere-se ao pagamento da 2ª Medicação.																	
Contrato: 831181/2016 Ministério da Integração Nacional																	
Valor da Nota Fiscal: R\$192.212,70 40% mão de obra: R\$76.885,08 60% material: R\$115.327,62																	
Dados Bancários: Caixa Econômica Federal Agência: 3022 Operação: 003 Conta: 624-9																	
<table border="1"> <tr> <td>Retenção COFINS</td> <td>Retenção CSLL</td> <td>Retenção INSS</td> <td>Retenção IR</td> <td>Retenção PIS</td> <td>Outras Retenções</td> </tr> <tr> <td>R\$ 5.766,38</td> <td>R\$ 1.922,12</td> <td>R\$ 10.571,69</td> <td>R\$ 2.883,19</td> <td>R\$ 1.249,38</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> </table>						Retenção COFINS	Retenção CSLL	Retenção INSS	Retenção IR	Retenção PIS	Outras Retenções	R\$ 5.766,38	R\$ 1.922,12	R\$ 10.571,69	R\$ 2.883,19	R\$ 1.249,38	R\$ 0,00
Retenção COFINS	Retenção CSLL	Retenção INSS	Retenção IR	Retenção PIS	Outras Retenções												
R\$ 5.766,38	R\$ 1.922,12	R\$ 10.571,69	R\$ 2.883,19	R\$ 1.249,38	R\$ 0,00												
CNAE: 4213800 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas Subitem: 07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrico...																	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 192.212,70																	
Valor Total das Deduções (R\$) 115.327,62		Base de Cálculo (R\$) 76.885,08		Alíquota (%) 5,00%													
		Valor do ISS (R\$) 3.844,25		Crédito p/ Abatimento do IPTU 0,00													
OUTRAS INFORMAÇÕES																	
- A legislação tributária de Niterói pode ser consultada em www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao - O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço. (Competência JUL / 2018) - Esta NFS-e não gera crédito. Serviço prestado em outro município. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 186.975,89 - Departamento de Lançamento e Fiscalização - Rua da Conceição, 100 - Centro - 24020-082 - Niterói - RJ. - PROCON: Rua Visc. de Sepetiba 519, Térreo, Centro, Niterói, Tel. 151. CODECON: Rua da Alfândega 88, Térreo, Centro, RJ, Tel. 0800 282-7080.																	

AUTENTICADA

Victor



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Contrato: 831101/2016

Pavimentação e Drenagem da Rua Canto do Céu e Rua Morro das Emerências (Parte)

Bairro: José Gonçalves

Sinapi Julho/2017

Não Desonerada

BDI = 20,97%

Contratada: Dafra Construção Serviços e Gerenciamento LTDA-EPP
Período: 25/05/2018 a 24/06/2018
Engenheiro Fiscal: João Pedro Souza

CONTRATO																
ITEM	FORTE	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL	Quant. Medida	Valor Medido	% Medida	Quant. Acumulada	Valor Acumulado	% Acumulada	Quant. Saldo	Valor Saldo	% Saldo
1.1 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL																
1.1.1	COMP	COMP 21	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	%	100,00	703,16	70.316,00	13,28	9.337,96	13,28%	22,59	15.884,38	22,59%	77,41	54.431,62	77,41%
1.2 CANTIEIRO DE OBRAS E SERVIÇOS PRELIMINARES																
1.2.1	SINAPI	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00	529,63	3.177,78	-	-	0,00%	6,00	3.177,78	100,00%	-	-	0,00%
1.2.2	SINAPI	74220/001	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM4, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	M2	147,40	79,58	11.730,09	-	-	0,00%	147,40	11.730,09	100,00%	-	-	0,00%
1.2.3	SINAPI	93208	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTIEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF 02/2016	M2	17,50	604,68	10.581,90	-	-	0,00%	17,50	10.581,90	100,00%	-	-	0,00%
1.2.4	SINAPI	93212	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTIEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF 02/2016	M2	12,50	801,28	10.016,00	-	-	0,00%	12,50	10.016,00	100,00%	-	-	0,00%
1.2.5	SINAPI	93207	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTIEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF 02/2016	M2	18,00	806,83	14.522,94	-	-	0,00%	18,00	14.522,94	100,00%	-	-	0,00%
1.2.6	SINAPI	41598	ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AEREA TRIFÁSICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN	1,00	1.862,32	1.862,32	-	-	0,00%	1,00	1.862,32	100,00%	-	-	0,00%
1.2.7	SINAPI	74022/013	ENSAIO DE COMPACTAÇÃO - AMOSTRAS TRABALHADAS - SOLOS	UN	5,00	211,43	1.057,15	-	-	0,00%	-	-	0,00%	5,00	1.057,15	100,00%
1.2.8	SINAPI	73900/012	ENSAIOS DE CONCRETO ASFÁLTICO	T	12,53	66,34	831,24	-	-	0,00%	-	-	0,00%	12,53	831,24	100,00%
1.2.9	SINAPI	74022/030	ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSÃO SIMPLES - CONCRETO	UN	24,00	190,28	4.566,72	-	-	0,00%	-	-	0,00%	24,00	4.566,72	100,00%
1.3 - MOVIMENTO DE TERRA, CARGA, TRANSPORTE E DRENAGEM																
								631.314,60								
								248.280,17								
								27,89%								
								39,59%								
								60,37%								
1.3.1	SINAPI	90108	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 01/2015	M3	1.862,43	13,25	24.677,20	536,86	7.113,40	28,83%	661,87	8.769,78	35,54%	1.200,56	15.907,42	64,46%

João Pedro Souza
Gerente de Sanamento
Mat.: 13300



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Contrato: 831101/2016

Pavimentação e Drenagem da Rua Canto do Céu e Rua Morro das Emerências (Parte)

Bairro: José Gonçalves

Sinapi Julho/2017

Não Desonerada

BDI = 20,97%

Contratada: Daffa Construção Serviços e Gerenciamento LTDA-EPP

Período: 25/05/2018 a 24/06/2018

Engenheiro Fiscal: João Pedro Souza

CONTRATO																
ITEM	FONTE	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO (C/ BDI)	PREÇO TOTAL	2ª MEDIÇÃO			ACUMULADO			SALDO		
								Quant. Medida	Valor Medido	% Medida	Quant. Acumulada	Valor Acumulado	% Acumulada	Quant. Saldo	Valor Saldo	% Saldo
1.3.2	SINAPI	90108	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	2.351,92	11,91	28.011,37	476,29	5.672,61	20,25%	950,10	11.315,69	40,40%	1.401,82	16.695,68	59,60%
1.3.3	SINAPI	93379	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 m³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	1.480,82	18,07	26.758,42	516,89	9.340,20	34,91%	613,52	11.086,30	41,43%	867,30	15.672,12	58,57%
1.3.4	SINAPI	93381	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 m³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	1.329,69	8,98	16.430,62	280,15	2.336,15	14,22%	637,71	5.726,64	34,85%	1.191,98	10.703,98	65,15%
1.3.5	SINAPI	72844	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)	T	744,13	0,81	602,75	460,41	372,93	61,87%	703,43	569,78	94,53%	40,70	32,97	5,47%
1.3.6	SINAPI	72887	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	M3XKM	2.480,46	1,17	2.902,14	1.534,71	1.795,61	61,87%	2.344,80	2.743,42	94,53%	135,66	158,72	5,47%
1.3.7	SINAPI	73817/001	EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - PO DE PEDRA	M3	204,86	112,30	23.005,78	63,10	7.086,13	30,80%	97,43	10.941,39	47,56%	107,43	12.064,39	52,44%
1.3.8	SINAPI	95566	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	87,00	111,38	9.690,06	6,00	668,28	6,90%	6,00	668,28	6,90%	81,00	9.021,78	93,10%
1.3.9	SINAPI	92220	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	716,01	163,97	117.404,15	244,00	40.008,68	34,08%	364,00	59.685,08	50,84%	352,01	57.719,07	49,16%

João Pedro Souza
Engenheiro de Saneamento
Mat.: 13500



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Contrato: 831101/2016

Pavimentação e Drenagem da Rua Canto do Céu e Rua Morro das Emergências (Parte)

Bairro: José Gonçalves

Sinapi Julho/2017

Não Desonerada

BDI = 20,97%

Contratada: Dafia Construção Serviços e Gerenciamento LTDA-EPP

Período: 25/05/2018 a 24/06/2018

Engenheiro Fiscal: João Pedro Souza

CONTRATO																
CONTRATO				2ª MEDIÇÃO				ACUMULADO				SALDO				
ITEM	FONTE	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL	Quant. Medida	Valor Medido	% Medida	Quant. Acumulada	Valor Acumulado	% Acumulada	Quant. Saldo	Valor Saldo	% Saldo
1.3.10	SINAPI	92221	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 12/2015	M	204,79	205,76	42.137,59	168,00	34.567,68	82,04%	200,00	41.152,00	97,66%	4,79	985,59	2,34%
1.3.11	SINAPI	92223	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 12/2015	M	404,46	302,09	122.183,32	59,00	17.823,31	14,59%	117,00	35.344,53	28,93%	287,46	86.838,79	71,07%
1.3.12	COMP	COMP 01	POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO (15 x 20 x 40cm) COM PAREDES DE 15CM, PARA REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS COM DIMENSÕES INTERNAS DE 1,20M X 1,20M X 1,50M	UN	1,00	1.882,14	1.882,14	-	-	0,00%	1,00	1.882,14	100,00%	-	-	0,00%
1.3.13	COMP	COMP 02	POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO (15 x 20 x 40cm) COM PAREDES DE 15CM, PARA REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS COM DIMENSÕES INTERNAS DE 1,20M X 1,20M X 2,00M	UN	3,00	2.318,96	6.956,88	-	-	0,00%	1,00	2.318,96	33,33%	2,00	4.637,92	66,67%
1.3.14	COMP	COMP 03	POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO (15 x 20 x 40cm) COM PAREDES DE 15CM, PARA REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS COM DIMENSÕES INTERNAS DE 1,50M X 1,50M X 1,90M	UN	1,00	2.675,53	2.675,53	-	-	0,00%	-	-	0,00%	1,00	2.675,53	100,00%
1.3.15	COMP	COMP 04	POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO (15 x 20 x 40cm) COM PAREDES DE 15CM, PARA REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS COM DIMENSÕES INTERNAS DE 2,00M X 2,00M X 1,20M	UN	1,00	2.691,29	2.691,29	-	-	0,00%	-	-	0,00%	1,00	2.691,29	100,00%
1.3.16	COMP	COMP 05	POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO (15 x 20 x 40cm) COM PAREDES DE 15CM, PARA REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS COM DIMENSÕES INTERNAS DE 2,00M X 2,00M X 2,09M	UN	1,00	3.268,48	3.268,48	1,00	3.268,48	100,00%	1,00	3.268,48	100,00%	-	-	0,00%
1.3.17	COMP	COMP 06	POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO (15 x 20 x 40cm) COM PAREDES DE 15CM, PARA REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS COM DIMENSÕES INTERNAS DE 1,20M X 1,20M X 2,14M	UN	1,00	2.379,77	2.379,77	-	-	0,00%	-	-	0,00%	1,00	2.379,77	100,00%
1.3.18	COMP	COMP 07	POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO (15 x 20 x 40cm) COM PAREDES DE 15CM, PARA REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS COM DIMENSÕES INTERNAS DE 2,00M X 2,00M X 1,87M	UN	1,00	3.128,77	3.128,77	-	-	0,00%	-	-	0,00%	1,00	3.128,77	100,00%
1.3.19	COMP	COMP 08	POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO (15 x 20 x 40cm) COM PAREDES DE 15CM, PARA REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS COM DIMENSÕES INTERNAS DE 2,00M X 2,00M X 1,60M	UN	3,00	2.952,56	8.857,68	-	-	0,00%	-	-	0,00%	3,00	8.857,68	100,00%

João Pedro Souza
Engenheiro do Saneamento
Mat.: 13580

[Handwritten signature]



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Contrato: 831101/2016

Pavimentação e Drenagem da Rua Canto do Céu e Rua Morro das Emerências (Parte)

Bairro: José Gonçalves

Sinapi Julho/2017

Não Desonerada

BDI = 20,97%

Contratada: Dafia Construção Serviços e Gerenciamento LTDA-EPP

Período: 25/05/2018 a 24/06/2018

Engenheiro Fiscal: João Pedro Souza

CONTRATO																
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				2ª MEDIÇÃO				ACUMULADO				SALDO				
ITEM	FORNE	CÓDIGO		UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL	Quant. Medida	Valor Medido	% Medida	Quant. Acumulada	Valor Acumulado	% Acumulada	Quant. Saldo	Valor Saldo	% Saldo
1.3.20	COMP	COMP 09	POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO (15 x 20 x 40cm) COM PAREDES DE 15CM, PARA REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS COM DIMENSÕES INTERNAS DE 2,00M X 2,00M X 1,50M	UN	4,00	2.885,74	11.542,96	-	-	0,00%	3,00	8.657,22	75,00%	1,00	2.885,74	25,00%
1.3.21	COMP	COMP 10	POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO (15 x 20 x 40cm) COM PAREDES DE 15CM, PARA REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS COM DIMENSÕES INTERNAS DE 1,20M X 1,20M X 1,20M	UN	10,00	2.003,01	20.030,10	6,00	12.018,06	60,00%	6,00	12.018,06	60,00%	4,00	8.012,04	40,00%
1.3.22	COMP	COMP 11	POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO (15 x 20 x 40cm) COM PAREDES DE 15CM, PARA REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS COM DIMENSÕES INTERNAS DE 1,50M X 1,50M X 2,50M	UN	1,00	2.973,22	2.973,22	-	-	0,00%	-	-	0,00%	1,00	2.973,22	100,00%
1.3.23	COMP	COMP 12	POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO (15 x 20 x 40cm) COM PAREDES DE 15CM, PARA REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS COM DIMENSÕES INTERNAS DE 1,50M X 1,50M X 1,20M	UN	13,00	2.329,20	30.279,60	1,00	2.329,20	7,69%	2,00	4.658,40	15,38%	11,00	25.621,20	84,62%
1.3.24	COMP	COMP 13	POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO (15 x 20 x 40cm) COM PAREDES DE 15CM, PARA REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS COM DIMENSÕES INTERNAS DE 1,50M X 1,50M X 1,30M	UN	1,00	2.383,86	2.383,86	-	-	0,00%	-	-	0,00%	1,00	2.383,86	100,00%
1.3.25	COMP	COMP 14	POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO (15 x 20 x 40cm) COM PAREDES DE 15CM, PARA REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS COM DIMENSÕES INTERNAS DE 1,50M X 1,50M X 2,00M	UN	1,00	2.724,11	2.724,11	-	-	0,00%	-	-	0,00%	1,00	2.724,11	100,00%
1.3.26	COMP	COMP 15	POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO (15 x 20 x 40cm) COM PAREDES DE 15CM, PARA REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS COM DIMENSÕES INTERNAS DE 1,20M X 1,20M X 1,30M	UN	1,00	2.039,50	2.039,50	-	-	0,00%	-	-	0,00%	1,00	2.039,50	100,00%
1.3.27	SINAPI	83627	TAMPAO FORO ARTICULADO, GLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P = CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	43,00	619,17	26.624,31	2,00	1.238,34	4,65%	2,00	1.238,34	4,65%	41,00	25.385,97	95,35%
1.3.28	COMP	COMP 16	CAIXA DE RALO EM CONCRETO PRE-MOLDADO, COM PAREDE DE 0,06M, NAS DIMENSÕES INTERNAS DE (0,30X0,90X0,90)M, PARA ÁGUAS PLUVIAIS, COM BASE EM CONCRETO SIMPLES (FCk=11 MPa), PREENCHIMENTO DA PERIFERIA DA GRELHA EM CONCRETO SIMPLES (FCk=15 MPa), REJUNTE DA BOLSA DO TUBO E DO PESCOÇO DA CAIXA PRE-MOLDADA EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:4, EM VOLUME, GRELHA DE FERRO FUNDIDO DE 135KG, EXCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO.(DESONERADO)	UN	86,00	820,63	70.574,18	4,00	3.282,52	4,65%	4,00	3.282,52	4,65%	82,00	67.291,66	95,35%

João Pedro Souza

Engenheiro de Sanitamento
Matr.: 135800

[Assinatura]



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Contrato: 831101/2016

Pavimentação e Drenagem da Rua Canto do Céu e Rua Morro das Emerências (Parte)

Bairro: José Gonçalves

Sinapi Julho/2017

Não Desonerada

BDI = 20,97%

Contratada: Dafia Construção Serviços e Gerenciamento LTDA-EPP

Período: 25/05/2018 a 24/06/2018

Engenheiro Fiscal: João Pedro Souza

CONTRATO																
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				2ª MEDIÇÃO				ACUMULADO				SALDO				
ITEM	FONTE	CÓDIGO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL	Quant. Medida	Valor Medido	% Medida	Quant. Acumulada	Valor Acumulado	% Acumulada	Quant. Saldo	Valor Saldo	% Saldo	
1.3.29	COMP	COMP 17	UN	4,00	3.482,46	13.929,84	4,00	13.929,84	100,00%	4,00	13.929,84	100,00%	-	-	0,00%	
1.3.30	SINAPI	85366	M2	285,00	31,35	8.934,75	140,00	4.389,00	49,12%	140,00	4.389,00	49,12%	145,00	4.545,75	50,88%	
1.3.31	COMP	COMP 20	M2	312,00	50,11	15.634,32	312,00	15.634,32	100,00%	312,00	15.634,32	100,00%	-	-	0,00%	
1.4 - PAVIMENTAÇÃO						573.662,91		0,00	0,00%		0,00	0,00%		573.662,91	100,00%	
1.4.1	SINAPI	74154/001	M3	1.253,31	5,06	6.341,75	-	-	0,00%	-	-	0,00%	1.253,31	6.341,75	100,00%	
1.4.2	SINAPI	72844	T	2.443,95	0,81	1.979,60	-	-	0,00%	-	-	0,00%	2.443,95	1.979,60	100,00%	
1.4.3	SINAPI	72887	M3XKM	8.146,51	1,17	9.531,42	-	-	0,00%	-	-	0,00%	8.146,51	9.531,42	100,00%	
1.4.4	SINAPI	72961	M2	6.266,58	1,49	9.337,20	-	-	0,00%	-	-	0,00%	6.266,58	9.337,20	100,00%	
1.4.5	SINAPI	73817/001	M3	626,65	112,30	70.372,80	-	-	0,00%	-	-	0,00%	626,65	70.372,80	100,00%	
1.4.6	SINAPI	73711	M3	626,65	114,76	71.914,35	-	-	0,00%	-	-	0,00%	626,65	71.914,35	100,00%	
1.4.7	SINAPI	94273	M	2.396,36	43,20	103.522,75	-	-	0,00%	-	-	0,00%	2.396,36	103.522,75	100,00%	
1.4.8	SINAPI	94274	M	180,50	48,06	8.674,83	-	-	0,00%	-	-	0,00%	180,50	8.674,83	100,00%	
1.4.9	SINAPI	72945	M2	6.266,58	5,05	31.646,23	-	-	0,00%	-	-	0,00%	6.266,58	31.646,23	100,00%	

João Pedro Souza
Gerente de Saneamento
Rafael-13580



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Contrato: 831101/2016

Pavimentação e Drenagem da Rua Canto do Céu e Rua Morro das Emerências (Parte)

Barrio: José Gonçalves

Sinapi Julho/2017

Não Desonerada

BDI = 20,97%

Contratada: Dafa Construção Serviços e Gerenciamento LTDA-EPP

Período: 25/05/2018 a 24/06/2018

Engenheiro Fiscal: João Pedro Souza

CONTRATO												
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL	Quant. Medida	2ª MEDIÇÃO	Quant. Acumulada	Valor Acumulado	% Acumulada
1.4.10	SINAPI	95893	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESURA DE 4,0 CM EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF 03/2017	M3	250,66	1.034,82	259.387,98	-	0,00%	-	-	0,00%
1.4.11	SINAPI	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF 06/2016	M	20,00	47,70	954,00	-	0,00%	-	-	0,00%
1.5 - CALÇADA							55.000,43	0,00	0,00%		55.000,43	100,00%
1.5.1	SINAPI	85422	PREPARO MANUAL DE TERRENO S/ RASPAGEM SUPERFICIAL	M2	1.198,18	9,64	11.550,46	-	0,00%	-	-	0,00%
1.5.2	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2016	M3	95,85	568,91	54.530,02	-	0,00%	-	-	0,00%
1.6 - SINALIZAÇÃO VIÁRIA							26.123,89	0,00	0,00%		26.123,89	100,00%
1.6.1	SINAPI	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	352,22	26,02	9.164,76	-	0,00%	-	-	0,00%
1.6.2	COMP	COMP 18	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA - FORNECIMENTO E FIXAÇÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, EXCLUSIVE O TUBO	M2	8,04	846,24	7.607,77	-	0,00%	-	-	0,00%
1.6.3	COMP	COMP 19	TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, COM DIÂMETRO DE 2", DIN-2440. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	155,00	60,37	9.357,35	-	0,00%	-	-	0,00%
TOTAL						1.447.836,10		192.212,10	13,28%		327.055,58	22,59%
VALOR DO CONTRATO											R\$ 1.447.850,10	
VALOR DA 2ª MEDIÇÃO											R\$ 192.212,70	
VALOR ACUMULADO											R\$ 327.055,58	
SALDO DO CONTRATO											R\$ 1.120.794,52	
PERCENTUAL REALIZADO DO CONTRATO												22,59%

João Pedro Souza
Engenheiro Fiscal
Inal-13500

[Assinatura]

MEMÓRIA DE CÁLCULO - 3ª MEDIÇÃO

Pavimentação e Drenagem da Rua Cantô do Céu e Rua Morro das Emerências (Parte)
Bairro José Gonçalves

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.1.1 COMP 21 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

13,28 %

COD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PR. UNITÁRIO	PR. TOTAL
2707	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO	H	2,80	R\$ 105,12	R\$ 294,34
4069	MAESTRE DE OBRAS	H	5,60	R\$ 53,85	R\$ 301,56
				TOTAL UNITÁRIO	R\$ 595,90

CANTEIRO DE OBRAS E SERVIÇOS PRELIMINARES

1.2.1	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO							0,00	M2
1.2.2	74220/1	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X							0,00	M2
		67,00m x 2,20m =		0,00m²						
1.2.3	93208	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016							0,00	M2
		1 unidade x 5,00m x 3,50m =		0,00m²						
1.2.4	93212	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016							0,00	M2
		1 unidade x 2,50m x 5,00m =		0,00m²						
1.2.5	93207	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016							0,00	M2
		1 unidade x 6,00m x 3,00m =		0,00m²						
1.2.6	41598	ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA TRIFÁSICA 40A EM POSTE MADEIRA							0,00	UN
1.2.7	74022/13	ENSAIO DE COMPACTAÇÃO - AMOSTRAS TRABALHADAS - SOLOS							0,00	UN

Segundo o método DNER-ME 049 deve ser coletada uma amostra para cada 300m de pista, porém para áreas menores que 4.000m² o número mínimo de amostras é de 5.



João Pedro Soares
Secretário de Sanamento
Inat. 13/08/2016



MEMÓRIA DE CÁLCULO - 2ª MEDIÇÃO
Pavimentação e Drenagem da Rua Canto do Céu e Rua Morro das Emerências (Parte)
Bairro José Gonçalves

1.2.8 73900/12 ENSAIOS DE CONCRETO ASFALTICO
Massa de CBUQ 0,00 T x Taxa de ensaio 5,00% = Total 0,00 T
0,00 T

1.2.9 74022/30 ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO
Volume do Caminhão 8,00 m³
Amostras por caminhão 2 unidades
Volume de Concreto das calçadas 0,00 m³
2 amostras/caminhão x 0 caminhões = 0 amostras
1ª Amostra - 21 dias 2ª Amostra - 28 dias

MOVIMENTO DE TERRA, CARGA, TRANSPORTE E DRENAGEM

1.3.1 90106 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015
536,86 M3

Anexo Memória de Cálculo das Escavações, Reaterros, Embasamento
= 536,86 m³

1.3.2 90108 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015
476,29 M3

Anexo Memória de Cálculo das Escavações, Reaterros, Embasamento
= 476,29 m³

1.3.3 90379 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016
516,89 M3

Anexo Memória de Cálculo das Escavações, Reaterros, Embasamento
= 516,89 m³

1.3.4 90381 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016
260,15 M3

Anexo Memória de Cálculo das Escavações, Reaterros, Embasamento
= 260,15 m³

1.3.5 72844 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)
460,41 T

Terra	Volume a Carregar	Empolamento (%)	Densidade	Total
	236,11 m³ x	1,30 m³/m³ x	1,50 T/m³ =	460,41 T

1.3.6 72887 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA

Carga	Distância Média	Total
236,11 m³ x	6,50 km =	1.534,71 m³ x km

João Pedro Souto
Secretário de Planejamento
Matr. 115500

1.534,71 M3XKM



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

MEMÓRIA DE CÁLCULO - 1ª MEDIÇÃO

Pavimentação e Drenagem da Rua Canlo do Céu e Rua Morro das Emerências (Parte)

Bairro José Gonçalves

1.3.7	738171	EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - PO DE PEDRA.			63,10 M3
		Anexo Memória de Cálculo das Escavações, Reaterros, Embasamento	=	63,10 m³	
1.3.8	95566	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015			6,00 M
		Anexo Memória de Cálculo das Escavações, Reaterros, Embasamento	=	6,00 m³	
1.3.9	92220	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015			244,00 M
		Anexo Memória de Cálculo das Escavações, Reaterros, Embasamento	=	244,00 m³	
1.3.10	92221	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015			168,00 M
		Anexo Memória de Cálculo das Escavações, Reaterros, Embasamento	=	168,00 m³	
1.3.11	92223	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015			59,00 M
		Anexo Memória de Cálculo das Escavações, Reaterros, Embasamento	=	59,00 m³	
1.3.12	COMP 01	POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO (15x20x40cm) COM PAREDES DE 15CM, PARA REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS COM DIMENSÕES INTERNAS DE 1,20M X 1,20M X 1,50M			0,00 UN
1.3.13	COMP 02	POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO (15x20x40cm) COM PAREDES DE 15CM, PARA REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS COM DIMENSÕES INTERNAS DE 1,20M X 1,20M X 2,00M			0,00 UN
1.3.14	COMP 03	POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO (15x20x40cm) COM PAREDES DE 15CM, PARA REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS COM DIMENSÕES INTERNAS DE 1,50M X 1,50M X 1,90M			0,00 UN
1.3.15	COMP 04	POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO (15x20x40cm) COM PAREDES DE 15CM, PARA REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS COM DIMENSÕES INTERNAS DE 2,00M X 2,00M X 1,20M			0,00 UN
1.3.16	COMP 05	POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO (15x20x40cm) COM PAREDES DE 15CM, PARA REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS COM DIMENSÕES INTERNAS DE 2,00M X 2,00M X 2,08M			1,00 UN
	PV 8				
1.3.17	COMP 06	POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO (15x20x40cm) COM PAREDES DE 15CM, PARA REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS COM DIMENSÕES INTERNAS DE 1,20M X 1,20M X 2,14M			0,00 UN

João Pedro Sacramento
Gerente de Engenharia
18.01.2016



MEMÓRIA DE CÁLCULO - 1ª MEDIÇÃO

Pavimentação e Drenagem da Rua Canto do Céu e Rua Morro das Emerências (Parte)
Bairro José Gonçalves

1.3.18	COMP 07	POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO (15 x 20 x 40cm) COM PAREDES DE 15CM, PARA REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS COM DIMENSÕES INTERNAS DE 2,00M X 2,00M X 1,87M	0,00	UN
1.3.19	COMP 08	POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO (15 x 20 x 40cm) COM PAREDES DE 15CM, PARA REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS COM DIMENSÕES INTERNAS DE 2,00M X 2,00M X 1,60M	0,00	UN
1.3.20	COMP 09	POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO (15 x 20 x 40cm) COM PAREDES DE 15CM, PARA REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS COM DIMENSÕES INTERNAS DE 2,00M X 2,00M X 1,50M	0,00	UN
1.3.21	COMP 10	POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO (15 x 20 x 40cm) COM PAREDES DE 15CM, PARA REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS COM DIMENSÕES INTERNAS DE 1,20M X 1,20M X 1,20M	6,00	UN
		PV 9		
		PV 39		
		PV 40		
		PV 41		
		PV 42		
		PV 43		
1.3.22	COMP 11	POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO (15 x 20 x 40cm) COM PAREDES DE 15CM, PARA REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS COM DIMENSÕES INTERNAS DE 1,50M X 1,50M X 2,50M	0,00	UN
1.3.23	COMP 12	POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO (15 x 20 x 40cm) COM PAREDES DE 15CM, PARA REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS COM DIMENSÕES INTERNAS DE 1,50M X 1,50M X 1,20M	1,00	UN
		PV 4		
		PV 5		
		PV 6		
		PV 7		
		PV 8		
1.3.24	COMP 13	POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO (15 x 20 x 40cm) COM PAREDES DE 15CM, PARA REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS COM DIMENSÕES INTERNAS DE 1,50M X 1,50M X 1,30M	0,00	UN
1.3.25	COMP 14	POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO (15 x 20 x 40cm) COM PAREDES DE 15CM, PARA REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS COM DIMENSÕES INTERNAS DE 1,50M X 1,50M X 2,00M	0,00	UN
1.3.26	COMP 15	POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO (15 x 20 x 40cm) COM PAREDES DE 15CM, PARA REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS COM DIMENSÕES INTERNAS DE 1,20M X 1,20M X 1,30M	0,00	UN
1.3.27	83627	TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P = CHAMINE CX AREA / POCO VISITA ASSENTADO COM ARG CIM/AREA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	2,00	UN

João Pedro Borja
Gerente do Departamento
14.11.2008



MEMÓRIA DE CÁLCULO - 2ª MEDIÇÃO

Pavimentação e Drenagem da Rua Canto do Céu e Rua Morro das Emergências (Parte)
Bairro José Gonçalves

1.3.28	COMP 16	CAIXA DE RALO EM CONCRETO PRE-MOLDADO, COM PAREDE DE 0,06M, NAS DIMENSÕES INTERNAS DE (0,30X0,90X0,90)M, PARA ÁGUAS PLUVIAIS, COM BASE EM CONCRETO SIMPLES (FCK=11 MPa), PREENCHIMENTO DA PERIFERIA DA GRELHA EM CONCRETO SIMPLES (FCK=15 MPa), REJUNTE DA BOLSA DO TUBO E DO PESCOÇO DA CAIXA PRE-MOLDADA EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:4, EM VOLUME, GRELHA DE FERRO FUNDIDO DE 135KG, EXCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO (DESONERADO)	4,00	UN
1.3.29	COMP 17	CAIXA DE AREIA PARA RETENÇÃO DE RESÍDUOS EXECUADA EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL (14 X 19 X 29 CM) COM DIMENSÕES DE 6,00M X 1,00M X 1,20M E TAMPA ESTRUTURADA COM PERFS METÁLICOS	4,00	UN
1.3.30	85366	DEMOLICAO MANUAL DE PAVIMENTACAO EM CONCRETO ASFALTICO, ESPESSURA SCM	140,00	M2
1.3.31	COMP 20	ARRANCAMENTO E REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍEDOS COM LIMPEZA DE BETUME, ADERENTE SOBRE COLCHAO DE PO-DE-PEDRA, INCLUINDO FORNECIMENTO DO PO-DE-PEDRA, EXCLUSIVE REJUNTAMENTO E FORNECIMENTO DOS PARALELEPÍEDOS (DESONERADO)	312,00	M2

PAVIMENTAÇÃO

1.4.1	74154/1	ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M3, DMT 50 A 200M			M3
		6.266,58m³	x	0,20m =	1.253,31m³
1.4.2	72844	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)			0,00 T
		Volume a Carregar	Empacotamento (30%)	Densidade	Total
		0,00 m³ x	1,30 x	1,50 T/m³ =	0,00 T
1.4.3	72887	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA			0,00 M3XKM
		Carga	Distancia Média	Total	
		0,00 m³ x	6,50 km =	0,00 m³ x Km	
1.4.4	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA			0,00 M2
1.4.5	73817/1	EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR – PO DE PEDRA			0,00 M3
		0,00m²	x	0,10m =	0,00m³
1.4.6	73711	BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA CORRIDA, INCLUSIVE COMPACTACAO			0,00 M3
		0,00m²	x	0,10m =	0,00m³
1.4.7	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_06/2016			0,00 M
		2.396,36m²			

João Paulo Souza
Gerente de Planejamento

[Assinatura]



MEMÓRIA DE CÁLCULO - 1ª MEDIÇÃO
Pavimentação e Drenagem da Rua Canto do Céu e Rua Morro das Emerências (Parte)
Bairro José Gonçalves

1.4.8	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-RIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X130 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	180,50m²						0,00	M
1.4.9	72945	IMPRIMAÇÃO DE BASE DE PAVIMENTAÇÃO COM ADP CM-30							0,00	M2
1.4.10	95993	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESURA DE 4,0 CM EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	0,00m²	x	0,04m	=	0,00 m³		0,00	M3
1.4.11	94281	EXECUÇÃO DE SARJEIA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016							0,00	M
CAIÇADAS E GRAMADOS										
1.5.1	85422	PREPARO MANUAL DE TERRENO S/ RASPAGEM SUPERFICIAL	1.198,18m²						0,00	M2
1.5.2	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CAIÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL NÃO ARMADO. AF_07/2016	1.198,18m²	x	0,08m	=	95,85m³		0,00	M3
SINALIZAÇÃO VIÁRIA										
1.6.1	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO							0,00	M2
			Extensão		Largura média		Quantidade		Área	
			Rua Morro das Emerências Contínua	515,68 m	x	0,10 m	x	2,00 =	103,13m²	
			Rua Morro das Emerências Seccionada 1:3	515,68 m	x	0,10 m	x	1,00 =	13,75m²	
			Rua Canto do Céu Contínua	682,50 m	x	0,10 m	x	2,00 =	136,50m²	
			Rua Canto do Céu Seccionada	682,50 m	x	0,10 m	x	1,00 =	18,20m²	
			Área					Quantidade		
			Travessias - Rua Morro das Emerências	13,44m²		x		2,00 =	26,88m²	
			Travessias - Rua Canto do Céu	13,44m²		x		4,00 =	53,76m²	
1.6.2	COMP 18	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA - FORNECIMENTO E FIXAÇÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, EXCLUSIVE O TUBO							0,00	M2

Placa	Quant.	Dimensões	Área	Área total
-------	--------	-----------	------	------------

João Pedro Soares
Secretaria de Planejamento
Urbanístico



MEMÓRIA DE CÁLCULO - 1ª MEDIÇÃO

Pavimentação e Drenagem da Rua Canto do Céu e Rua Morro das Emerências (Parte)


Bairro José Gonçalves

	R-19 Velocidade máxima permitida	15 unidades	D= 40cm	0,12	1,8
	R-6a Proibido Estacionar	16 unidades	D= 40cm	0,12	1,92
	R-28 Sentido Duplo de Circulação	9 unidades	D= 40cm	0,12	1,08
	R-33 - Sentido circular na Rotatória	2 unidades	D= 40cm	0,12	0,24
	Placa de logradouro	16 unidades	50cm x 25cm	0,125	2
	Travessia de Pedestres	2 unidades	50cm x 50cm	0,25	0,5
	Rua sem saída	2 unidades	50cm x 50cm	0,25	0,5
					8,04

1.6.3 COMP 19 TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, COM DIÂMETRO DE 2", DIN-240. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (DESONERADO)

62 placas x 2,50m = 155,00m

0,00 M


JOÃO PEDRO DE OLIVEIRA
Gerente de Obras
14.11.2020

- MEDIÇÃO 02 -

MEMÓRIA DE CÁLCULO DRENAGEM ESCAVAÇÃO E REATERRO

Descrição (Trecho)	DN	Classe e Resist.	Comp (m)	Profundidade			Paralelo do Tubo	Tipo de Base	Alt. Base	Prof. De Escav.	Larg. Da Vala	ESCAVAÇÃO		Embas. (M3)	Desc TB	Reaterro até 1,50m	Reaterro 1,50m a 3,00m
				Montante (m)	Jusante (m)	Média (m)						Até 1,50m	1,50m a 3,00m				
TUBOS																	
Rua Cantinho do Céu 437,00 m																	
PV1 - PV2	0,500	PA1		1,200	1,200	1,200	0,055	Pó de Pedra	0,10m	1,30m	1,11m			58,03 m3	163,66 m3	27,51 m3	329,59 m3
PV2 - PV3	0,500	PA1		1,200	1,200	1,200	0,055	Pó de Pedra	0,10m	1,30m	1,11m						
PV3 - PV4	0,500	PA1		1,200	1,200	1,200	0,055	Pó de Pedra	0,10m	1,30m	1,11m						
PV4 - PV5	0,500	PA1	19,00 m	1,200	1,200	1,200	0,055	Pó de Pedra	0,10m	1,30m	1,11m						
PV5 - PV6	0,500	PA1	25,00 m	1,200	1,200	1,200	0,055	Pó de Pedra	0,10m	1,30m	1,11m			2,11 m3	4,597 m3	20,71 m3	
PV6 - PV7	0,500	PA1	27,00 m	1,200	1,200	1,200	0,055	Pó de Pedra	0,10m	1,30m	1,11m			2,78 m3	6,048 m3	27,25 m3	
PV7 - PV8	0,500	PA1	24,00 m	1,200	2,080	1,640	0,055	Pó de Pedra	0,10m	1,74m	1,11m			3,00 m3	6,532 m3	29,43 m3	
PV8 - PV9	0,500	PA1	25,00 m	1,200	2,080	1,640	0,055	Pó de Pedra	0,10m	1,74m	1,11m			2,66 m3	5,806 m3		37,88 m3
PV9 - PV10	0,600	PA1	30,00 m	1,200	1,200	1,200	0,055	Pó de Pedra	0,10m	1,30m	1,23m			48,29 m3	6,048 m3		39,46 m3
PV10 - PV11	0,600	PA1	30,00 m	1,200	1,200	1,200	0,065	Pó de Pedra	0,10m	1,30m	1,23m			64,21 m3	10,420 m3		50,10 m3
PV11 - PV12	0,600	PA1	30,00 m	1,200	1,200	1,200	0,065	Pó de Pedra	0,10m	1,30m	1,23m			3,69 m3	10,420 m3	33,86 m3	
PV12 - PV13	0,600	PA1	39,00 m	1,200	1,200	1,200	0,065	Pó de Pedra	0,10m	1,30m	1,23m			3,69 m3	10,420 m3	33,86 m3	
PV13 - PV14	0,600	PA1	39,00 m	1,200	1,200	1,200	0,065	Pó de Pedra	0,10m	1,30m	1,23m			4,80 m3	13,546 m3	44,01 m3	
PV14 - PV15	0,600	PA1	32,00 m	1,200	1,500	1,350	0,065	Pó de Pedra	0,10m	1,45m	1,23m			4,80 m3	13,546 m3	44,01 m3	
PV15 - PV16	0,800	PA1		1,500	1,900	1,700	0,080	Pó de Pedra	0,10m	1,80m	1,46m			3,94 m3	11,114 m3	42,02 m3	
PV16 - PV17	0,800	PA1		1,900	2,500	2,200	0,080	Pó de Pedra	0,10m	2,30m	1,46m						
PV17 - PV18	0,800	PA1		2,500	1,200	1,850	0,080	Pó de Pedra	0,10m	1,95m	1,46m						
PV18 - PV19	0,800	PA1		1,200	1,300	1,250	0,080	Pó de Pedra	0,10m	1,35m	1,46m						
PV19 - PV20	0,800	PA1		1,300	2,000	1,650	0,080	Pó de Pedra	0,10m	1,75m	1,46m						
PV20 - PV21	0,800	PA1		2,000	2,000	2,000	0,080	Pó de Pedra	0,10m	2,10m	1,46m						
PV21 - PV22	0,800	PA1		2,000	2,140	2,070	0,080	Pó de Pedra	0,10m	2,17m	1,46m						
PV22 - PV23	0,800	PA1		2,140	1,870	2,010	0,080	Pó de Pedra	0,10m	2,11m	1,46m						
PV23 - PV24	0,800	PA1		1,870	1,600	1,740	0,080	Pó de Pedra	0,10m	1,84m	1,46m						
PV24 - PV25	0,800	PA1	31,00 m	1,600	1,600	1,600	0,080	Pó de Pedra	0,10m	1,70m	1,46m			76,94 m3	4,53 m3	18,855 m3	53,56 m3
PV25 - PV26	0,800	PA1	28,00 m	1,600	1,600	1,600	0,080	Pó de Pedra	0,10m	1,70m	1,46m			69,50 m3	4,09 m3	17,030 m3	48,38 m3
PV26 - PV27	0,800	PA1		1,600	1,600	1,600	0,080	Pó de Pedra	0,10m	1,70m	1,46m						
PV27 - PV28	0,800	PA1	30,00 m	1,600	1,600	1,600	0,080	Pó de Pedra	0,10m	1,70m	1,46m			74,46 m3	4,38 m3	18,246 m3	51,83 m3
PV28 - PV29	0,800	PA1	28,00 m	1,600	1,600	1,600	0,080	Pó de Pedra	0,10m	1,70m	1,46m			69,50 m3	4,09 m3	17,030 m3	48,38 m3
Estrada das Eternidades 244,00 m																	
PV43 - PV42	0,500	PA1	39,00 m	1,200	1,200	1,200	0,055	Pó de Pedra	0,10m	1,30m	1,56m			398,28 m3	59,03 m3	207,84 m3	308,12 m3
PV42 - PV41	0,500	PA1	40,00 m	1,200	1,200	1,200	0,055	Pó de Pedra	0,10m	1,30m	1,56m			6,08 m3	9,435 m3	63,58 m3	
PV41 - PV40	0,500	PA1	30,00 m	1,600	1,200	1,400	0,055	Pó de Pedra	0,10m	1,50m	1,76m			6,24 m3	9,677 m3	65,20 m3	
PV40 - PV39	0,500	PA1	15,00 m	1,200	1,200	1,200	0,055	Pó de Pedra	0,10m	1,30m	1,56m			79,20 m3	5,28 m3	7,258 m3	66,66 m3
PV39 - PV38	0,500	PA1	33,50 m	1,200	1,200	1,200	0,055	Pó de Pedra	0,10m	1,30m	1,56m			2,34 m3	3,629 m3	24,45 m3	
PV38 - PV37	0,500	PA1	46,50 m	1,500	1,500	1,500	0,055	Pó de Pedra	0,10m	1,60m	1,86m			5,23 m3	8,104 m3	54,61 m3	
PV37 - PV15	0,500	PA1	40,00 m	1,800	1,500	1,650	0,055	Pó de Pedra	0,10m	1,75m	2,01m			138,38 m3	8,65 m3	11,249 m3	118,48 m3
PV30 - PV15	0,500	PA1		1,500	1,500	1,500	0,055	Pó de Pedra	0,10m	1,60m	1,86m			140,70 m3	8,04 m3	9,677 m3	122,98 m3
PV31 - PV30	0,500	PA1		1,200	1,500	1,350	0,055	Pó de Pedra	0,10m	1,45m	1,71m						

MEMORIA DE CÁLCULO DRENAGEM ESCAVAÇÃO E REATERRO

Descrição (Trecho)	DN	Classe e Resist.	Comp. (m)	Profundidade			Tipo de Base	Alt. Base	Prof. De Escav.	Larg. De Vala	ESCAVAÇÃO		Embas. (M3)	Desc TB	Reaterro até 1,50m	Reaterro 1,50m a 3,00m
				Montante (m)	Jusante (m)	Média (m)					Até 1,50m	1,50m a 3,00m				
PV32 - PV31	0,500	PA1		1,300	1,200	1,250	Pó de Pedra	0,10m	1,35m	1,61m						
PV33 - PV32	0,500	PA1		1,200	1,300	1,250	Pó de Pedra	0,10m	1,35m	1,61m						
PV34 - PV33	0,500	PA1		1,200	1,200	1,200	Pó de Pedra	0,10m	1,30m	1,56m						
PV35 - PV34	0,500	PA1		1,200	1,200	1,200	Pó de Pedra	0,10m	1,30m	1,56m						
PV36 - PV35	0,500	PA1		2,000	1,200	1,600	Pó de Pedra	0,10m	1,70m	1,96m						
RAMAIS																
Total				6,00 m							6,21 m3		0,54 m3	0,58 m3	5,09 m3	
4 Caixas Ralo	0,300	PS1	6,00 m	1,000	1,100	1,050	Pó de Pedra	0,10m	1,15m	0,90m			0,54 m3	0,577 m3		5,09 m3

[Handwritten signature]

[Circular stamp: João Pedro Sousa, Engenheiro Civil, 1000000000]

MEMORIA DE CÁLCULO DRENAGEM ESCAVAÇÃO E REATERRO

Descrição (Trecho)	DN	Classe e Resist.	Comp (m)	Profundidade			Paralelo do Tubo	Tipo de Base	Alt. Base	Prof. De Escav.	Larg. Da Vala	ESCAVAÇÃO		Embas. (M3)	Desc TB	Reaterro até 1,50m	Reaterro 1,50m a 3,00m
				Montante (m)	Jusante (m)	Média (m)						Até 1,50m	1,50m a 3,00m				
POÇOS DE VISITA																	
142,57 32,95 m3 109,62																	
PV1	1,50 m	1,50 m	1,20 m	0,15 m	0,10 m	0,10 m	2,80 m	2,80 m	1,40 m	10,98 m3	2,70 m3	8,28 m3					
PV2	1,50 m	1,50 m	1,20 m	0,15 m	0,10 m	0,10 m	2,80 m	2,80 m	1,40 m	10,98 m3	2,70 m3	8,28 m3					
PV3	1,50 m	1,50 m	1,20 m	0,15 m	0,10 m	0,10 m	2,80 m	2,80 m	1,40 m	10,98 m3	2,70 m3	8,28 m3					
PV4	1,50 m	1,50 m	1,20 m	0,15 m	0,10 m	0,10 m	2,80 m	2,80 m	1,40 m	10,98 m3	2,70 m3	8,28 m3					
PV5	1,50 m	1,50 m	1,20 m	0,15 m	0,10 m	0,10 m	2,80 m	2,80 m	1,40 m	10,98 m3	2,70 m3	8,28 m3					
PV6	1,50 m	1,50 m	1,20 m	0,15 m	0,10 m	0,10 m	2,80 m	2,80 m	1,40 m	10,98 m3	2,70 m3	8,28 m3					
PV7	1,50 m	1,50 m	1,20 m	0,15 m	0,10 m	0,10 m	2,80 m	2,80 m	1,40 m	10,98 m3	2,70 m3	8,28 m3					
PV8	2,00 m	2,00 m	2,08 m	0,15 m	0,10 m	0,10 m	3,30 m	3,30 m	2,28 m	24,83 m3	8,32 m3	16,51 m3					
PV9	1,50 m	1,50 m	1,20 m	0,15 m	0,10 m	0,10 m	2,80 m	2,80 m	1,40 m	10,98 m3	2,70 m3	8,28 m3					
PV10	1,50 m	1,50 m	1,20 m	0,15 m	0,10 m	0,10 m	2,80 m	2,80 m	1,40 m	10,98 m3	2,70 m3	8,28 m3					
PV11	1,50 m	1,50 m	1,20 m	0,15 m	0,10 m	0,10 m	2,80 m	2,80 m	1,40 m	10,98 m3	2,70 m3	8,28 m3					
PV12	1,50 m	1,50 m	1,20 m	0,15 m	0,10 m	0,10 m	2,80 m	2,80 m	1,40 m	10,98 m3	2,70 m3	8,28 m3					
PV13	1,50 m	1,50 m	1,20 m	0,15 m	0,10 m	0,10 m	2,80 m	2,80 m	1,40 m	10,98 m3	2,70 m3	8,28 m3					
PV14	1,50 m	1,50 m	1,20 m	0,15 m	0,10 m	0,10 m	2,80 m	2,80 m	1,40 m	10,98 m3	2,70 m3	8,28 m3					
PV15	2,00 m	2,00 m	1,50 m	0,15 m	0,10 m	0,10 m	3,30 m	3,30 m	1,70 m	18,51 m3	6,00 m3	12,51 m3					
PV16	1,50 m	1,50 m	1,90 m	0,15 m	0,10 m	0,10 m	2,80 m	2,80 m	1,40 m	10,98 m3	2,70 m3	8,28 m3					
PV17	1,50 m	1,50 m	2,50 m	0,15 m	0,10 m	0,10 m	2,80 m	2,80 m	2,10 m	16,46 m3	4,28 m3	12,18 m3					
PV18	1,50 m	1,50 m	1,20 m	0,15 m	0,10 m	0,10 m	2,80 m	2,80 m	2,70 m	21,17 m3	5,63 m3	15,54 m3					
PV19	1,50 m	1,50 m	1,30 m	0,15 m	0,10 m	0,10 m	2,80 m	2,80 m	1,40 m	10,98 m3	2,70 m3	8,28 m3					
PV20	1,50 m	1,50 m	2,00 m	0,15 m	0,10 m	0,10 m	2,80 m	2,80 m	1,50 m	11,76 m3	2,93 m3	8,83 m3					
PV21	1,20 m	1,20 m	2,00 m	0,15 m	0,10 m	0,10 m	2,80 m	2,80 m	2,20 m	17,25 m3	4,50 m3	12,75 m3					
PV22	1,20 m	1,20 m	2,14 m	0,15 m	0,10 m	0,10 m	2,50 m	2,50 m	2,20 m	13,75 m3	2,88 m3	10,87 m3					
PV23	2,00 m	2,00 m	1,87 m	0,15 m	0,10 m	0,10 m	3,30 m	3,30 m	2,34 m	14,63 m3	3,08 m3	11,55 m3					
PV24	2,00 m	2,00 m	1,80 m	0,15 m	0,10 m	0,10 m	3,30 m	3,30 m	2,07 m	22,54 m3	7,48 m3	15,06 m3					
PV25	2,00 m	2,00 m	1,60 m	0,15 m	0,10 m	0,10 m	3,30 m	3,30 m	1,80 m	19,60 m3	6,40 m3	13,20 m3					
PV26	2,00 m	2,00 m	1,60 m	0,15 m	0,10 m	0,10 m	3,30 m	3,30 m	1,80 m	19,60 m3	6,40 m3	13,20 m3					
PV27	2,00 m	2,00 m	1,50 m	0,15 m	0,10 m	0,10 m	3,30 m	3,30 m	1,70 m	18,51 m3	5,00 m3	13,20 m3					
PV28	2,00 m	2,00 m	1,50 m	0,15 m	0,10 m	0,10 m	3,30 m	3,30 m	1,70 m	18,51 m3	5,00 m3	13,20 m3					
PV29	2,00 m	2,00 m	1,50 m	0,15 m	0,10 m	0,10 m	3,30 m	3,30 m	1,70 m	18,51 m3	5,00 m3	13,20 m3					
PV30	1,20 m	1,20 m	1,50 m	0,15 m	0,10 m	0,10 m	2,50 m	2,50 m	1,70 m	10,63 m3	2,16 m3	8,47 m3					
PV31	1,20 m	1,20 m	1,20 m	0,15 m	0,10 m	0,10 m	2,50 m	2,50 m	1,70 m	10,63 m3	2,16 m3	8,47 m3					
PV32	1,20 m	1,20 m	1,30 m	0,15 m	0,10 m	0,10 m	2,50 m	2,50 m	1,40 m	8,75 m3	1,73 m3	7,02 m3					
PV33	1,20 m	1,20 m	1,20 m	0,15 m	0,10 m	0,10 m	2,50 m	2,50 m	1,50 m	9,38 m3	1,87 m3	7,51 m3					
PV34	1,20 m	1,20 m	1,20 m	0,15 m	0,10 m	0,10 m	2,50 m	2,50 m	1,40 m	8,75 m3	1,73 m3	7,02 m3					
PV35	1,20 m	1,20 m	1,20 m	0,15 m	0,10 m	0,10 m	2,50 m	2,50 m	1,40 m	8,75 m3	1,73 m3	7,02 m3					
PV EXECUTADO																	
PV EXECUTADO																	
PV EXECUTADO																	
PV EXECUTADO																	
PV EXECUTADO																	
PV EXECUTADO																	
PV EXECUTADO 1ª MEDIÇÃO																	
PV EXECUTADO 1ª MEDIÇÃO																	
PV EXECUTADO 1ª MEDIÇÃO																	
PV EXECUTADO 1ª MEDIÇÃO																	

PV EXECUTADO
PV EXECUTADO
PV EXECUTADO
PV EXECUTADO

PV EXECUTADO
PV EXECUTADO
PV EXECUTADO
PV EXECUTADO
PV EXECUTADO

PV EXECUTADO 1ª MEDIÇÃO
PV EXECUTADO 1ª MEDIÇÃO

PV EXECUTADO 1ª MEDIÇÃO
PV EXECUTADO 1ª MEDIÇÃO

MEMORIA DE CÁLCULO DRENAGEM ESCAVAÇÃO E REATERRO

Descrição (Trecho)	DN	Classe e Resist.	Comp (m)	Profundidade			Parede do Tubo	Tipo de Base	Alt. Base	Prof. De Escav.	Larg. Da Vala	ESCAVAÇÃO		Embas. (M3)	Desc TB	Reaterro até 1,50m	Reaterro 1,50m a 3,00m
				Montante (m)	Jusante (m)	Média (m)						Até 1,50m	1,50m a 3,00m				
PV36	1,20 m	1,20 m	2,00 m	0,15 m	0,10 m	0,10 m	2,50 m	2,50 m	2,20 m	13,75 m3	2,88 m3	10,87 m3					
PV37	1,20 m	1,20 m	2,00 m	0,15 m	0,10 m	0,10 m	2,50 m	2,50 m	2,20 m	13,75 m3	2,88 m3	10,87 m3					
PV38	1,20 m	1,20 m	1,20 m	0,15 m	0,10 m	0,10 m	2,50 m	2,50 m	1,40 m	8,75 m3	1,73 m3	7,02 m3					
PV39	1,20 m	1,20 m	1,20 m	0,15 m	0,10 m	0,10 m	2,50 m	2,50 m	1,40 m	8,75 m3	1,73 m3	7,02 m3					
PV40	1,20 m	1,20 m	1,20 m	0,15 m	0,10 m	0,10 m	2,50 m	2,50 m	1,40 m	8,75 m3	1,73 m3	7,02 m3					
PV41	1,20 m	1,20 m	1,20 m	0,15 m	0,10 m	0,10 m	2,50 m	2,50 m	1,40 m	8,75 m3	1,73 m3	7,02 m3					
PV42	1,20 m	1,20 m	1,20 m	0,15 m	0,10 m	0,10 m	2,50 m	2,50 m	1,40 m	8,75 m3	1,73 m3	7,02 m3					
PV43	1,20 m	1,20 m	1,20 m	0,15 m	0,10 m	0,10 m	2,50 m	2,50 m	1,40 m	8,75 m3	1,73 m3	7,02 m3					

PV EXECUTADO 1ª MEDIÇÃO
PV EXECUTADO 1ª MEDIÇÃO
PV EXECUTADO
PV EXECUTADO
PV EXECUTADO
PV EXECUTADO

CAIXAS RALO

Quantidade	Dimensões	Espessura paredes	Espessura Fundo	Espessura Tampa	Dimensões Escavação	Volume de Escavação	Volume da caixa	Reaterro
4	0,30 m	0,15 m	0,10 m	0,10 m	1,60 m	16,90 m3	1,08 m3	15,82 m3

CAIXAS DE AREIA

Quantidade	Dimensões	Espessura paredes	Espessura Fundo	Espessura Tampa	Dimensões Escavação	Volume de Escavação	Volume da caixa	Reaterro
	6,00 m	0,15 m			6,55 m	1,80 m	1,20 m	

Tubo 300mm	6,00 m
Tubo 500mm	364,00 m
Tubo 600mm	200,00 m
Tubo 800mm	117,00 m
Escavação até 1,5m	661,87 m³
Escavação 1,5m a 3,0m	950,10 m³
Total Embasamento	97,43 m³
Reaterro até 1,5m	613,52 m³
Reaterro 1,5m a 3,0m	637,71 m³

Assinatura do Engenheiro Responsável
Data: 08/07/2019
Carimbo Profissional




ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Pavimentação e Drenagem da Rua Canto do Céu e Rua Morro das Emerências (Parte)
Bairro: José Gonçalves
Sinapi Julho/2017

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO															
	1º MES	2º MES	3º MES	4º MES	5º MES	6º MES	7º MES	8º MES	9º MES	10º MES	11º MES	12º MES	TOTAL	%	
1.1 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 6.546,42	R\$ 3.332,98	R\$ 3.501,74	R\$ 3.332,98	R\$ 3.332,98	R\$ 3.332,98	R\$ 3.332,98	R\$ 3.332,98	R\$ 3.332,98	R\$ 3.332,98	R\$ 3.332,98	R\$ 3.332,98	R\$ 3.332,98	4,86%	
1.2 CANTERO DE OBRAS E SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 57.891,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	83,14%	
1.3 MOVIMENTO DE TERRA, CARGA, TRANSPORTE E DRENAGEM	R\$ 76.495,43	R\$ 65.321,47	R\$ 68.936,04	R\$ 65.321,47	R\$ 65.321,47	R\$ 65.321,47	R\$ 65.321,47	R\$ 65.321,47	R\$ 65.321,47	R\$ 65.321,47	R\$ 65.321,47	R\$ 65.321,47	R\$ 65.321,47	97,04%	
1.4 - PAVIMENTAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	
1.5 - CALÇADA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	
1.6 - SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	
	R\$ 134.842,88	R\$ 68.664,45	R\$ 72.098,78	R\$ 68.664,45	R\$ 68.664,45	R\$ 68.664,45	R\$ 68.664,45	R\$ 68.664,45	R\$ 68.664,45	R\$ 68.664,45	R\$ 68.664,45	R\$ 68.664,45	R\$ 68.664,45	100,00%	
	R\$ 134.842,88	R\$ 203.507,23	R\$ 276.607,11	R\$ 344.271,56	R\$ 412.936,01	R\$ 481.599,46	R\$ 550.262,91	R\$ 618.927,37	R\$ 687.591,82	R\$ 756.256,27	R\$ 824.920,72	R\$ 893.585,17	R\$ 962.249,62	100,00%	

[Handwritten signature]
PREFEITO MUNICIPAL



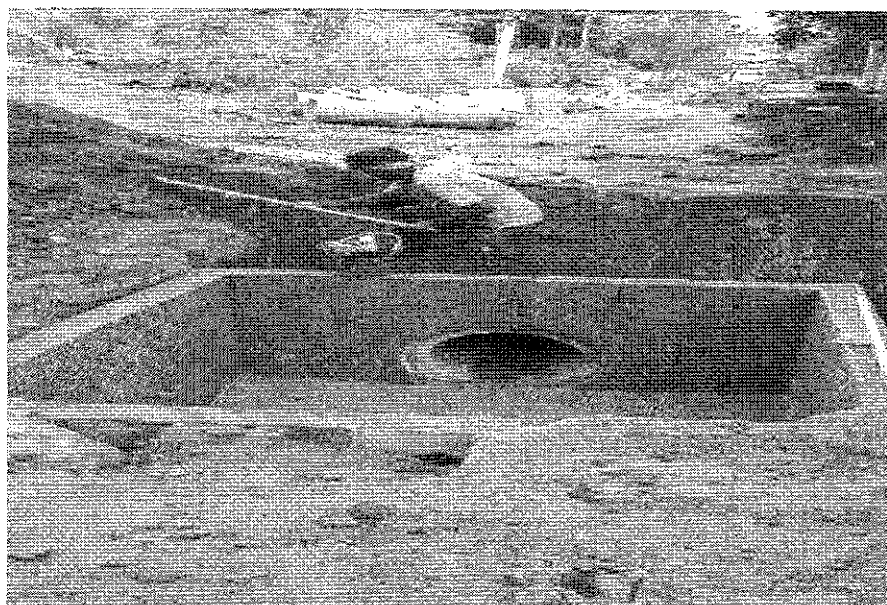
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DA ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Obra:	Pavimentação e Drenagem da Rua Canto do Céu e Rua Morro das Emerências
Local:	José Gonçalves
Empresa:	Dafla Construção Serviços e Gerenciamento LTDA-EPP
Engenheiro	João Pedro Souza
Fiscal:	

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 2ª MEDIÇÃO




Assentamento tubulação



Execução de PV

Folha ___/___	Contratada	Engenheiro da Contratante
------------------	------------	---------------------------

João Pedro Santos de Souza
 Cadista - Matr.: 13.800
 Engenheiro Civil
 CREA 2017107998



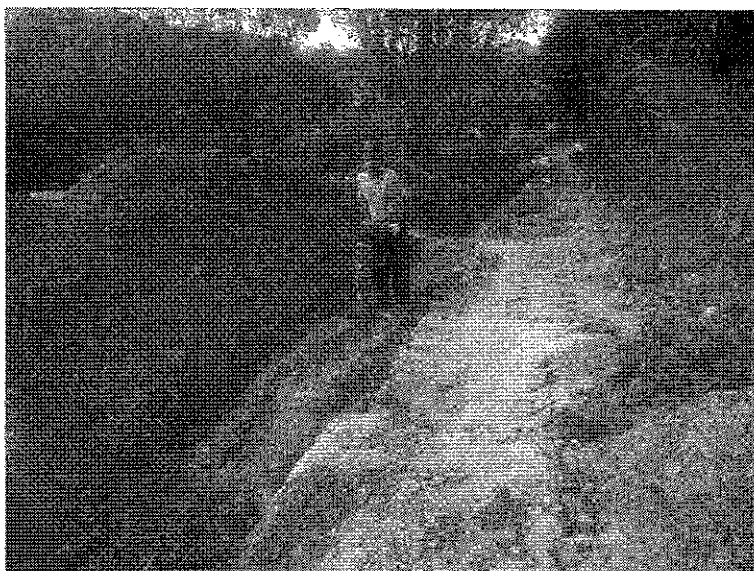
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DA ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Obra:	Pavimentação e Drenagem da Rua Canto do Céu e Rua Morro das Emerências
Local:	José Gonçalves
Empresa:	Dafla Construção Serviços e Gerenciamento LTDA-EPP
Engenheiro Fiscal:	João Pedro Souza

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 2ª MEDIÇÃO




Embasamento de tubulação



Reaterro e compactação

Folha ___/___	Contratada	Engenheiro da Contratante
------------------	------------	---------------------------

João Pedro Santos de Souza
 Cadista - Matr.: 13.800
 Engenheiro Civil
 CREA 2017107998



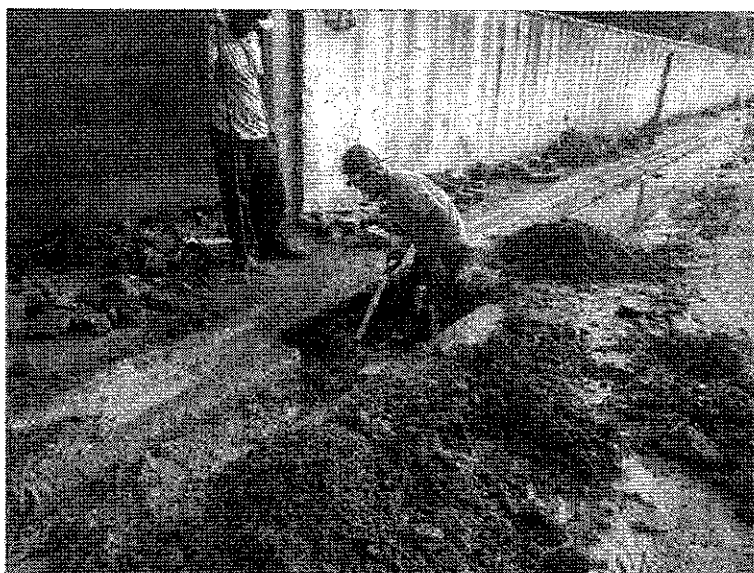
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DA ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Obra:	Pavimentação e Drenagem da Rua Canto do Céu e Rua Morro das Emerências
Local:	José Gonçalves
Empresa:	Dafla Construção Serviços e Gerenciamento LTDA-EPP
Engenheiro	João Pedro Souza
Fiscal:	

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 2ª MEDIÇÃO




Assentamento tubulação de 500mm trecho do pv 40 ao pv 41 material ruim e muita água no terreno



Escavação manual da caixa ralo

Folha ____/____	Contratada	Engenheiro da Contratante
--------------------	------------	---------------------------

João Pedro Santos da Souza
 Cadista - Matr.: 13.800
 Engenheiro Civil
 CREA 2017407998



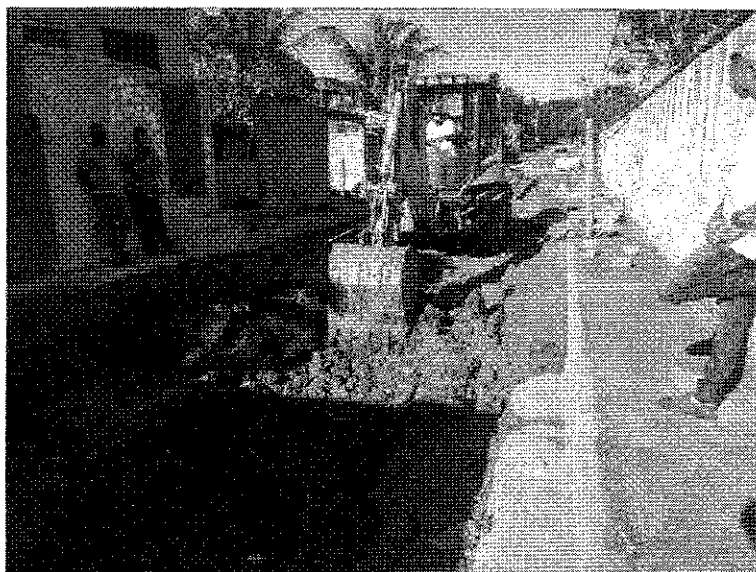
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DA ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Obra:	Pavimentação e Drenagem da Rua Canto do Céu e Rua Morro das Emerências
Local:	José Gonçalves
Empresa:	Dafla Construção Serviços e Gerenciamento LTDA-EPP
Engenheiro Fiscal:	João Pedro Souza

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 2ª MEDIÇÃO




Instalação da caixa ralo



Retirada de material para execução de sub-base

Folha ___/___	Contratada	Engenheiro da Contratante
------------------	------------	---------------------------

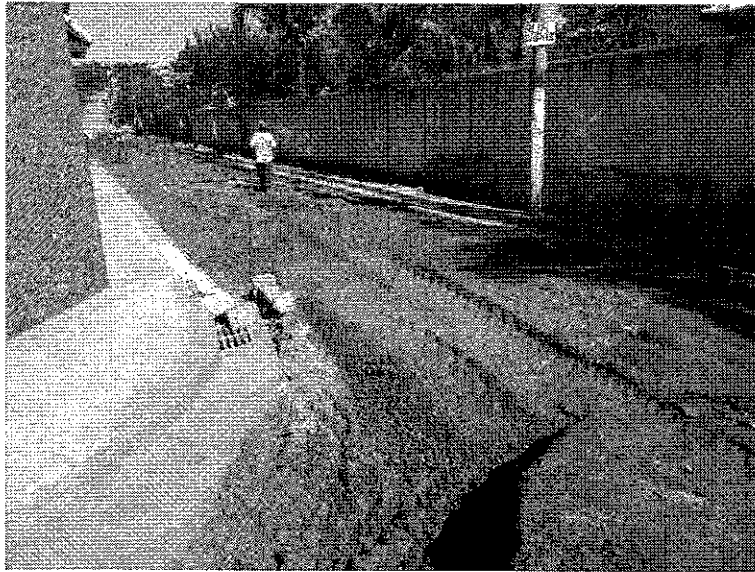
João Pedro Santos de Souza
 Cartista - Matr.: 13.800
 Engenheiro Civil
 CREA 3017107998



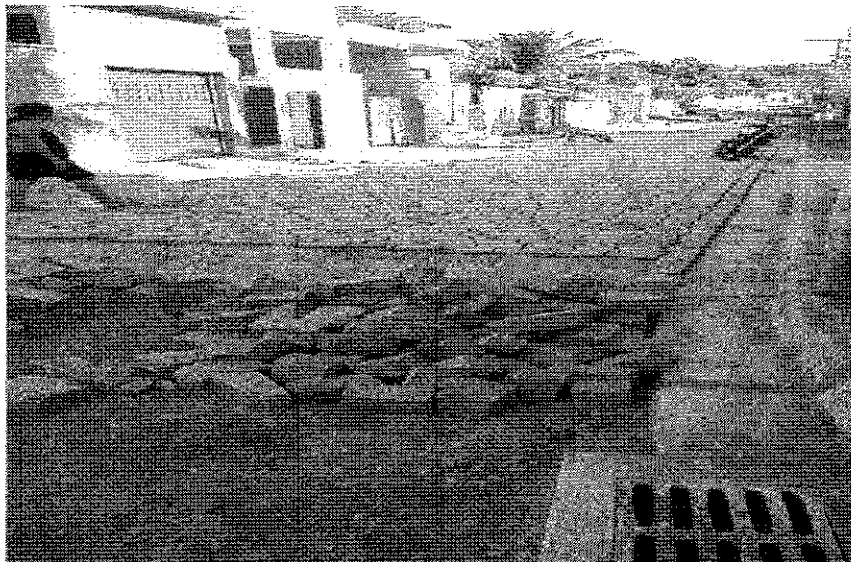
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DA ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Obra:	Pavimentação e Drenagem da Rua Canto do Céu e Rua Morro das Emerências
Local:	José Gonçalves
Empresa:	Dafla Construção Serviços e Gerenciamento LTDA-EPP
Engenheiro	João Pedro Souza
Fiscal:	

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 2ª MEDIÇÃO



Execução de sub-base



Recomposição do paralelepípedo

Folha ___/___	Contratada	Engenheiro da Contratante
------------------	------------	---------------------------

João Pedro Santos de Souza
 Cadista - Matr.: 13.800
 Engenheiro Civil
 CREA 2017107998



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DAFLA CONSTRUCAO SERVICOS E GERENCIAMENTO LTDA
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 12.603.970/0001-60
Certidão n°: 149230257/2018
Expedição: 30/04/2018, às 12:48:08
Validade: 26/10/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que DAFLA CONSTRUCAO SERVICOS E GERENCIAMENTO LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 12.603.970/0001-60, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Dúvidas e sugestões: cdt@tst.jus.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: DAFLA CONSTRUÇÃO SERVICOS E GERENCIAMENTO LTDA
CNPJ: 12.603.970/0001-60

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 17:10:42 do dia 27/03/2018 <hora e data de Brasília>.

Válida até 23/09/2018.

Código de controle da certidão: B0A5.00E0.A158.3ECC

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

OK

IMPRIMIR

VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF****Inscrição:** 12603970/0001-60**Razão Social:** DAFLA CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E GERENCIAMENTO LTDA EPP**Endereço:** EST FRANCISCO DA CRUZ NUNES 8180 SALA 210 / ITAIPU /
NITEROI / RJ / 24340-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 07/07/2018 a 05/08/2018**Certificação Número:** 2018070715353112931522

Informação obtida em 17/07/2018, às 14:50:03.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Armação dos Búzios

CONTRATO Nº

010/2018

OBRA:

28-mai-18

Segunda-Feira

OBRA DE PAV. E DRENAGEM DA RUA CANTO DO CÉU E RUA MORRO DAS EMERÊNCIAS (PARTE) NO BAIRRO JOSÉ GOLÇALVES

TEMPO CLIMA

BOM	X	INSTÁVEL		CHUVOSO		IMPRATICÁVEL	
-----	---	----------	--	---------	--	--------------	--

Pessoal	
Função	Quant.
Engenheiro	1
Encarregado	1
Pedreiro	3
Servente	7
Carpinteiro/Armador	
Calceteiro	

Equipamento	
Descrição	Quant.
Caminhão Toco	1
Compactador sapo	2
Retro escavadeira	1

Serviços Realizados
COMENTÁRIOS DO FISCAL:
COMENTÁRIOS DA EMPRESA:

DEVIDO A GREVE DOS CAMINHONEIROS AINDA ESTAMOS COM DIFICULDADES DE ENTREGA DE MATERIAL E ABASTECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS.

RESP. PELA EMPRESA

ENG. FISCAL

 João Pedro Souza
 Gerente de Saneamento
 Mat.: 13809



Diário de Obras

DIAS CORRIDO 44

Armação dos Búzios

CONTRATO Nº

010/2018

OBRA:

29-mai-18

Terça-Feira

OBRA DE PAV. E DRENAGEM DA RUA CANTO DO CÉU E RUA MORRO DAS EMERÊNCIAS (PARTE) NO BAIRRO
JOSÉ GOLÇALVES

TEMPO CLIMA

BOM	X	INSTÁVEL		CHUVOSO		IMPRATICÁVEL	
-----	---	----------	--	---------	--	--------------	--

Pessoal

Função	Quant.
Engenheiro	1
Encarregado	1
Pedreiro	3
Servente	7
Carpinteiro/Armador	
Calceteiro	

Equipamento

Descrição	Quant.
Caminhão Toco	1
Compactador sapo	2
Retro escavadeira	1

Serviços Realizados

COMENTÁRIOS DO FISCAL:

COMENTÁRIOS DA EMPRESA:

DEVIDO A GREVE DOS CAMINHONEIROS AINDA ESTAMOS COM DIFICULDADES DE ENTREGA DE MATERIAL E ABASTECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS.

RESP. PELA EMPRESA

José R. de Souza
Engenheiro Civil
CREA-RJ: 199010993

ENG. FISCAL

Pedro Souza
Engenheiro de Saneamento
Mat.: 13890



Diário de Obras

DIAS CORRIDO 45

Armação dos Búzios

CONTRATO Nº

010/2018

OBRA:

30-mai-18

Quarta-Feira

OBRA DE PAV. E DRENAGEM DA RUA CANTO DO CÉU E RUA MORRO DAS EMERÊNCIAS (PARTE) NO BAIRRO
JOSÉ GOLÇALVES

TEMPO CLIMA

BOM	X	INSTÁVEL		CHUVOSO		IMPRATICÁVEL	
-----	---	----------	--	---------	--	--------------	--

Pessoal

Função	Quant.
Engenheiro	1
Encarregado	1
Pedreiro	3
Servente	7
Carpinteiro/Armador	
Calceteiro	

Equipamento

Descrição	Quant.
Caminhão Toco	1
Compactador sapo	2
Retro escavadeira	1

Serviços Realizados

COMENTÁRIOS DO FISCAL:

COMENTÁRIOS DA EMPRESA:

DEVIDO A GREVE DOS CAMINHONEIROS AINDA ESTAMOS COM DIFICULDADES DE ENTREGA DE MATERIAL E ABASTECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS.

RESP. PELA EMPRESA

João Roberto Marquês Cruz
Engenheiro Civil
CPF: 192012943

ENG. FISCAL

João Pedro Souza
Gerente de Saneamento
Mat.: 13500



Diário de Obras

DIAS CORRIDO 46

Armação dos Búzios

CONTRATO Nº

010/2018

OBRA:

31-mai-18

Quinta-Feira

OBRA DE PAV. E DRENAGEM DA RUA CANTO DO CÉU E RUA MORRO DAS EMERÊNCIAS (PARTE) NO
BAIRRO JOSÉ GOLÇALVES

TEMPO CLIMA

BOM	X	INSTÁVEL		CHUVOSO		IMPRATICÁVEL	
-----	---	----------	--	---------	--	--------------	--

Pessoal	
Função	Quant.
Engenheiro	
Encarregado	
Pedreiro	
Servente	
Carpinteiro/Armador	
Alceteiro	

Equipamento	
Descrição	Quant.
Caminhão Toco	
Compactador sapo	
Retro escavadeira	

Serviços Realizados

FERIADO

COMENTÁRIOS DO FISCAL:

COMENTÁRIOS DA EMPRESA:

RESP. PELA EMPRESA: Roberto Marques Cruz
Engenheiro Civil
CREA RJ: 193040083

ENG. FISCAL

João Pedro Souza
Gerente de Saneamento
Mat.: 13800



Diário de Obras

DIAS CORRIDO 47

Armação dos Búzios

CONTRATO Nº

010/2018

OBRA:

01-jun-18

Sexta-Feira

OBRA DE PAV. E DRENAGEM DA RUA CANTO DO CÉU E RUA MORRO DAS EMERÊNCIAS (PARTE) NO
BAIRRO JOSÉ GOLÇALVES

TEMPO CLIMA

BOM	X	INSTÁVEL		CHUVOSO		IMPRATICÁVEL	
-----	---	----------	--	---------	--	--------------	--

Pessoal	
Função	Quant.
Engenheiro	1
Encarregado	1
Pedreiro	3
Servente	7
Carpinteiro/Armador	
Alceteiro	

Equipamento	
Descrição	Quant.
Caminhão Toco	1
Compactador sapo	2
Retro escavadeira	1

Serviços Realizados

COMENTÁRIOS DO FISCAL:

COMENTÁRIOS DA EMPRESA:

DEVIDO A GREVE DOS CAMINHONEIROS AINDA ESTAMOS COM DIFICULDADES DE ENTREGA DE MATERIAL E ABASTECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS.

RESP. PELA EMPRESA

ROSEMARIA MARQUES CRUZ
Engenheira Civil
CPF: 199010083

ENG. FISCAL

João Pedro Souza
Gerente de Saneamento
Mat.: 13800



Diário de Obras

DIAS CORRIDO 48 49

Armação dos Búzios

CONTRATO Nº 010/2018

OBRA 02-jun-18 03-jun-18 Sábado Domingo

OBRA DE PAV. E DRENAGEM DA RUA CANTO DO CÉU E RUA MORRO DAS EMERÊNCIAS (PARTE) NO BAIRRO JOSÉ GOLÇALVES

TEMPO CLIMA

BOM		INSTÁVEL		CHUVOSO		IMPRATICÁVEL	
-----	--	----------	--	---------	--	--------------	--

Pessoal	
Função	Quant.
Engenheiro	
Encarregado	
Pedreiro	
Servente	
Carpinteiro/Armador	
Calçeteiro	

Equipamento	
Descrição	Quant.
Caminhão Toco	
Compactador sapo	
Retro escavadeira	

Serviços Realizados

COMENTÁRIOS DO FISCAL:

COMENTÁRIOS DA EMPRESA:

RESP. PELA EMPRESA José Roberto Marques Cruz
Engenheiro Civil
CREA RJ: 139010000

ENG. FISCAL

João Pedro Souza
Gerente de Saneamento
Mat.: 13800



Diário de Obras

DIAS CORRIDO 50

Armação dos Búzios

CONTRATO Nº

010/2018

OBRA:

04-jun-18

Segunda-Feira

OBRA DE PAV. E DRENAGEM DA RUA CANTO DO CÉU E RUA MORRO DAS EMERÊNCIAS (PARTE) NO BAIRRO JOSÉ GOLÇALVES

TEMPO CLIMA

BOM		INSTÁVEL		CHUVOSO		IMPRATICÁVEL	X
-----	--	----------	--	---------	--	--------------	---

Pessoal	
Função	Quant.
Engenheiro	1
Encarregado	1
Pedreiro	3
Servente	7
Carpinteiro/Armador	
Alceteiro	

Equipamento	
Descrição	Quant.
Caminhão Toco	1
Compactador sapo	2
Retro escavadeira	1

Serviços Realizados

COMENTÁRIOS DO FISCAL:

COMENTÁRIOS DA EMPRESA:

OBRA PARADA SEM CONDIÇÃO DE SERVIÇO

RESP. PELA EMPRESA *João Roberto Marques Cruz*
Engenheiro CIVIL
CREA RJ 109910083

ENG. FISCAL

João Pedro Souza
Gerente de Saneamento
Mat.: 13800

DIAS CORRIDO 51

Armação dos Búzios

CONTRATO Nº

010/2018

OBRA:

05-jun-18

Terça-Feira

OBRA DE PAV. E DRENAGEM DA RUA CANTO DO CÉU E RUA MORRO DAS EMERÊNCIAS (PARTE) NO
BAIRRO JOSÉ GOLÇALVES

TEMPO CLIMA

BOM		INSTÁVEL		CHUVOSO	X	IMPRATICÁVEL	
-----	--	----------	--	---------	---	--------------	--

Pessoal

Função	Quant.
Engenheiro	1
Encarregado	1
Pedreiro	3
Servente	7
Carpinteiro/Armador	
Calçeteiro	

Equipamento

Descrição	Quant.
Caminhão Toco	1
Compactador sapo	2
Retro escavadeira	1

Serviços Realizados

- *EXECUÇÃO DE ESCAÇÃO DO PV-14 AO PV 13
- *COLOCAÇÃO DE TUBO DE 600MM
- *EMBASAMENTO DE TUBULAÇÃO
- *REATERRO MANUAL DE VALA E COMPACTAÇÃO
- *EXECUÇÃO DE PV

COMENTÁRIOS DO FISCAL:

COMENTÁRIOS DA EMPRESA:

APÓS A CHUVA FICOU IMPRATICÁVEL A ENTRADA DE MATERIAL EM CAMINHÃO TRUCK. COM ISSO TIVEMOS QUE DESCARREGAR OS MATERIAIS NA RUA JOSE GONÇALVES E TRANSPORTA-LOS EM CAMINHÃO TOCO.

RESP. PELA EMPRESA

José Roberto Marques Cruz

Engenheiro Civil

CREA-RJ: 193910983

ENG. FISCAL


João Pedro Souza
Gerente de Saneamento
Mat.: 13800

DIAS CORRIDO 52

Armação dos Búzios

CONTRATO Nº

010/2018

OBRA:

06-jun-18

Quarta-Feira

 OBRA DE PAV. E DRENAGEM DA RUA CANTO DO CÉU E RUA MORRO DAS EMERÊNCIAS (PARTE) NO
 BAIRRO JOSÉ GOLÇALVES

TEMPO CLIMA

BOM		INSTÁVEL		CHUVOSO	X	IMPRATICÁVEL	
-----	--	----------	--	---------	---	--------------	--

Pessoal	
Função	Quant.
Engenheiro	1
Encarregado	1
Pedreiro	3
Servente	7
Carpinteiro/Armador	
Alceteiro	

Equipamento	
Descrição	Quant.
Caminhão Toco	1
Compactador sapo	2
Retro escavadeira	1

Serviços Realizados

- *EXECUÇÃO DE ESCAÇÃO DO PV-13 AO PV 12
- *COLOCAÇÃO DE TUBO DE 600MM
- *EMBASAMENTO DE TUBULAÇÃO
- *REATERRO MANUAL DE VALA E COMPACTAÇÃO
- *EXECUÇÃO DE PV

COMENTÁRIOS DO FISCAL:

COMENTÁRIOS DA EMPRESA:

 RESP. PELA EMPRESA **José Roberto Marques Cruz**
 Engenheiro Civil
 CRE- RJ: 133616682

ENG. FISCAL

João Pedro Souza
 Gerente de Saneamento
 Mat.: 13800

DIAS CORRIDO 53

Armação dos Búzios

CONTRATO Nº

010/2018

OBRA:

07-jun-18

Quinta-Feira

OBRA DE PAV. E DRENAGEM DA RUA CANTO DO CÉU E RUA MORRO DAS EMERÊNCIAS (PARTE) NO BAIRRO JOSÉ GOLÇALVES

TEMPO CLIMA

BOM		INSTÁVEL		CHUVOSO	X	IMPRATICÁVEL	
-----	--	----------	--	---------	---	--------------	--

Pessoal	
Função	Quant.
Engenheiro	1
Encarregado	1
Pedreiro	3
Servente	7
Carpinteiro/Armador	
alceteiro	

Equipamento	
Descrição	Quant.
Caminhão Toco	1
Compactador sapo	2
Retro escavadeira	1

Serviços Realizados

*EXECUÇÃO DE ESCAÇÃO DO PV-13 AO PV 12

*COLOCAÇÃO DE TUBO DE 600MM

*EMBASAMENTO DE TUBULAÇÃO

*REATERRO MANUAL DE VALA E COMPACTAÇÃO

*EXECUÇÃO DE PV

COMENTÁRIOS DO FISCAL:

COMENTÁRIOS DA EMPRESA:

RESP. PELA EMPRESA

 João Roberto Marques Cruz
 Engenharia Civil
 CREA RJ 13.244/0-3

ENG. FISCAL

 João Pedro Souza
 Gerente de Saneamento
 Mat.: 13800

DIAS CORRIDO 54

Armação dos Búzios

CONTRATO Nº

010/2018

OBRA:

08-jun-18

Sexta-Feira

OBRA DE PAV. E DRENAGEM DA RUA CANTO DO CÉU E RUA MORRO DAS EMERÊNCIAS (PARTE) NO TEMPO CLIMA

BOM		INSTÁVEL		CHUVOSO	X	IMPRATICÁVEL	
-----	--	----------	--	---------	---	--------------	--

Pessoal	
Função	Quant.
Engenheiro	1
Encarregado	1
Pedreiro	3
Servente	7
Carpinteiro/Armador	
Calceteiro	

Equipamento	
Descrição	Quant.
Caminhão Toco	1
Compactador sapo	2
Retro escavadeira	1

Serviços Realizados

- *EXECUÇÃO DE ESCAÇÃO DO PV-15 AO PV 37
- *COLOCAÇÃO DE TUBO DE 500MM
- *EMBASAMENTO DE TUBULAÇÃO
- *REATERRO MANUAL DE VALA E COMPACTAÇÃO
- *EXECUÇÃO DE PV

COMENTÁRIOS DO FISCAL:

COMENTÁRIOS DA EMPRESA:

RESP. PELA EMPRESA

 Roberto Henrique Cruz
 Engenheiro Civil
 CREA RJ: 165.140.003

ENG. FISCAL

 João Pedro Souza
 Gerente de Saneamento
 Mat.: 13800



DAFLA
CONSTRUÇÃO | SERVIÇOS | GERENCIAMENTO

Diário de Obras

DIAS CORRIDO 55 56

Armação dos Búzios

CONTRATO Nº

010/2018

OBRA

09-jun-18

10-jun-18

Sábado Domingo

OBRA DE PAV. E DRENAGEM DA RUA CANTO DO CÉU E RUA MORRO DAS EMERÊNCIAS (PARTE) NO
BAIRRO JOSÉ GOLÇALVES

TEMPO CLIMA

BOM

INSTÁVEL

CHUVOSO

IMPRATICÁVEL

Pessoal

Função	Quant.
Engenheiro	
Encarregado	
Pedreiro	
Servente	
Carpinteiro/Armador	
alceteiro	

Equipamento

Descrição	Quant.
Caminhão Toco	
Compactador sapo	
Retro escavadeira	

Serviços Realizados

COMENTÁRIOS DO FISCAL:

COMENTÁRIOS DA EMPRESA:

RESP. PELA EMPRESA *João Roberto Marques Cruz*
Engenheiro Civil
CREA-RJ: 199010022

ENG. FISCAL

João Pedro Souza
Gerente de Saneamento
Mat: 13800

Armação dos Búzios

CONTRATO Nº

010/2018

OBRA:

11-jun-18

Segunda-Feira

OBRA DE PAV. E DRENAGEM DA RUA CANTO DO CÉU E RUA MORRO DAS EMERÊNCIAS (PARTE) NO
BAIRRO JOSÉ GOLÇALVES

TEMPO CLIMA

BOM	X	INSTÁVEL		CHUVOSO		IMPRATICÁVEL	
-----	---	----------	--	---------	--	--------------	--

Pessoal

Função	Quant.
Engenheiro	1
Encarregado	1
Pedreiro	3
Servente	7
Carpinteiro/Armador	
Alcoveiro	

Equipamento

Descrição	Quant.
Caminhão Toco	1
Compactador sapo	2
Retro escavadeira	1

Serviços Realizados

- *EXECUÇÃO DE ESCAÇÃO DO PV-37 AO PV 38
- *COLOCAÇÃO DE TUBO DE 500MM
- *EMBASAMENTO DE TUBULAÇÃO
- *REATERRO MANUAL DE VALA E COMPACTAÇÃO
- *EXECUÇÃO DE PV

COMENTÁRIOS DO FISCAL:

COMENTÁRIOS DA EMPRESA:

RESP. PELA EMPRESA

João Pedro Souza
Engenheiro Civil
CREA-RJ: 198310003

ENG. FISCAL

João Pedro Souza
Gerente de Saneamento
Mat.:13800

DIAS CORRIDO 58

Armação dos Búzios

CONTRATO Nº

010/2018

OBRA:

12-jun-18

Terça-Feira

OBRA DE PAV. E DRENAGEM DA RUA CANTO DO CÉU E RUA MORRO DAS EMERÊNCIAS (PARTE) NO BAIRRO JOSÉ GOLÇALVES

TEMPO CLIMA

BOM	X	INSTÁVEL		CHUVOSO		IMPRATICÁVEL	
-----	---	----------	--	---------	--	--------------	--

Pessoal

Função	Quant.
Engenheiro	1
Encarregado	1
Pedreiro	3
Servente	7
Carpinteiro/Armador	
Alceteiro	

Equipamento

Descrição	Quant.
Caminhão Toco	1
Compactador sapo	2
Retro escavadeira	1

Serviços Realizados

- *EXECUÇÃO DE ESCAÇÃO DO PV-38 AO PV 39
- *COLOCAÇÃO DE TUBO DE 500MM
- *EMBASAMENTO DE TUBULAÇÃO
- *REATERRO MANUAL DE VALA E COMPACTAÇÃO

COMENTÁRIOS DO FISCAL:

COMENTÁRIOS DA EMPRESA:

 RESP. PELA EMPRESA *João Roberto Marques Cruz*
 Engenheiro Civil
 CRETA-RJ: 13940000

ENG. FISCAL

João Pedro Souza
 Gerente de Saneamento
 Mat: 13800

Armação dos Búzios

 DIAS CORRIDO 59
 CONTRATO Nº 010/2018

OBRA: 13-jun-18 Quarta-Feira

OBRA DE PAV. E DRENAGEM DA RUA CANTO DO CÉU E RUA MORRO DAS EMERÊNCIAS (PARTE) NO BAIRRO JOSÉ GOLÇALVES

TEMPO CLIMA

BOM	X	INSTÁVEL		CHUVOSO		IMPRATICÁVEL	
-----	---	----------	--	---------	--	--------------	--

Pessoal	
Função	Quant.
Engenheiro	1
Encarregado	1
Pedreiro	3
Servente	7
Carpinteiro/Armador	
Alceteiro	

Equipamento	
Descrição	Quant.
Caminhão Toco	1
Compactador sapo	2
Retro escavadeira	1

Serviços Realizados

- *EXECUÇÃO DE ESCAÇÃO DO PV-38 AO PV 39
- *COLOCAÇÃO DE TUBO DE 500MM
- *EMBASAMENTO DE TUBULAÇÃO
- *REATERRO MANUAL DE VALA E COMPACTAÇÃO
- *EXECUÇÃO DE PV

COMENTÁRIOS DO FISCAL:

COMENTÁRIOS DA EMPRESA:

 RESP. PELA EMPRESA: *Engenheiro Civil*
 CREA-RJ: 119070083

ENG. FISCAL

João Pedro Souza
 Gerente de Saneamento
 Mat.: 13800

DIAS CORRIDO 60

Armação dos Búzios

CONTRATO Nº

010/2018

OBRA:

14-jun-18

Quinta-Feira

OBRA DE PAV. E DRENAGEM DA RUA CANTO DO CÉU E RUA MORRO DAS EMERÊNCIAS (PARTE) NO BAIRRO

TEMPO CLIMA

BOM	X	INSTÁVEL		CHUVOSO		IMPRATICÁVEL	
-----	---	----------	--	---------	--	--------------	--

Pessoal	
Função	Quant.
Engenheiro	1
Encarregado	1
Pedreiro	3
Servente	7
Carpinteiro/Armador	
Calceteiro	

Equipamento	
Descrição	Quant.
Caminhão Toco	1
Compactador sapo	2
Retro escavadeira	1

Serviços Realizados

- *EXECUÇÃO DE ESCAÇÃO DO PV-39 AO PV 40
- *COLOCAÇÃO DE TUBO DE 500MM
- *EMBASAMENTO DE TUBULAÇÃO
- *REATERRO MANUAL DE VALA E COMPACTAÇÃO
- *EXECUÇÃO DE PV

COMENTÁRIOS DO FISCAL:

COMENTÁRIOS DA EMPRESA:

RESP. PELA EMPRESA

João Roberto Marques Cruz

 Engenheiro Civil
 CREA-RJ: 190820083

ENG. FISCAL

 João Pedro Souza
 Gerente de Saneamento
 Mat.: 13800

Armação dos Búzios

CONTRATO Nº

010/2018

OBRA:

15-jun-18

Sexta-Feira

OBRA DE PAV. E DRENAGEM DA RUA CANTO DO CÉU E RUA MORRO DAS EMERÊNCIAS (PARTE) NO BAIRRO

TEMPO CLIMA

BOM	X	INSTÁVEL		CHUVOSO		IMPRATICÁVEL	
-----	---	----------	--	---------	--	--------------	--

Pessoal	
Função	Quant.
Engenheiro	1
Encarregado	1
Pedreiro	3
Servente	7
Carpinteiro/Armador	
Calceteiro	

Equipamento	
Descrição	Quant.
Caminhão Toco	1
Compactador sapo	2
Retro escavadeira	1

Serviços Realizados

EXECUÇÃO DE ESCAÇÃO DO PV-39 AO PV 40

*COLOCAÇÃO DE TUBO DE 500MM

*EMBASAMENTO DE TUBULAÇÃO

*REATERRO MANUAL DE VALA E COMPACTAÇÃO

*EXECUÇÃO DE PV

COMENTÁRIOS DO FISCAL:

COMENTÁRIOS DA EMPRESA:

RESP. PELA EMPRESA

 João Roberto Marques Cruz
 Engenheiro Civil
 CREA RJ: 160810053

ENG. FISCAL

 João Pedro Souza
 Gerente de Saneamento
 Mat.:13800

Armação dos Búzios

CONTRATO Nº

010/2018

OBRA

16-jun-18

17-jun-18

Sábado Domingo

 OBRA DE PAV. E DRENAGEM DA RUA CANTO DO CÉU E RUA MORRO DAS EMERÊNCIAS (PARTE) NO
 BAIRRO JOSÉ GOLÇALVES

TEMPO CLIMA

BOM		INSTÁVEL		CHUVOSO		IMPRATICÁVEL	
-----	--	----------	--	---------	--	--------------	--

Pessoal	
Função	Quant.
Engenheiro	
Encarregado	
Pedreiro	
Servente	
Carpinteiro/Armador	
Calceteiro	

Equipamento	
Descrição	Quant.
Caminhão Toco	
Compactador sapo	
Retro escavadeira	

Serviços Realizados

COMENTÁRIOS DO FISCAL:

COMENTÁRIOS DA EMPRESA:

 RESP. PELA EMPRESA **João Roberto Mendes Cruz**
 Engenheiro Civil
 CREA-RJ: 109010083

ENG. FISCAL

João Pedro Souza
 Gerente de Saneamento
 Mat.: 13800

DIAS CORRIDO 64

Armação dos Búzios

CONTRATO Nº

010/2018

OBRA:

18-jun-18

Segunda-Feira

 OBRA DE PAV. E DRENAGEM DA RUA CANTO DO CÉU E RUA MORRO DAS EMERÊNCIAS (PARTE) NO
 BAIRRO JOSÉ GOLÇALVES

TEMPO CLIMA

BOM	X	INSTÁVEL		CHUVOSO		IMPRATICÁVEL	
-----	---	----------	--	---------	--	--------------	--

Pessoal	
Função	Quant.
Engenheiro	1
Encarregado	1
Pedreiro	3
Servente	7
Carpinteiro/Armador	
Calceteiro	

Equipamento	
Descrição	Quant.
Caminhão Toco	1
Compactador sapo	2
Retro escavadeira	1

Serviços Realizados

- *EXECUÇÃO DE ESCAÇÃO DO PV-40 AO PV 41
- *COLOCAÇÃO DE TUBO DE 500MM
- *EMBASAMENTO DE TUBULAÇÃO
- *REATERRO MANUAL DE VALA E COMPACTAÇÃO
- *EXECUÇÃO DE PV

COMENTÁRIOS DO FISCAL:

COMENTÁRIOS DA EMPRESA:

RESP. PELA EMPRESA

 José Roberto Marques Cruz
 Engenheiro Civil
 CREA-RJ 192019083

ENG. FISCAL

 João Pedro Souza
 Engenheiro de Saneamento
 Mat.: 13800

Armação dos Búzios

CONTRATO Nº

010/2018

OBRA:

19-jun-18

Terça-Feira

OBRA DE PAV. E DRENAGEM DA RUA CANTO DO CÉU E RUA MORRO DAS EMERÊNCIAS (PARTE) NO BAIRRO JOSÉ GOLÇALVES

TEMPO CLIMA

BOM	X	INSTÁVEL		CHUVOSO		IMPRATICÁVEL	
-----	---	----------	--	---------	--	--------------	--

Pessoal	
Função	Quant.
Engenheiro	1
Encarregado	1
Pedreiro	3
Servente	7
Carpinteiro/Armador	
Calceteiro	

Equipamento	
Descrição	Quant.
Caminhão Toco	1
Compactador sapo	2
Retro escavadeira	1

Serviços Realizados

- *EXECUÇÃO DE ESCAÇÃO DO PV-41 AO PV 42
- *COLOCAÇÃO DE TUBO DE 500MM
- *EMBASAMENTO DE TUBULAÇÃO
- *REATERRO MANUAL DE VALA E COMPACTAÇÃO
- *EXECUÇÃO DE PV

COMENTÁRIOS DO FISCAL:
COMENTÁRIOS DA EMPRESA:

RESP. PELA EMPRESA

 José Roberto Marques Cruz
 Engenheiro Civil
 CREA RJ 15819032

ENG. FISCAL

 João Pedro Souza
 Engenheiro de Saneamento
 Mat: 13800

Armação dos Búzios

CONTRATO Nº

010/2018

OBRA:

20-jun-18

Quarta-Feira

OBRA DE PAV. E DRENAGEM DA RUA CANTO DO CÉU E RUA MORRO DAS EMERÊNCIAS (PARTE) NO
BAIRRO JOSÉ GOLÇALVES

TEMPO CLIMA

BOM	X	INSTÁVEL		CHUVOSO		IMPRATICÁVEL	
-----	---	----------	--	---------	--	--------------	--

Pessoal

Função	Quant.
Engenheiro	1
Encarregado	1
Pedreiro	3
Servente	7
Carpinteiro/Armador	
Calceteiro	

Equipamento

Descrição	Quant.
Caminhão Toco	1
Compactador sapo	2
Retro escavadeira	1

Serviços Realizados

- *EXECUÇÃO DE ESCAÇÃO DO PV-42 AO PV 43
- *COLOCAÇÃO DE TUBO DE 500MM
- *EMBASAMENTO DE TUBULAÇÃO
- *REATERRO MANUAL DE VALA E COMPACTAÇÃO
- *EXECUÇÃO DE PV

COMENTÁRIOS DO FISCAL:

COMENTÁRIOS DA EMPRESA:

RESP. PELA EMPRESA **Roberto Marques Cruz**
Engenheiro Civil
CREA-RJ: 159019053

ENG. FISCAL

João Pedro Souza
Engenheiro de Sanesamento
Mat.: 13808

DIAS CORRIDO 67

Armação dos Búzios

CONTRATO Nº

010/2018

OBRA:

21-jun-18

Quinta-Feira

OBRA DE PAV. E DRENAGEM DA RUA CANTO DO CÉU E RUA MORRO DAS EMERÊNCIAS (PARTE) NO
BAIRRO JOSÉ GOLÇALVES

TEMPO CLIMA

BOM	X	INSTÁVEL		CHUVOSO		IMPRATICÁVEL	
-----	---	----------	--	---------	--	--------------	--

Pessoal

Função	Quant.
Engenheiro	1
Encarregado	1
Pedreiro	3
Servente	7
Carpinteiro/Armador	
Calçeteiro	

Equipamento

Descrição	Quant.
Caminhão Toco	1
Compactador sapo	2
Retro escavadeira	1

Serviços Realizados

- *EXECUÇÃO DE ESCAÇÃO DO PV-12 AO PV 11
- *COLOCAÇÃO DE TUBO DE 600MM
- *EMBASAMENTO DE TUBULAÇÃO
- *REATERRO MANUAL DE VALA E COMPACTAÇÃO
- *EXECUÇÃO DE PV
- *EXECUÇÃO DE ESCAVAÇÃO MANUAL DE RAMAL E CAIXA RALO

COMENTÁRIOS DO FISCAL:

COMENTÁRIOS DA EMPRESA:

RESP. PELA EMPRESA

José Roberto Marques Cruz
Engenheiro Civil
CREA-RJ: 199010083

ENG. FISCAL

João Pedro Souza
Gerente de Saneamento
Mat.: 13800

Armação dos Búzios

DIAS CORRIDO 68

CONTRATO Nº

010/2018

OBRA:

22-jun-18

Sexta-Feira

 OBRA DE PAV. E DRENAGEM DA RUA CANTO DO CÉU E RUA MORRO DAS EMERÊNCIAS (PARTE) NO
 BAIRRO JOSÉ GOLÇALVES

TEMPO CLIMA

BOM	X	INSTÁVEL		CHUVOSO		IMPRATICÁVEL	
-----	---	----------	--	---------	--	--------------	--

Pessoal

Função	Quant.
Engenheiro	1
Encarregado	1
Pedreiro	3
Servente	7
Carpinteiro/Armador	
Calceteiro	

Equipamento

Descrição	Quant.
Caminhão Toco	1
Compactador sapo	2
Retro escavadeira	1

Serviços Realizados

- *EXECUÇÃO DE ESCAÇÃO DO PV-11 AO PV 10
- *COLOCAÇÃO DE TUBO DE 600MM
- *EMBASAMENTO DE TUBULAÇÃO
- *REATERRO MANUAL DE VALA E COMPACTAÇÃO
- *EXECUÇÃO DE PV
- *EXECUÇÃO DE ESCAVAÇÃO MANUAL DE RAMAL E CAIXA RALO

COMENTÁRIOS DO FISCAL:

COMENTÁRIOS DA EMPRESA:

 RESP. PELA EMPRESA **José Roberto Marques Cruz**
 Engenheiro Civil
 CREA RJ: 19864/0003

ENG. FISCAL


João Pedro Souza
 Gerente de Saneamento
 Mat.: 13800



DAFLA
CONSTRUÇÃO | SERVIÇOS | GERENCIAMENTO

Diário de Obras

DIAS CORRIDO 69 70

Armação dos Búzios

CONTRATO Nº 010/2018

OBRA 23-jun-18 24-jun-18 Sábado Domingo

OBRA DE PAV. E DRENAGEM DA RUA CANTO DO CÉU E RUA MORRO DAS EMERÊNCIAS (PARTE) NO
BAIRRO JOSÉ GOLÇALVES

TEMPO CLIMA

BOM		INSTÁVEL		CHUVOSO		IMPRATICÁVEL	
-----	--	----------	--	---------	--	--------------	--

Pessoal

Função	Quant.
Engenheiro	
Encarregado	
Pedreiro	
Servente	
Carpinteiro/Armador	
Calceteiro	

Equipamento

Descrição	Quant.
Caminhão Toco	
Compactador sapo	
Retro escavadeira	

Serviços Realizados

COMENTÁRIOS DO FISCAL:

COMENTÁRIOS DA EMPRESA:

RESP. PELA EMPRESA José Roberto Marques Cruz
Engenheiro Civil
CREA-RJ: 193018063

ENG. FISCAL

João Pedro Souza
Gerente de Sanatamento
Mat.: 13800

DIAS CORRIDO 71

Armação dos Búzios

CONTRATO Nº

010/2018

OBRA:

25-jun-18

Segunda-Feira

OBRA DE PAV. E DRENAGEM DA RUA CANTO DO CÉU E RUA MORRO DAS EMERÊNCIAS (PARTE) NO BAIRRO JOSÉ GOLÇALVES

TEMPO CLIMA

BOM	X	INSTÁVEL		CHUVOSO		IMPRATICÁVEL	
-----	---	----------	--	---------	--	--------------	--

Pessoal	
Função	Quant.
Engenheiro	1
Encarregado	1
Pedreiro	3
Servente	7
Carpinteiro/Armador	
Calceteiro	

Equipamento	
Descrição	Quant.
Caminhão Toco	1
Compactador sapo	2
Retro escavadeira	1

Serviços Realizados

*EXECUÇÃO DE ESCAÇÃO DO PV-10 AO PV 08

*COLOCAÇÃO DE TUBO DE 600MM

*EMBASAMENTO DE TUBULAÇÃO

*REATERRO MANUAL DE VALA E COMPACTAÇÃO

*EXECUÇÃO DE PV

*PREPARO DO TERRENO PARA RECOMPOSIÇÃO DO PARALELO


*EXECUÇÃO DE SUB-BASE

COMENTÁRIOS DO FISCAL:

COMENTÁRIOS DA EMPRESA:

 RESP. PELA EMPRESA: **Roberto Matheus Cruz**
 Engenheiro Civil
 CREA-RJ: 199010083

ENG. FISCAL


João Pedro Souza
 Gerente de Saneamento
 Mat.: 13800

DIAS CORRIDO 72

Armação dos Búzios

CONTRATO Nº

010/2018

OBRA:

26-jun-18

Terça-Feira

OBRA DE PAV. E DRENAGEM DA RUA CANTO DO CÉU E RUA MORRO DAS EMERÊNCIAS (PARTE) NO BAIRRO
JOSÉ GOLÇALVES

TEMPO CLIMA

BOM	X	INSTÁVEL		CHUVOSO		IMPRATICÁVEL	
-----	---	----------	--	---------	--	--------------	--

Pessoal

Função	Quant.
Engenheiro	1
Encarregado	1
Pedreiro	3
Servente	7
Carpinteiro/Armador	
Calceteiro	

Equipamento

Descrição	Quant.
Caminhão Toco	1
Compactador sapo	2
Retro escavadeira	1

Serviços Realizados


- *EXECUÇÃO DE ESCAÇÃO DO PV-08 AO PV 09 E DO PV 08 AO PV 07
- *COLOCAÇÃO DE TUBO DE 500MM
- *EMBASAMENTO DE TUBULAÇÃO
- *REATERRO MANUAL DE VALA E COMPACTAÇÃO
- *EXECUÇÃO DE PV
- *PREPARO DO TERRENO PARA RECOMPOSIÇÃO DO PARALELO
- *EXECUÇÃO DE SUB-BASE

COMENTÁRIOS DO FISCAL:

COMENTÁRIOS DA EMPRESA:

RESP. PELA EMPRESA José Roberto Rozas Cruz
Engenheiro Civil
CREA-RJ: 199019883

ENG. FISCAL


João Pedro Souza
Gerente de Saneamento
Mat.:13800

DIAS CORRIDO 73

Armação dos Búzios

CONTRATO Nº

010/2018

OBRA:

27-jun-18

Quarta-Feira

OBRA DE PAV. E DRENAGEM DA RUA CANTO DO CÉU E RUA MORRO DAS EMERÊNCIAS (PARTE) NO BAIRRO
JOSÉ GOLÇALVES

TEMPO CLIMA

BOM	X	INSTÁVEL		CHUVOSO		IMPRATICÁVEL	
-----	---	----------	--	---------	--	--------------	--

Pessoal

Função	Quant.
Engenheiro	1
Encarregado	1
Pedreiro	3
Servente	7
Carpinteiro/Armador	
Calceteiro	

Equipamento

Descrição	Quant.
Caminhão Toco	1
Compactador sapo	2
Retro escavadeira	1

Serviços Realizados

- *EXECUÇÃO DE ESCAÇÃO DO PV-07 AO PV 06 E DO PV 06 AO PV 05
- *COLOCAÇÃO DE TUBO DE 500MM
- *EMBASAMENTO DE TUBULAÇÃO
- *REATERRO MANUAL DE VALA E COMPACTAÇÃO
- *RECOMPOSIÇÃO DO PARALELO

COMENTÁRIOS DO FISCAL:

COMENTÁRIOS DA EMPRESA:

RESP. PELA EMPRESA

João Roberto de Aguiar Silva
Engenheiro Civil
CREA RJ: 09019987

ENG. FISCAL

João Pedro Souza
Gerente de Saneamento
Mat.: 13800



DAFLA
CONSTRUÇÃO | SERVIÇOS | GERENCIAMENTO

Diário de Obras

DIAS CORRIDO 74

Armação dos Búzios

CONTRATO Nº

010/2018

OBRA:

28-jun-18

Quinta-Feira

OBRA DE PAV. E DRENAGEM DA RUA CANTO DO CÉU E RUA MORRO DAS EMERÊNCIAS (PARTE) NO BAIRRO

TEMPO CLIMA

BOM	X	INSTÁVEL		CHUVOSO		IMPRATICÁVEL	
-----	---	----------	--	---------	--	--------------	--

Pessoal

Função	Quant.
Engenheiro	1
Encarregado	1
Pedreiro	3
Servente	7
Carpinteiro/Armador	
Calceteiro	

Equipamento

Descrição	Quant.
Caminhão Toco	1
Compactador sapo	2
Retro escavadeira	1

Serviços Realizados

- *EXECUÇÃO DE ESCAÇÃO
- *COLOCAÇÃO DE TUBO DE 800MM
- *EMBASAMENTO DE TUBULAÇÃO
- *REATERRO MANUAL DE VALA E COMPACTAÇÃO
- *RECOMPOSIÇÃO DO PARALELO

COMENTÁRIOS DO FISCAL:

COMENTÁRIOS DA EMPRESA:

RESP. PELA EMPRESA: Roberto Matias Cruz
Engenheiro Civil
CREA-RJ: 196010983

ENG. FISCAL

João Pedro Souza
Engenheiro de Saneamento
Mat.: 13800

Armação dos Búzios

DIAS CORRIDO 75

CONTRATO Nº

010/2018

OBRA:

29-jun-18

Sexta-Feira

OBRA DE PAV. E DRENAGEM DA RUA CANTO DO CÉU E RUA MORRO DAS EMERÊNCIAS (PARTE) NO BAIRRO

TEMPO CLIMA

BOM	X	INSTÁVEL		CHUVOSO		IMPRATICÁVEL	
-----	---	----------	--	---------	--	--------------	--

Pessoal	
Função	Quant.
Engenheiro	1
Encarregado	1
Pedreiro	3
Servente	7
Carpinteiro/Armador	
Calceteiro	

Equipamento	
Descrição	Quant.
Caminhão Toco	1
Compactador sapo	2
Retro escavadeira	1

Serviços Realizados

EXECUÇÃO DE ESCAÇÃO

*COLOCAÇÃO DE TUBO DE 800MM

*EMBASAMENTO DE TUBULAÇÃO

*REATERRO MANUAL DE VALA E COMPACTAÇÃO

*RECOMPOSIÇÃO DO PARALELO

COMENTÁRIOS DO FISCAL:

COMENTÁRIOS DA EMPRESA:

RESP. PELA EMPRESA

José Roberto Marques Cruz

Engenheiro

ENG. FISCAL


João Pedro Souza
 Gerente de Saneamento
 Mat: 13800



DAFLA
CONSTRUÇÃO | SERVIÇOS | GERENCIAMENTO

Diário de Obras

DIAS CORRIDO 76 77

Armação dos Búzios

CONTRATO Nº

010/2018

OBRA

30-jun-18

01-jul-18

Sábado Domingo

OBRA DE PAV. E DRENAGEM DA RUA CANTO DO CÉU E RUA MORRO DAS EMERÊNCIAS (PARTE) NO BAIRRO

TEMPO CLIMA

BOM		INSTÁVEL		CHUVOSO		IMPRATICÁVEL	
-----	--	----------	--	---------	--	--------------	--

Pessoal	
Função	Quant.
Engenheiro	
Encarregado	
Pedreiro	
Servente	
Carpinteiro/Armador	
Calceteiro	

Equipamento	
Descrição	Quant.
Caminhão Toco	
Compactador sapo	
Retro escavadeira	

Serviços Realizados

COMENTÁRIOS DO FISCAL:

COMENTÁRIOS DA EMPRESA:

RESP. PELA EMPRESA

João Pedro Souza
Engenheiro Civil
CREA RJ 100412004

ENG. FISCAL

João Pedro Souza
engenheiro de Saneamento
Mat.: 13800

Armação dos Búzios

DIAS CORRIDO 78

CONTRATO Nº

010/2018

OBRA:

02-jul-18

Segunda-Feira

OBRA DE PAV. E DRENAGEM DA RUA CANTO DO CÉU E RUA MORRO DAS EMERÊNCIAS (PARTE) NO BAIRRO

TEMPO CLIMA

BOM	X	INSTÁVEL		CHUVOSO		IMPRATICÁVEL	
-----	---	----------	--	---------	--	--------------	--

Pessoal	
Função	Quant.
Engenheiro	1
Encarregado	1
Pedreiro	3
Servente	7
Carpinteiro/Armador	
Calceteiro	

Equipamento	
Descrição	Quant.
Caminhão Toco	1
Compactador sapo	2
Retro escavadeira	1

Serviços Realizados

EXECUÇÃO DE ESCAÇÃO DO PV-14 AO PV 13

COLOCAÇÃO DE TUBO DE 600MM

*EMBASAMENTO DE TUBULAÇÃO

*REATERRO MANUAL DE VALA E COMPACTAÇÃO

*EXECUÇÃO DE PV

COMENTÁRIOS DO FISCAL:


COMENTÁRIOS DA EMPRESA:

RESP. PELA EMPRESA

Jose Roberto Marques Cruz
Engenheiro Civil
CREA-RJ: 129919083

ENG. FISCAL

João Pedro Souza
Gerente de Saneamento
Mat.: 13800



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO

Processo N°:6445/2018 | Folha: 158

EXAME

CONTRATO: 10/2018

CONTRATADO: DAFLA CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E GERENCIAMENTO
LTDA-EPP

OBJETO: Pavimentação e Drenagem da Rua Canto do Céu e Rua Morro das
Emergências (Parte)

VALOR TOTAL DA OBRA: R\$ 1.447.850,10


VALOR DA 2ª MEDIÇÃO: R\$ 192.212,70

PERÍODO DA MEDIÇÃO: 25/05/2018 à 24/06/2018

TÉRMINO: 08/04/2019

ITEM	DESCRIÇÃO	CUMPRIMENTO		
		SIM	N.A.	FLS.
1	Foi apresentada Carta da Empresa?	-	X	-
2	Foi apresentado o Atestado de Execução do Contrato?	X	-	99
3	Existe vigência contratual para o período em questão?	X	-	66 à 83
4	Há Portaria de Nomeação Fiscal, caso tenha-se feito necessário?	X	-	07
5	Foi apresentada Nota Fiscal?	X	-	100
6	A Nota Fiscal está devidamente atestada por dois funcionários, sendo um deles o fiscal do contrato?	X	-	100
7	Foi apresentada Planilha de Medição a qual se refere?	X	-	101 à 106
8	Foi apresentada Memória de Cálculo?	X	-	107 à 117
9	Foi apresentado o Cronograma Físico-Financeiro?	X	-	118
10	Foi apresentado Relatório Fotográfico?	X	-	119 à 123
11	Foram apresentadas as certidões da empresa?	X	-	124 à 126
12	Foi anexado o Diário de Obra devidamente preenchido?	X	-	127 à 157
13	Foi anexada a cópia da Nota de Empenho?	X	-	85

Encaminham-se os autos para análise inicial do Patrimônio, Gerência de Fiscalização e posteriormente seja remetida à Liquidação para que sejam tomadas as devidas providências quanto ao pagamento por parte da Prefeitura Municipal de Armação dos Búzios.


Nicole Speroni Gomes

Supervisora

Nicole Speroni Gomes
SEC. DE OBRAS E SANEAMENTO
Supervisora
Mat. 16.626



PREFEITURA DA CIDADE DE ARMACAO DOS BUZIOS

24/07/2018 14:43:11

Estrada da Usina, 600
Centro
Armação dos Búzios
RJ

Detalhe do Bem

Código:	Nome:
---------	-------

66665 MORRO DAS EMERÊNCIAS - RECUPERAÇÃO DA ESTRADA

Nº da Plaqueta:	051298	Data da Posse:	15/06/2018
Nº de Nota Fiscal:	201800000000004	Valor Incorporado:	134.842,88
Nº do Empenho:	258/2018	Nº do Processo:	6445/2018
Fornecedor	DAFLA CONSTRUCAO SERVICOS E GERENC	Nº da Licitação:	005/2017

Unidade Gestora

Prefeitura Municipal de Armação dos Búzios

Centro de Custo

SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SANEAMENTO

Local SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO

Ano de Contas	Grupo	Situação
301030202 BENS IMÓVEIS DE INFRA ESTRUTURA/	201	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM
		IMÓVEL

1ª MEDIÇÃO: Serviço de Recuperação da Estrada Morro das Emerências. Processo de Origem nº 00611/2017. Processo de Pagamento nº 06445/2018. Empenhos nº 000257 e 000258/2018. Nota Fiscal nº 201800000000004

Reavaliações

Data:	Valor:	Observação:	Nota fiscal	Fornecedores
Processo: 6445		Ano do Processo: 2018		
Empenho: 258		Ano do Empenho: 2018		
24/07/2018	192.212,70	2ª MEDIÇÃO: Serviço de Recuperação da Estrada Morro das Emerências. Processo de Origem nº 00611/2017. Processo de Pagamento nº 06445/2018. Empenhos nº 000257 e 000258/2018. Nota Fiscal nº 201800000000008	201800000000	DAFLA CONSTRUCAO SERVICOS

Soma das Reavaliações: 192.212,70

Características Veículos

Placa:	Chassi:	Espécie - Tipo:
Combustível:	Ano Fabricação:	Renavam:
Ano - Modelo:	Cor Predominante:	

PRESTADOR CÓDIGO: 890913	PRESTADORA EMPRESA: DAFLA CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E GERENCIAMENTI		
TOMADORA CÓDIGO: 34881	TOMADORA EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARMACÃO DOS BUZIOS		
TIPO / NOME LOGRADOURO: EST USINA VELHA	NÚMERO: 600		
COMPLEMENTO:	BAIRRO: CENTRO		
MUNICÍPIO: Armação dos Búzios	UF: RJ		
Nº DAM 16238252	Nº Lançamento 1894666		
BASE DE CÁLCULO: 192.212,70	ALÍQUOTA: 5,00 %	VALOR DO IMPOSTO: 9.610,64	VALOR TOTAL: 9.610,64
PARCELA: 1/1	MES REFERÊNCIA: JULHO	EXERCÍCIO: 2018	DATA DE VENCIMENTO: 10/08/2018
OBSERVAÇÕES: PROCESSO: 6445/2018 - NOTA FISCAL Nº. 0008/2018 - RECIBO			

Data de Emissão 31/07/2018 14:31:41 Emitido por: marcelo

160
8


PARCELA: 1/1		VENCIMENTO: 10/08/2018
INSCRIÇÃO:	EMPRESA: DAFLA CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E GERENCIA	Nº DAM: 16238252
INSTRUÇÕES:		
(+) VALOR DEVIDO - R\$	9.610,64	
(-) VALOR DESCONTO - R\$	0,00	
(+) CORREÇ. MONET. - R\$	0,00	
(+) MULTA DE MORA - R\$	0,00	
(+) JUROS DE MORA - R\$	0,00	
(+) TAXA EMIS. GUIA - R\$	0,00	
(=) VALOR A PAGAR - R\$	\$9.610,64	

81640000096.3 10644849201.2 80810000000.5 01623825205.6



Data de Emissão 31/07/2018 14:31:41 Emitido por: marcelo

ISS RETIDO PELA PREFEITURA



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO


Processo: 611/2017

Contrato Convênio N°: 831101/2016

Nota Fiscal n°: 8

Medição: 2ª

Valor total Nota Fiscal	R\$ 192.212,70	Empenho	Fonte
Repasse/Convênio	R\$ 85.157,12	258/18	123
Contrapartida	R\$ 107.055,58	493/18	175


Paulo Abranches Guedes Junior
Secretário Municipal de Obras e Saneamento

Eng. Paulo Abranches
SECRETÁRIO DE OBRAS
E SANEAMENTO
Mat. 12.974



PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

ESTRADA DA USINA 0600 - CENTRO

C.N.P.J 01.616.171/0001-02

Emissão: 24/07/2018

Página: 1

NOTA DE EMPENHO

Exercício: 2018

EMPENHO: 000493	CONTRATO: 010/2018
TIPO: GLOBAL	CONVÊNIO:
DATA DE EMISSÃO: 24/07/2018	MODALIDADE: LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA PÚBLICA
No. PROCESSO: 000/00611/17	LICITAÇÃO: 005/2017
	BASE LEGAL: 30 - Concorrência, Art. 22, Inciso I, Lei 8.666

Favorecido

NOME/R.SOCIAL: DAFLA CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E GERENCIAMENTO LTDA
CPF/CNPJ.....: 12.603.970/0001-60 R.G:
ENDEREÇO.....: ESTRADA FRANCISCO DA CRUZ NUNES NÚMERO 8180 SALA
IRRO.....: ITAIPU CIDADE: NITEROI U.F: RJ CEP: 24340000

Especificação:

CONTRATO Nº. 010/2018 DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS RUAS CANTO DO CÉU E MORRO DAS EMERÊNCIAS NO BAIRRO DE JOSÉ GONÇALVES NO EXERCÍCIO DE 2018.

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS	Saldo Anterior: 2.371.888,91
Unid.Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO	Valor: 437.850,10
Prog.Trabalho: 15.451.0028.1.232 - Sistema de drenagem dos bairros	Saldo: 1.934.038,81
Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	
Fonte: 175 - M.C.DANOS URBANÍSTICOS	

Valor do Empenho

\$ 437.850,10

(QUATROCENTOS E TRINTA E SETE MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS E DEZ CENTAVOS)

Declaramos que o valor acima foi deduzido do saldo da(s) respectiva(s) dotação(ões).

Foram conferidos os dados constantes desta nota de Empenho.

CRISTINA CABRAL COSTA
RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nota de Empenho emitida conforme autorização do Ordenador de Despesa.

PAULO ABRANCHES GUEDES JÚNIOR
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO



PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
COORDENADORIA DE LIQUIDAÇÃO

DEMONSTRATIVO DE VALORES PARA RETENÇÃO

CONTRATO: 010/2018 CONTRATADO: DAFLA CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E GERENCIAMENTO LTDA EPP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM DA RUA CANTO DO CÉU E RUA MORRO DAS EMERÊNCIAS (PARTE) NO BAIRRO JOSÉ GONÇALVES.

VALOR BRUTO: R\$ 192.212,70 PERÍODO: 25/05/2018 À 24/06/2018 TERMINO: 08/04/2019

RETENÇÃO				
TRIBUTO	ALÍQUOTA	FATOR	VALOR	FUNDAMENTO
INSS	0%	100%		Art. 112, C/c Art. 149, VII, IN 971/2009 - Para os casos de obra
IR	0,0%	100,00		Exceção ao Art. 647, §1, 17.
ISS	5%	100%	9.610,64	Despacho exarado pela GEFIS à fl. 160

OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL: NÃO

VALOR TOTAL DA RETENÇÃO: 9.610,64

VALOR LÍQUIDO A PAGAR: 182.602,06

Armação dos Búzios, 01 de agosto de 2018



PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
COORDENADORIA DE LIQUIDAÇÃO

EXAME PARA LIQUIDAÇÃO

CONTRATO: 010/2018 **CONTRATADO:** DAFLA CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E GERENCIAMENTO LTDA EPP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM DA RUA CANTO DO CÉU E RUA MORRO DAS EMERÊNCIAS (PARTE) NO BAIRRO JOSÉ GONÇALVES.

VALOR BRUTO: R\$ 192.212,70 **PERÍODO:** 25/05/2018 À 24/06/2018 **TERMINO:** 08/04/2019

ITEM	DESCRIÇÃO	CUMPRIMENTO		
		SIM	N.A	FLS
1	Foi apresentada relatório/medição do serviço?	X		101
2	Foi apresentada relatório do fiscal do contrato?	X		99
3	Os itens, quantidades e preços unitários estão de acordo com a proposta e com o cronograma físico financeiro ou cronograma de execução?	X		22
4	Em caso de registro de preço, foi verificado o saldo de ata?		X	-
5	Existe vigência contratual para o período em questão?	X		66
6	Há manifestação do setor de patrimônio quando se trata de bens permanentes ou obras	X		159
7	Há manifestação do setor de contabilidade quando se trata de bens permanentes ou obras		X	-
8	A nota fiscal está dentro da validade, sem rasuras, e foi verificada sua autenticidade?	X		100
9	A natureza da operação está de acordo com o tipo de documento fiscal emitido	X		100
10	A nota fiscal está atestada por 2 funcionários sendo um deles o fiscal do contrato	X		100
11	Se convênio, foi observado a indicação do mesmo na nota fiscal		X	-
12	a nota de empenho está assinada e preenchida corretamente	X		85/162
13	a fonte orçamentária está de acordo com a legislação em vigor	X		85/162
14	observou-se a retenção dos tributos (IRRF, ISSQN, INSS)	X		163
15	foi apresentada a regularidade perante o INSS e FGTS	X		125/126
16	o endereço e CNPJ das certidões é o mesmo da nota fiscal	X		100
17	Verificou-se GEFIP, bem como pagamento da GPS E GRF se o serviço envolve mão de obra?		X	-
18	Há saldo de empenho para quitação da despesa?	X		85/162
19	Há designação do gerente fiscal do contrato?	X		7
20	A nota está direcionada ao fundo competente?	X		100

ARECER CONCLUSIVO

Sr(a) Secretário(a),


Em análise da documentação acostada ao presente, não encontra esta coordenadoria de liquidação qualquer óbice para liquidação da despesa. Sugerindo desta forma a remessa à Coordenadoria do Tesouro para análise e emissão da ordem de pagamento.

Armação dos Búzios, 01 de agosto de 2018

VICTOR AGUIAR DA SILVA
 Coordenador de Liquidação

De acordo, à Coordenadoria do Tesouro, autorizo o prosseguimento na liquidação da despesa e emissão da ordem de pagamento conforme informado acima.

PAULO ABRANCHES GUEDES JÚNIOR
 Secretário Municipal de Obras e Saneamento
 Ordenador da Despesa



PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

ESTRADA DA USINA 0600 - CENTRO

C.N.P.J 01.616.171/0001-02

Emissão: 03/08/2018

Hora: 14:15

Página: 1

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2018

Processo....: 000/06445/18 de 30/05/2018

No.Ord.Pagamento: 181821

Autoriza o pagamento ao favorecido, na importância abaixo:

Valor Total.: R\$ 85.157,12

(OITENTA E CINCO MIL E CENTO E CINQUENTA E SETE REAIS E DOZE CENTAVOS)

Credor.....: DAFIA CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E GERENCIAMENTO LTDA - Código: 9658

CPF/CNPJ: 12.603.970/0001-60

Endereço: ESTRADA FRANCISCO DA CRUZ NUNES NÚMERO 8180 SALA 210

Bairro: ITAIPU

U.F: RJ

CEP: 24340000

Especificação

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A RECUPERAÇÃO DA
ESTRADA DO MORRO DAS EMERÊNCIAS CONFORME CONVÊNIO SICONV 831101/2016
REFERENTE AO PERÍODO DE 25/05 A 24/06/18 (2ª MEDIÇÃO) CONFORME NF.
20180000000008 À FL. 100.

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

No.Empenho.....: 000258

Órgão/Unid.Orç....: 02.0107 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO

Prog. Trabalho....: 15.451.0028.1.304 - RECUPERAÇÃO DA ESTRADA MORRO DAS EMERÊNCIAS.

Despesa.....: 4490.5100 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte.....: 123 - CONVÊNIO

Valor da Dotação.: 85.157,12

Valor Empenhado: 1.000.000,00

Valor Liquidado:

210.000,00

Valor a Liquidar:

790.000,00

A Liquidação da despesa contraída pela nota de empenho acima citada foi realizada pela coordenadoria de liquidação através do laudo de conferência.

ARMAÇÃO DOS BÚZIOS, 03 de AGOSTO de 2018.

ANA PAULA FIGUEIREDO NOGUEIRA
GERENTE DE ORDEM DE PAGAMENTO

Face a Liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou ao seu procurador conforme Artigo 64 da Lei 4.320/64.

PAULO ABRANCHES GUEDES JÚNIOR
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO



PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

ESTRADA DA USINA 0600 - CENTRO

C.N.P.J 01.616.171/0001-02

166
C

Emissão: 03/08/2018

Hora: 14:18

Página: 1

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2018

Processo....: 000/06445/18 de 30/05/2018 No.Ord.Pagamento: 181822

Autoriza o pagamento ao favorecido, na importância abaixo:

Valor Total.: R\$ 107.055,58
(CENTO E SETE MIL E CINQUENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS)

Credor.....: DAFIA CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E GERENCIAMENTO LTDA - Código: 9658
CPF/CNPJ: 12.603.970/0001-60
Endereço: ESTRADA FRANCISCO DA CRUZ NUNES NÚMERO 8180 SALA 210
Bairro: ITAIPU U.F: RJ CEP: 24340000

Especificação CONTRATO N°. 010/2018 DA OBRA DE
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS RUAS CANTO DO CÉU E MORRO DAS EMERÊNCIAS NO
BAIRRO DE JOSÉ GONÇALVES REFERENTE AO PERÍODO DE 25/05 A 24/06/18 (2ª
MEDIÇÃO) CONFORME NF. 20180000000008 À FL. 100.

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

No.Empenho.....: 000493
Órgão/Unid.Orç....: 02.0107 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO
Prog. Trabalho....: 15.451.0028.1.232 - Sistema de drenagem dos bairros
Despesa.....: 4490.5100 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte.....: 175 - M,C.DANOS URBANÍSTICOS
Valor da Dotação.: 107.055,58

Valor Empenhado:	437.850,10	Valor Liquidado:	107.055,58	Valor a Liquidar:	330.794,52
------------------	------------	------------------	------------	-------------------	------------

A Liquidação da despesa contraída pela nota de empenho acima citada foi realizada pela coordenadoria de liquidação através do laudo de conferência.

ARMAÇÃO DOS BÚZIOS, 03 de AGOSTO de 2018.

ANA PAULA FIGUEIREDO NOZUEIRA
GERENTE DE ORDEM DE PAGAMENTO

Face a Liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou ao seu procurador conforme Artigo 64 da Lei 4.320/64.


PAULO ABRANCHES GUEDES JUNIOR
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO

Coordenadoria do Tesouro, 03 de Agosto de 2018.

À Secretaria Municipal de Obras e Saneamento,

Encaminhamos processo de pagamento para análise prévia e autorização do Ordenador de Despesa.

Atenciosamente,



Vladimir Sant'Ana de Farias
Coordenador do Tesouro

À Secretaria de Planejamento e Projetos,

Após assinatura do Ordenador de Despesa encaminho processo para prosseguimento.

Atenciosamente,



Vladimir Sant'Ana de Farias
Coordenador do Tesouro



Estado do Rio de Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Folha de Informação

Anexada ao Processo nº

6445/2018


Folha nº:

169

Rubrica do Funcionário

A TESOURARIA, PARA CONCLUIR O PAGAMENTO DA NF 20180000000008 É NECESSÁRIO DEPOSITAR O VALOR DA CONTRAPARTIDA, CONSTATANTE NO DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO (FLS 161). APÓS O DEPOSITO RECORRAR O PROCESSO PARA O F.º EM 07/05/2019 Alberto F.V.J. Cordeiro Sec. Especial de Projetos e Convênios Mat: 11956	A SEC. DE OBRAS, TENDO EM VISTA QUE NO DIA 06/05/2019, O MINISTÉRIO APROVEU O VALOR DA CONTRA PARTIDA E LIBEROU O AJUSTE DO PLANO DE TRABALHO NO SICONV, ENCAMINHO O PROC. PARA A SEC. DE OBRAS AUTORIZAR O PAGAMENTO DA 2ª MEDIÇÃO, CONFORME DEMONSTRATIVO NA FOLHA Nº 161. EM 07/05/19. Alberto F.V.J. Cordeiro Sec. Especial de Projetos e Convênios Mat: 11956
A TESOURARIA, TENDO EM VISTA O IMPEDIMENTO DE CONCLUIR O PAGAMENTO NO SICONV DA 2ª MEDIÇÃO, DEVIDO AO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NÃO TER AJUSTADO O VALOR DA CONTRAPARTIDA DO CONVÊNIO, MESMO APÓS A FORMAL SOLICITAÇÃO DE AJUSTE SOLICITADA PELO MUNICÍPIO (FLS. 173), ENCAMINHO ESTE PROCESSO PARA PROSEGUIMENTO A TESOURARIA ATÉ QUE SEJAM SANADAS AS PENDÊNCIAS PELO MINISTÉRIO. EM 17/05/2019. Alberto F.V.J. Cordeiro Sec. Especial de Projetos e Convênios Mat: 11956	

[illegible]



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

Armação dos Búzios, 07 de agosto de 2018.

Memo. Nº 139/2018

Ilmº. Sr. Kleber Ferreira de Souza
Secretário de Governo e Fazenda

Assunto: Depósito de contrapartida – Pavimentação e Drenagem da Rua Canto do Céu e Rua Morro das Emerências (parte).

Vimos por meio deste, solicitar que seja efetuado o depósito da contrapartida referente ao contrato abaixo relacionado:

- Contrato nº 831101/2016 (Pavimentação e Drenagem da Rua Canto do Céu e Rua Morro das Emerências (parte))

Banco do Brasil

Agência: 1592-x

Conta Corrente: 242624


Valor: R\$ 107.055,58


Empenho nº: 493/2018

Aproveito a oportunidade para renovar os votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,


Maria Alice Ribeiro Passeri
Secretaria de Planejamento e Projetos

A subsegov


RECEBIDO
EM: 07/08/18
POR: 
HORA: 17:10
Sec. Municipal
de Governo

IMPRIMIR FECHAR

141

::Comprovantes

Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Mesma Titularidade
Conta Origem:	3825/006/00000047-0
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome 1º Titular:	PREF M A DE BUZIOS ROYALTIES PRO
CPF/CNPJ 1º Titular	01.616.171/0001-02

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	1592/24262-4
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Valor:	R\$107.055,58
Valor da Tarifa:	R\$0,00

Data de Débito:	08/08/2018
Data da Operação:	08/08/2018
Código da Operação:	00174337
Chave de Segurança:	F7L8HKEESLKWQXG

CPFs Autorizadores:	
	811.070.137-04
	104.826.697-48

Operação realizada com sucesso.

À Secretaria de Planejamento e Projetos,

Encaminho o processo para prosseguimento,

Atenciosamente,



Vladimir Sant'Ana de Farias
Coordenador do Tesouro

123
A

fechar X

Loading Image...

FREDERICO DA VEIGA JORDAO CORDEIRO



0

Sair do Sistema
Página Principal

Cadastramento

Programas

Propostas

Execução

Inf. Gerenciais

Cadastros

Acomp. e Fiscalização

Prestação de Contas

Administração

TCE

Verificação de Regularidade

Principal Consultar Proposta

Consultar Proposta

53000 - MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL

Convênio 831101/2016

Dados da Proposta

Plano de Trabalho

Projeto Básico/Termo de Referência

Ajuste do Plano de Trabalho

Razão Social do Concedente

Razão Social do Conveniente

Razão Social do Conveniente

Razão Social do Conveniente

Razão Social do Conveniente

Razão Social do Conveniente

Razão Social do Conveniente

Razão Social do Conveniente

Razão Social do Conveniente

Razão Social do Conveniente

Número	1/2018
Situação	Em Análise (aguardando parecer)
Número do Convênio	831101/2016
Órgão Concedente	53000 - MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL
CPF do Responsável pelo Concedente	300.013.663-00
Nome do Responsável pelo Concedente	MARLON CARVALHO CAMBRAIA
Identificação do Conveniente	CNPJ 01.616.171/0001-02
Razão Social do Conveniente	MUNICIPIO DE ARMACAO DE BUZIOS
CPF do Responsável pelo Conveniente	844.767.107-00
Nome do Responsável pelo Conveniente	ANDRE GRANADO NOGUEIRA DA GAMA
CPF do Responsável pelo Registro da Solicitação	043.071.457-20
Nome do Responsável pelo Registro da Solicitação	ALBERTO FREDERICO DA VEIGA JORDAO CORDEIRO
Data da Solicitação	02/08/2018

Aumento do valor da contrapartida

Objeto da Alteração

Ajuste do plano de trabalho a planilha licitada conforme os documentos apresentados e aprovados constantes na aba Projeto Básico

Justificativa

☒ Cronograma Físico☒ Cronograma de Desembolso☒ Plano de Aplicação Detalhado

O concedente deverá atribuir o status de "Em complementação" aos itens do plano de aplicação detalhado que serão alterados/excluídos pelo conveniente.


Nenhum registro foi encontrado.

Coordenadoria do Tesouro, 17 de Agosto de 2018.


À Secretaria Municipal de Obras e Saneamento,

Encaminho o processo para prosseguimento

Atenciosamente,



Vladimir Sant'Ana de Farias
Coordenador do Tesouro



PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO


Processo:6445/18	Fls:175
------------------	---------


Armação dos Búzios, 17 de Agosto de 2018.

A Subsecretaria de Governo,

Autorizo a anulação das Ordens de Pagamento nº **181821** e **181822** emitidas em 03/08/18, nos valores de **R\$ 85.157,12** e **R\$107.055,58** respectivamente, tendo em vista o impedimento de concluir o pagamento da 2º medição no SICONV conforme despacho à fl.169.

Atenciosamente,


PAULO ABRANCHES GUEDES JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO



PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

ESTRADA DA USINA 0600 - CENTRO

C.N.P.J 01.616.171/0001-02

Emissão: 17/08/2018

Hora: 14:27

Página: 1

ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO

Exercício: 2018

Processo....: 000/06445/18 de 30/05/2018 No.Ord.Pagamento: 181821

Autoriza o pagamento ao favorecido, na importância abaixo:

Valor Total.: R\$ 85.157,12

(OITENTA E CINCO MIL E CENTO E CINQUENTA E SETE REAIS E DOZE CENTAVOS)

Credor.....: DAFLA CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E GERENCIAMENTO LTDA - Código: 9658

CPF/CNPJ: 12.603.970/0001-60

Endereço: ESTRADA FRANCISCO DA CRUZ NUNES NÚMERO 8180 SALA 210

Bairro: ITAIPU

U.F: RJ

CEP: 24340000

especificação

CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DA DESPESA

À FL. 175.

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Empenho.....: 000258

Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Unid.Orç.....: 0107 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO

Prog. Trabalho...: 15.451.0028.1.304 - RECUPERAÇÃO DA ESTRADA MORRO DAS EMERÊNCIAS.

Despesa.....: 4490.5100 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte.....: 123 - CONVÊNIO

Valor: 85.157,12


A Liquidação da despesa contraída pela nota de empenho acima citada foi realizada pela coordenadoria de liquidação através do laudo de conferência.

ARMAÇÃO DOS BÚZIOS, 17 de AGOSTO de 2018.

ANA PAULA FIGUEIREDO NOGUEIRA
GERENTE DE ORDEM DE PAGAMENTO

Face a Liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou ao seu procurador conforme Artigo 64 da Lei 4.320/64.

PAULO ABRANCHES GUEDES JUNIOR
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO



PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

ESTRADA DA USINA 0600 - CENTRO

C.N.P.J 01.616.171/0001-02

177
5

Emissão: 17/08/2018

Hora: 14:27

Página: 1

ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO

Exercício: 2018

Processo...: 000/06445/18 de 30/05/2018 No.Ord.Pagamento: 181822

Autoriza o pagamento ao favorecido, na importância abaixo:

Valor Total.: R\$ 107.055,58

(CENTO E SETE MIL E CINQUENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS)

Credor.....: DAFLA CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E GERENCIAMENTO LTDA - Código: 9658

CPF/CNPJ: 12.603.970/0001-60

Endereço: ESTRADA FRANCISCO DA CRUZ NUNES NÚMERO 8180 SALA 210

Bairro: ITAIPU

U.F: RJ

CEP: 24340000

Especificação

À FL. 175.

CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DA DESPESA

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Empenho.....: 000493

Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Unid.Orç.....: 0107 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO

Prog. Trabalho....: 15.451.0028.1.232 - Sistema de drenagem dos bairros

Despesa.....: 4490.5100 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte.....: 175 - M,C.DANOS URBANÍSTICOS

Valor: 107.055,58

A Liquidação da despesa contraída pela nota de empenho acima citada foi realizada pela coordenadoria de liquidação através do laudo de conferência.

ARMAÇÃO DOS BÚZIOS, 17 de AGOSTO de 2018.

ANA PAULA FIGUEIREDO NOGUEIRA
GERENTE DE ORDEM DE PAGAMENTO

Face a Liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou ao seu procurador conforme Artigo 64 da Lei 4.320/64.

PAULO ABRANCHES GUEDES JÚNIOR
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO

Coordenadoria de Tesouro, 17 de Agosto de 2018.

À Secretaria de Obras e Saneamento,

Encaminho processo de pagamento para assinatura das anulações autorizadas à fl. 175 (Ordens de Pagamento 181821 e 181822).

Atenciosamente,


Vladimir Sant'anna de Farias
Coordenador do Tesouro


Coordenadoria de Tesouro, 17 de Agosto de 2018.

À Secretaria de Obras e Saneamento,

Segue para prosseguimento conforme despacho da Sec. de Projetos e
Convênio à fl. 169.

Atenciosamente,


Vladimir Sant'anna de Farias
Coordenador do Tesouro



**ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO**

Folha: 180

À Liquidação,

Conforme informado e solicitado pelo Escritório de Gestão e Projetos à folha 169, autorizo o pagamento da 2ª medição conforme Demonstrativo de Pagamento apresentado à folha 161.

Sem mais para o momento, encaminho este processo administrativo para prosseguimento.

Armação dos Búzios, 07 de maio de 2019

Atenciosamente,


Paulo Abranches Guedes Junior
Secretário Municipal de Obras e Saneamento

Eng. Paulo Abranches
SECRETÁRIO DE OBRAS
E SANEAMENTO
TAC 11.37



PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

ESTRADA DA USINA 0600 - CENTRO

C.N.P.J 01.616.171/0001-02

Emissão: 08/05/2019

Hora: 13:55

Página: 1

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2019

Processo...: 000/06445/18 de 30/05/2018 No.Ord.Pagamento: 190978

Autoriza o pagamento ao favorecido, na importância abaixo:

Valor Total.: R\$ 85.157,12

(OITENTA E CINCO MIL E CENTO E CINQUENTA E SETE REAIS E DOZE CENTAVOS)

Credor.....: DAFLA CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E GERENCIAMENTO LTDA - Código: 9658

CPF/CNPJ: 12.603.970/0001-60

Endereço: ESTRADA FRANCISCO DA CRUZ NUNES NÚMERO 8180 SALA 210

Bairro: ITAIPU U.F: RJ CEP: 24340000

Especificação

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A RECUPERAÇÃO DA
ESTRADA DO MORRO DAS EMERÊNCIAS CONFORME CONVÊNIO SICONV 831101/2016
REFERENTE AO PERÍODO DE 25/05/18 A 24/06/18 (2ª MEDIÇÃO) CONFORME NF.
20180000000008 À FL. 100.

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

No.Empenho.....: 000258/2018

Órgão/Unid.Orç...: 02.0107 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO

Prog. Trabalho....: 15.451.0028.1.304 - RECUPERAÇÃO DA ESTRADA MORRO DAS EMERÊNCIAS.

Despesa.....: 4490.5100 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte.....: 123 - CONVÊNIO

Valor da Dotação.: 85.157,12

Restos a Pagar	875.157,12	Valor Liquidado:	85.157,12	Valor a Liquidar:	790.000,00
----------------	------------	------------------	-----------	-------------------	------------

RESTO A PAGAR 2018


A Liquidação da despesa contraída pela nota de empenho acima citada foi realizada pela coordenadoria de liquidação através do laudo de conferência.

ARMAÇÃO DOS BÚZIOS, 08 de MAIO de 2019.

ANA PAULA FIGUEIREDO NOGUEIRA
GERENTE DE ORDEM DE PAGAMENTO

Face a Liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou ao seu procurador conforme Artigo 64 da Lei 4.320/64.

PAULO ABRANCHES GUEDES JÚNIOR
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO



PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

ESTRADA DA USINA 0600 - CENTRO

C.N.P.J 01.616.171/0001-02

Emissão: 08/05/2019

Hora: 13:56

Página: 1

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2019

Processo...: 000/06445/18 de 30/05/2018 No.Ord.Pagamento: 190979

Autoriza o pagamento ao favorecido, na importância abaixo:

Valor Total.: R\$ 107.055,58

(CENTO E SETE MIL E CINQUENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS)

Crêdor.....: DAFLA CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E GERENCIAMENTO LTDA - Código: 9658

CPF/CNPJ: 12.603.970/0001-60

Endereço: ESTRADA FRANCISCO DA CRUZ NUNES NÚMERO 8180 SALA 210

Bairro: ITAIPU U.F: RJ CEP: 24340000

Especificação

CONTRATO N°. 010/2018 DA OBRA DE
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS RUAS CANTO DO CÉU E MORRO DAS EMERÊNCIAS NO
BAIRRO DE JOSÉ GONÇALVES REFERENTE AO PERÍODO DE 25/05/18 A 24/06/18 (2ª
MEDIÇÃO) CONFORME NF. 20180000000008 À FL. 100.

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

No.Empenho.....: 000493/2018

Órgão/Unid.Orç...: 02.0107 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO

Prog. Trabalho...: 15.451.0028.1.232 - Sistema de drenagem dos bairros

Despesa.....: 4490.5100 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte.....: 175 - M.C.DANOS URBANÍSTICOS

Valor da Dotação.: 107.055,58

Restos a Pagar

437.850,10

Valor Liquidado:

107.055,58

Valor a Liquidar:

330.794,52

RESTO A PAGAR 2018

A Liquidação da despesa contraída pela nota de empenho acima citada foi realizada pela coordenadoria de liquidação através do laudo de conferência.

ARMAÇÃO DOS BÚZIOS, 08 de MAIO de 2019.

ANA PAULA FIGUEIREDO NOGUEIRA
GERENTE DE ORDEM DE PAGAMENTO

Face a Liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou ao seu procurador conforme Artigo 64 da Lei 4.320/64.

PAULO ABRANCHES GUEDES JÚNIOR
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO


Processo: 6445/18	Fis: 183
-------------------	----------

Coordenadoria de Tesouro, 08 de Maio de 2019.

À Secretaria de Obras e Saneamento,

Encaminhamos processo de pagamento para análise prévia e autorização do Ordenador de Despesa.

Atenciosamente,



Vladimir Sant'anna de Farias
Coordenador do Tesouro

Coordenadoria de Tesouro, 08 de Maio de 2019.

À Secretaria de Planejamento e Projetos (EGP),

Após assinatura do ordenador da despesa encaminho processo para que seja informado o valor do Repasse efetuado.

Atenciosamente,



Vladimir Sant'anna de Farias
Coordenador do Tesouro

fechar X

Loading Image...

Usuário: JUR DE OLIVEIRA TARDELLI

CPF:154277-16

09/05/2019 11:32-n/a Sair do Sistema

Cadastros
Programas
Página Principal
Propostas
Execução
Inf. Gerenciais
Cadastros
Acomp. e Fiscalização
Prestação de Contas
Administração
TCE
Verificação de Regularidade

[Principal](#) [Consultar Convênio](#) [Listar Movimentações Financeiras](#)

Pagamento a Favorecido com OBTV

50 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Em Aditvação 831101/2016

[Convênio](#) [Documento de Liquidação](#) [Detalhes do Pagamento](#) [Histórico](#) [Anexos](#)

Dados do Documento de Liquidação

Documento de Liquidação *	008/2018 - DAFLA CONSTRUCAO SERVICOS E GERENCIAMENTO LTDA
Tipo de Pagamento	☒ Pagamento Total ☐ Pagamento Parcial
Valor Original	R\$ 192.212,70
Valor Líquido Atual	R\$ 182.602,06
Tipo	NOTA FISCAL
Data de Emissão	17/07/2018

Favorecido

CNPJ/CPF/IG	12.603.970/0001-60
Nome/Razão Social	DAFLA CONSTRUCAO SERVICOS E GERENCIAMENTO LTDA

Domicílio Bancário do Favorecido

Banco	104
Agência	3022
Conta-Corrente	6249

Processo de Execução

Número	005/2017
Modalidade	CONCORRENCIA
Contrato Vinculado	000010/2018
Data de Assinatura	20/03/2018

187
C

Itens de Despesa

Descrição	Valor Unitário (R\$)	Quantidade	Valor Total (R\$)
2ª MEDIÇÃO	192.212,70	1	192.212,70

Rateio por Natureza de Despesa

Natureza de Despesa	Valor Rateado (R\$)
44905199 - OBRAS E INSTALACOES	192.212,70

Tributos

Esfera	Tributo	Aliquota (%)	Valor (R\$)
MUNICIPAL	ISS	5,00	9.610,64

Contribuições

☐ há registros a exibir.

Outras Retenções

☐ Não há registros a exibir.


Voltar

Coordenadoria de Tesouro, 09 de Maio de 2019.

À Secretaria de Planejamento e Projetos (EGP),

Após anexar o comprovante de pagamento às fls. 186 e 187 encaminho processo para prosseguimento,

Atenciosamente,



Vladimir Sant'anna de Farias
Coordenador do Tesouro

fechar X

Loading Image...

Usuário: ALBERTO FREDERICO DA VEIGA JORDAO CORDEIRO

CPF: 043.111.67-20

15/05/2019 06:20 - n/a Sair do Sistema

Cadastro de Empresas
Principal
Propostas
Execução
Int. Gerenciada
Execução
Atividade e Focalização
Proteção de Dados
Administração
TCR
Verificação da Regularidade

Principal Consultar Convênio Listar Movimentações Financeiras

Pagamento a Favorecido com OBTV

53000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Convênio 831101/2016

[Convênio](#)
[Documento de Liquidação](#)
[Detalhes do Pagamento](#)
[Histórico](#)
[Anexos](#)

Dados da OBTV de Inclusão

UG Emissora	455972
UG Emissora	44444
Nr. da OBTV	2019OB800011
Data da Inclusão da OBTV	09/05/2019
Número Bancário	02040124
Data de Envio do SIAFI	09/05/2019 11:30:22

Dados da OBTV de Cancelamento

UG Emissora	455972
Gestão Emissora	44444
Nr. da OBTV	2019OB800013
Data da OBTV de Cancelamento	10/05/2019
Motivo do Cancelamento	CONTA DE DEBITO SEM SALDO
Número Bancário	

Eventos

Evento	Nome do Responsável Evento	Data/Hora de Execução
Incluído	ALBERTO FREDERICO DA VEIGA JORDAO CORDEIRO	06/05/2019 17:17:32
Autorizado pelo Gestor Financeiro	ALBERTO FREDERICO DA VEIGA JORDAO CORDEIRO	06/05/2019 17:18:09
Autorizado pelo Ordenador de Despesas	ARTHUR DE OLIVEIRA TARDELLI	09/05/2019 11:30:22
Recusado pelo Banco	Sistema	10/05/2019 13:15:24

Situação Atual do Pagamento

Situação Atual do Registro de Pagamento	Movimentação Financeira Cancelada
Nome do Responsável	Sistema
Data/Hora da Situação	10/05/2019 13:15:24

[Voltar](#)

15/05/2019

Plataforma +Brasil

190

fechar X

* Loading Image...

Usuário: FREDERICO DA VEIGA JORDAO CORDEIRO

CPF:043.111.117-20

15/05/2019 16:19-n/a Sair do Sistema

Consultar Sistema
Principal
Propostas
Execução
Inf. Gerencial
Cadastros
Atos e Fiscalização
Proteção do Conteúdo
Administração
TCE
Verificação de Regularidade

PrincipalConsultar ConvênioListar Movimentações Financeiras

Pagamento a Favorecido com DETV

53000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Convênio 831101/2016

Convênio Documento de Liquidação Detalhes do Pagamento Histórico Anexos

Dados do Pagamento

Número 5422763 Movimentação Financeira Cancelada



Data 10/05/2019

Tipo Transferência Bancária para Crédito em Conta-Corrente

Valor Original do Documento de Liquidação R\$ 192.212,70

Valor Bruto do Documento de Liquidação R\$ 192.212,70

Valor Total do Pagamento R\$ 192.212,70

Total de Tributos Retidos R\$ 9.610,64

Total de Contribuições R\$ 0,00

Total de Outras Retenções R\$ 0,00

Valor Pago ao Favorecido R\$ 182.602,06

Observação * 2a medição

Relatório dos Valores Pagos em Cada Meta/Etapa do Cronograma Físico

Valor Total Pago para Metas/Etapas R\$ 192.212,70

Meta Prevista	Etapas Atendidas	Valor do Pagamento (R\$)	Recurso de Contrapartida (R\$)	Recurso de Fomento (R\$)
Recuperação da Estrada Morro da Emergências	Drenagem	85.157,12	107.055,58	0,00

Voltar



PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
ESCRITÓRIO DE GESTÃO DE PROJETOS E CONVÊNIOS - EGP

PROCESSO: 6445/2018 FLS:

ANÁLISE DO CONVÊNIO

CONTRATO: MORRO DAS EMERÊNCIAS

PARCELA	ORIGEM DO RECURSO	EMPENHO	VALOR	TOTAL DA PARCELA	TOTAL PAGO
1º PAGAMENTO	CONVÊNIO	258/18	R\$ 124.842,88	R\$ 134.842,88	R\$ 327.055,58
	CONTRAPARTIDA	257/18	R\$ 10.000,00		
2º PAGAMENTO	CONVÊNIO	258/18	R\$ 85.157,12	R\$ 192.212,70	
	CONTRAPARTIDA	257/18	R\$ 107.055,58		
3º PAGAMENTO	CONVÊNIO				
	CONTRAPARTIDA				
4º PAGAMENTO	CONVÊNIO				
	CONTRAPARTIDA				
5º PAGAMENTO	CONVÊNIO				
	CONTRAPARTIDA				

VALOR DO CONVÊNIO	R\$ 1.000.000,00
TOTAL PAGO CONVÊNIO	R\$ 210.000,00
RESTOS A PAGAR =	R\$ 790.000,00

VALOR DA CONTRAPARTIDA	R\$ 447.850,10
TOTAL PAGO CONTRAPARTIDA	R\$ 117.055,58
RESTOS A PAGAR =	R\$ 330.794,52

VALOR ATUAL DO CONTRATO	R\$ 1.447.850,10
TOTAL PAGO	R\$ 327.055,58
RESTOS A PAGAR =	R\$ 1.120.794,52

VALOR ORIGINAL DO CONTRATO	R\$ 1.447.850,10
VALOR DO ADITIVO	R\$ 0,00
VALOR ATUAL DO CONTRATO	R\$ 1.447.850,10

DATA DO LEVANTAMENTO - 15/05/2019

Após análise do EGP, segue para a Controladoria Geral PARA PROSSEGUIMENTO.

Armação dos Búzios, 15/05/2019.

ALBERTO F. DA V. JORDÃO CORDEIRO
Secretário Especial de Projetos e Convênios



PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
ESCRITÓRIO DE GESTÃO DE PROJETOS

192

Armação dos Búzios, 21 de maio de 2019.

Processo nº 6445/2018

Convênio nº 831101/2016


Venho por meio deste, solicitar a liberação do pagamento da 2ª medição da obra de **Pavimentação e Drenagem da Rua Canto do Céu e Rua Morro das Emergências** tendo em vista que esta medição é referente a obra executada em 2018, e que não foi paga devido ao erro do Ministério da Integração que não ajustou o valor da contrapartida do município no SICONV.

Em maio de 2019, o Ministério corrigiu o erro no SICONV, o que possibilita o município dar continuidade no contrato e a retomada da obra. Para a retomada da obra, é de suma importância o pagamento desta medição.

Tendo em vista o Decreto nº 1188 de 13 de maio, que suspendeu os pagamentos relativos a execução de obras e serviços, em seu artigo 2º, parágrafo 2º, encaminho o processo para análise da Secretaria de Obras e demais órgãos mencionados no parágrafo 3º para análise e auditoria e posterior liberação do pagamento.

Atenciosamente,

ALBERTO F. DA V. JORDÃO CORDEIRO
Secretário Especial de Projetos e Convênios



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO

193

Armação dos Búzios, 27 de maio de 2019

À COGEM,

CONSIDERANDO a necessidade de cumprimento do que está disposto no Decreto nº 1.199, de 23 de maio de 2019, que produz efeitos desde 13 de maio de 2019;

CONSIDERANDO que se trata de uma obra que utiliza recursos federais, provenientes de contrato de convênio com o Ministério da Integração;

CONSIDERANDO que o cumprimento do objeto do contrato é de suma importância para a cidade;

CONSIDERANDO que a Nota Fiscal nº 8, apresentada à folha 100, foi emitida em 17 de julho de 2018;

CONSIDERANDO que a não efetivação do pagamento é prejudicial ao bom andamento da obra, podendo ocasionar, inclusive, paralisação dos serviços, conforme ocorrido em 13 de novembro de 2018;

CONSIDERANDO que não há óbice quanto à continuação da execução do objeto;

Venho por meio deste, solicitar análise e parecer quanto ao prosseguimento do pagamento.

Sem mais para o momento, coloco-me à disposição para quaisquer informações que se fizerem necessárias.

Atenciosamente,

Paulo Abranches Guedes Junior
Secretário Municipal de Obras e Saneamento

Eng. Paulo Abranches
SECRETÁRIO DE OBRAS
E SANEAMENTO
MAB 12007

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 12603970/0001-60
Razão Social: DAFLA CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E GERENCIAMENTO LTDA EPP
Endereço: EST FRANCISCO DA CRUZ NUNES 8180 SALA 210 / ITAIPU / NITEROI / RJ / 24340-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.


Validade: 24/05/2019 a 22/06/2019

Certificação Número: 2019052403314617814258

Informação obtida em 30/05/2019, às 13:49:38.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

autenticada



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DAFLA CONSTRUCAO SERVICOS E GERENCIAMENTO LTDA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 12.603.970/0001-60

Certidão nº: 173293264/2019

Expedição: 30/05/2019, às 13:50:33

Validade: 25/11/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DAFLA CONSTRUCAO SERVICOS E GERENCIAMENTO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **12.603.970/0001-60**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: DAFLA CONSTRUCAO SERVICOS E GERENCIAMENTO LTDA
CNPJ: 12.603.970/0001-60 /

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 13:04:55 do dia 01/03/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/08/2019.

Código de controle da certidão: **F0CC.A10F.33B7.FC64**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Autenticada



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO


Armação dos Búzios, 30 de maio de 2019.

Proc. nº 6445/2018 (Fls. 197)

A Liquidação,

E em atenção ao decreto 1.199, do dia 24 de maio do ano em curso, em seu art. 3º, §2º, encaminho o presente processo para pagamento.

Respeitosamente,


ROSENILDO AVELAR DE ARAÚJO
Sub-Controlador

Responde pela Controladoria Geral do Município
Através da Portaria 375 de 13/05/2019, BO nº 958

fechar X

Loading Image...

Usuário: JUIR DE OLIVEIRA TARDELLI

CPF:154.777-16

31/05/2019 09:59-n/a Sair do Sistema

Cadastros
Programas
Propostas
Execução
Inf. Gerenciais
Cadastros
Acomp. e Fiscalização
Prestação de Contas
Administração
TCE
Verificação de Regularidade

[Principal](#)[Consultar Convênio](#)[Listar Movimentações Financeiras](#)

Pagamento a Favorecido com OBTV

000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Convênio 831101/2016

[Convênio](#) [Documento de Liquidação](#) [Detalhes do Pagamento](#) [Histórico](#) [Anexos](#)

Dados do Documento de Liquidação

Documento de Liquidação *

008/2018 - DAFLA CONSTRUCAO SERVICOS E GERENCIAMENTO LTDA

Tipo de Pagamento

☒ Pagamento Total ☐ Pagamento Parcial

Valor Original

R\$ 192.212,70

Valor Líquido Atual

R\$ 182.602,06

Tipo

NOTA FISCAL / FATURA

Data de Emissão

17/07/2018

Favorecido

CNPJ/CPF/IG

12.603.970/0001-60

Nome/Razão Social

DAFLA CONSTRUCAO SERVICOS E GERENCIAMENTO LTDA

Domicílio Bancário do Favorecido

Banco

104

Agência

3022

Conta-Corrente

6249

Processo de Execução

Número

005/2017

Modalidade

CONCORRENCIA

Contrato Vinculado

000010/2018


Data de Assinatura

20/03/2018

À Controladoria Geral.

Encaminhamos processo de pagamento para análise prévia e autorização do Ordenador de Despesa.

Atenciosamente,



Arthur de Oliveira Tardelli
Coordenador do Tesouro



PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BUZIOS
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Processo: 6445/2018 - Fls.200

Armação dos Búzios, 05/06/2019.

AO CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO,

Em atenção ao presente processo administrativo vimos tecer as seguintes considerações:


Trata-se de processo cujo pedido é a sua análise, por esta COGEM.

Neste sentido, no que tange ao procedimento de pagamento da despesa ora faturada, observa-se que foram atendidos os seguintes itens:

ITEM	DESCRIÇÃO	CUMPRIMENTO			FLS.
		SIM	NÃO	N. A.	
1	Foi realizado cálculo de retenção de impostos?	X			163
2	Foi Realizado exame para liquidação?	X			164
3	O Empenho está devidamente assinado pelo ordenador da despesa?	X			85 e 162
4	O Empenho está de acordo com o credor e o objeto?	X			85 e 162
5	A Ordem de Pagamento está devidamente assinada pelo ordenador da despesa?	X			165 e 166
6	O pagamento foi realizado através da conta bancária com recursos na mesma fonte de empenho?	X			198
7	O pagamento foi creditado devidamente na conta indicada pelo credor?	X			100


Neste sentido, visto o atendimento dos itens acima, sugerimos o retorno dos autos à Secretaria de origem para prosseguimento do presente.

Atenciosamente,


Núbia da Costa Coutinho
Agente Administrativo

De acordo,

A Secretaria Municipal de Obras e Saneamento, para prosseguimento.


Rosenildo Avelar de Araújo
Sub Controlador

Responde pela Controladoria geral do Município
Através da Portaria 375 de 13/05/2019, BO 958

A

Prefeitura Municipal de Armação dos Búzios - RJ.

Secretaria Municipal de Obras


REFERÊNCIA: CONTRATO 831101/2016

Ministério da Integração Nacional

Prezados Senhores,

A DAFLA CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E GERENCIAMENTO LTDA - EPP, CNPJ nº 12.603.970/0001-60, apresenta, para os devidos fins, Nota Fiscal referente à 3ª (Terceira) medição de obras no valor de R\$ 330.489,76 (Trezentos e trinta mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e setenta e seis centavos), para os serviços de recuperação da Estrada Morro das Emergências.

Armação dos Búzios, 16 de Maio de 2019.



DAFLA CONSTRUÇÃO SERVIÇOS
E GERENCIAMENTO LTDA - EPP
CNPJ: 12.603.970/0001-60

DAFLA CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E GERENCIAMENTO LTDA - EPP

CNPJ 12.603.970/0001-60



PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO

207

ATESTADO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

Ref.: OBJETO: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA CANTO DO CÉU E RUA MORRO DAS EMERÊNCIAS (PARTE)

PROCESSO Nº: 611/2017

Atestamos que os serviços de fornecimento constantes na **3ª medição** referente ao período de **25 de junho de 2018 a 13 de novembro de 2018**, e a respectiva fatura, referentes ao contrato firmado entre o **Município de Armação dos Búzios** e a empresa **DAFLA CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E GERENCIAMENTO LTDA-EPP**, foram executados de acordo com as especificações contratuais entre as partes e dentro do padrão de qualidade aceito pela Administração.

Segue abaixo, relatório de prazos e valores contratuais:

Data de início contratual: **09/04/2018**

Prazo Inicial: **12 Meses**

TERMO DE OCORRÊNCIA

1. Tipo de ocorrência (*):

() Falta de funcionário

() Falta na execução dos serviços

() Falta de pontualidade

() Falta de material

(X) Outros

() Nada a registrar


(*) detalhar em relatório em anexo, se for o caso.

2. Valor a ser glosado na fatura mensal: _____ (se for o caso)

3. **Valor total a pagar referente aos serviços prestados nos meses de junho a novembro de 2018, referente à 3ª medição: R\$ 330.489,76 (Trezentos e trinta mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e setenta e seis centavos).**

Recebimento efetuado em 02 (duas) vias, sendo uma para o processo e outra para a empresa contratada.

Armação dos Búzios, 07 de junho de 2019


João Pedro Souza
Engenheiro Civil

João Pedro Santos de Souza
Engenheiro Civil
CREA/RJ 2017107998



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da Nota: **20190000000000000000** Data e Hora de Emissão: **16/05/2019 15:57:32** Competência: **05/2019** Código de Verificação: **DTHP-4KJE**

Exigibilidade: **Exigível em Armação dos Búzios/RJ** Localidade da Prestação: **Armação dos Búzios/RJ**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **12.603.970/0001-60** Inscrição Municipal: **01531680**
 Nome/Razão Social: **DAFLA CONSTRUCAO, SERVICOS E GERENCIAMEN**
 Endereço: **ES FRANCISCO DA CRUZ NUNES 8160, 0210 - ITAIPU - CEP: 24340-000**
 Município: **Niterói** UF: **RJ**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS** Inscrição Municipal: **—**
 CPF/CNPJ: **01.616.171/0001-02**
 Endereço: **ES da Usina Velha 600 - Centro - CEP: 28950-000**
 Município: **Armação dos Búzios** UF: **RJ** E-mail: **—**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Objeto: **Serviços de Recuperação da Estrada Morto das Emergências.**

Nota Fiscal refere-se ao pagamento da 3ª Medição.

Contrato: **831101/2016**
 Ministério da Integração Nacional

Valor da Nota Fiscal: **R\$330.489,76**
 40% Mão de obra: **R\$132.195,90**
 60% material: **R\$198.293,85**

Dados Bancários
 Caixa Econômica Federal
 Agência: **3022**
 Op: **003**
 Conta: **624-9**

CNAE: **4213800 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas**

Súbitem: **07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica...**

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 330.489,76

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
198.293,85	132.195,91	6,00%	6.609,79	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- A legislação tributária de Niterói pode ser consultada em www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao
- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço. (Competência MAI / 2019)
- Esta NFS-e não gera crédito. Serviço prestado em outro município.
- Valor Líquido a Pagar: **R\$ 323.879,97**
- Departamento de Lançamento e Fiscalização - Rua da Conceição, 100 - Centro - 24020-082 - Niterói - RJ.
- PROCON: Rua Visc. de Sepetiba 518, Térreo, Centro, Niterói. Tel. 151. CODECON: Rua da Alfândega 08, Térreo, Centro, RJ, Tel. 0800 282-7060.

Autenticada

Curry



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Contrato: 831101/2016

Pavimentação e Drenagem da Rua Canto do Céu e Rua Morro das Emergências (Parte)

Bairro: José Gonçalves

Sinapi Julho/2017

Não Desonerada

BDI = 18,00%

Contratada: Dafia Construção Serviços e Gerenciamento LTDA-EPP
Período: 25/06/2018 a 13/11/2018
Engenheiro Fiscal: João Pedro Souza

CONTRATO																
ITEM	FONTE	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO (C/B)	PREÇO TOTAL	Quant. Medida	Valor Medido	% Medida	Quant. Acumulada	Valor Acumulado	% Acumulada	Quant. Saldo	Valor Saldo	% Saldo
1.1 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL																
1.1.1	COMP	COMP 21	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	%	100,00	703,16	70.316,00	22,83	16.053,14	22,83%		31.937,52	45,42%		38.378,48	54,58%
1.2 CANTO DE OBRAS E SERVIÇOS PRELIMINARES																
1.2.1	SINAPI	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00	529,63	3.177,78	0,00	0,00	0,00%	6,00	3.177,78	100,00%	-	-	0,00%
1.2.2	SINAPI	74220/001	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	M2	147,40	79,58	11.730,08	0,00	-	0,00%	147,40	11.730,09	100,00%	-	-	0,00%
1.2.3	SINAPI	93208	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTOIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF 02/2016	M2	17,50	604,68	10.581,90	0,00	-	0,00%	17,50	10.581,90	100,00%	-	-	0,00%
1.2.4	SINAPI	93212	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTOIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF 02/2016	M2	12,50	801,28	10.016,00	0,00	-	0,00%	12,50	10.016,00	100,00%	-	-	0,00%
1.2.5	SINAPI	93207	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTOIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF 02/2016	M2	18,00	806,83	14.522,94	0,00	-	0,00%	18,00	14.522,94	100,00%	-	-	0,00%
1.2.6	SINAPI	41568	ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AEREA TRIFÁSICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN	1,00	1.862,32	1.862,32	0,00	-	0,00%	1,00	1.862,32	100,00%	-	-	0,00%
1.2.7	SINAPI	74022/013	ENSAIO DE COMPACTAÇÃO - AMOSTRAS TRABALHADAS - SOLOS	UN	5,00	211,43	1.057,15	0,00	-	0,00%	-	-	0,00%	5,00	1.057,15	100,00%
1.2.8	SINAPI	73900/012	ENSAIOS DE CONCRETO ASFALTICO	T	12,53	66,34	831,24	0,00	-	0,00%	-	-	0,00%	12,53	831,24	100,00%
1.2.9	SINAPI	74022/030	ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO	UN	24,00	190,28	4.566,72	0,00	-	0,00%	-	-	0,00%	24,00	4.566,72	100,00%
1.3 - MOVIMENTO DE TERRA, CARGA, TRANSPORTE E DRENAGEM																
			ESCOVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCALISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 01/2015	M3	1.862,43	13,25	24.677,20	486,51	6.446,26	26,12%	1.148,38	15.216,04	61,66%	714,05	9.461,16	38,34%

204

João Pedro Santos de Souza
Engenheiro Civil
CREAR J 20171107998



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Contrato: 831101/2016

Pavimentação e Drenagem da Rua Canto do Céu e Rua Morro das Emerências (Parte)

Bairro: José Gonçalves

Sinapi Julho/2017

Não Desonerada

BDI = 18,00%

Contratada: Dafia Construção Serviços e Gerenciamento LTDA-EPP

Período: 25/06/2018 a 13/11/2018

Engenheiro Fiscal: João Pedro Souza

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			3ª MEDIÇÃO			ACUMULADO			SALDO		
					QUANT.	PREÇO UNITÁRIO C/BDI	PREÇO TOTAL	Quant. Medida	Valor Medido	% Medida	Quant. Acumulada	Valor Acumulado	% Acumulada	Quant. Saldo	Valor Saldo	% Saldo
1.3.2	SINAPI	90108	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF: 04/2016	M3	2.351,92	11,81	28.011,37	1054,70	12.561,48	44,84%	2.004,80	23.877,17	85,24%	347,12	4.134,20	14,76%
1.3.3	SINAPI	93379	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF: 04/2016	M3	1.480,82	18,07	26.758,42	426,84	7.713,00	28,82%	1.040,36	18.799,30	70,26%	440,46	7.989,12	29,74%
1.3.4	SINAPI	93381	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF: 04/2016	M3	1.829,68	8,98	16.430,82	921,64	8.276,33	50,37%	1.559,35	14.002,97	85,22%	270,34	2.427,65	14,78%
1.3.5	SINAPI	72844	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)	T	744,13	0,81	602,75	0,00	-	0,00%	703,43	569,78	94,53%	40,70	32,97	5,47%
1.3.6	SINAPI	72887	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	M3XKM	2.480,46	1,17	2.902,14	0,00	-	0,00%	2.344,80	2.743,42	94,53%	135,66	158,72	5,47%
1.3.7	SINAPI	73817001	EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - PO DE PEDRA	M3	204,86	112,30	23.005,78	84,40	9.478,12	41,20%	181,83	20.419,51	88,76%	23,03	2.586,27	11,24%
1.3.8	SINAPI	95566	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF: 12/2015	M	87,00	111,38	9.690,06	72,00	8.019,36	82,76%	78,00	8.687,64	89,66%	9,00	1.002,42	10,34%
1.3.9	SINAPI	92220	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF: 12/2015	M	716,01	183,97	117.404,15	220,90	36.220,97	30,85%	584,90	95.806,05	81,69%	131,11	21.498,10	18,31%

João Pedro Santos de Souza
Engenheiro Civil
CREA RJ 2017 107998



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Contrato: 831101/2016

Pavimentação e Drenagem da Rua Canto do Céu e Rua Morro das Emerências (Parte)

Bairro: José Gonçalves

Sinapi Julho/2017

Não Desonerada

BDI = 18,00%

Contratada: Dafia Construção Serviços e Gerenciamento LTDA-EPP
Período: 25/06/2018 a 13/11/2018
Engenheiro Fiscal: João Pedro Souza

CONTRATO																
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO C/BDI	PREÇO TOTAL	3ª MEDIÇÃO			ACUMULADO			SALDO		
								Quant. Medida	Valor Medido	% Medida	Quant. Acumulada	Valor Acumulado	% Acumulada	Quant. Saldo	Valor Saldo	% Saldo
1.3.10	SINAPI	92221	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 12/2016	M	204,79	205,76	42.137,59	0,00	-	0,00%	200,00	41.152,00	97,66%	4,79	985,59	2,34%
1.3.11	SINAPI	92223	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 12/2016	M	404,46	302,09	122.183,32	287,46	86.838,79	71,07%	404,46	122.183,32	100,00%	-	-	0,00%
1.3.12	COMP	COMP 01	POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO (15 x 20 x 40cm) COM PAREDES DE 15CM, PARA REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS COM DIMENSÕES INTERNAS DE 1,20M X 1,20M X 1,50M	UN	1,00	1.882,14	1.882,14	0,00	-	0,00%	1,00	1.882,14	100,00%	-	-	0,00%
1.3.13	COMP	COMP 02	POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO (15 x 20 x 40cm) COM PAREDES DE 15CM, PARA REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS COM DIMENSÕES INTERNAS DE 1,20M X 1,20M X 2,00M	UN	3,00	2.318,96	6.956,88	2,00	4.637,92	66,67%	3,00	6.956,88	100,00%	-	-	0,00%
1.3.14	COMP	COMP 03	POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO (15 x 20 x 40cm) COM PAREDES DE 15CM, PARA REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS COM DIMENSÕES INTERNAS DE 1,50M X 1,50M X 1,90M	UN	1,00	2.675,53	2.675,53	1,00	2.675,53	100,00%	1,00	2.675,53	100,00%	-	-	0,00%
1.3.15	COMP	COMP 04	POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO (15 x 20 x 40cm) COM PAREDES DE 15CM, PARA REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS COM DIMENSÕES INTERNAS DE 2,00M X 2,00M X 1,20M	UN	1,00	2.691,29	2.691,29	0,00	-	0,00%	-	-	0,00%	1,00	2.691,29	100,00%
1.3.16	COMP	COMP 05	POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO (15 x 20 x 40cm) COM PAREDES DE 15CM, PARA REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS COM DIMENSÕES INTERNAS DE 2,00M X 2,00M X 2,03M	UN	1,00	3.268,48	3.268,48	0,00	-	0,00%	1,00	3.268,48	100,00%	-	-	0,00%
1.3.17	COMP	COMP 06	POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO (15 x 20 x 40cm) COM PAREDES DE 15CM, PARA REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS COM DIMENSÕES INTERNAS DE 1,20M X 1,20M X 2,14M	UN	1,00	2.379,77	2.379,77	0,00	-	0,00%	-	-	0,00%	1,00	2.379,77	100,00%
1.3.18	COMP	COMP 07	POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO (15 x 20 x 40cm) COM PAREDES DE 15CM, PARA REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS COM DIMENSÕES INTERNAS DE 2,00M X 2,00M X 1,87M	UN	1,00	3.128,77	3.128,77	0,00	-	0,00%	-	-	0,00%	1,00	3.128,77	100,00%
1.3.19	COMP	COMP 08	POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO (15 x 20 x 40cm) COM PAREDES DE 15CM, PARA REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS COM DIMENSÕES INTERNAS DE 2,00M X 2,00M X 1,60M	UN	3,00	2.952,56	8.857,68	3,00	8.857,68	100,00%	3,00	8.857,68	100,00%	-	-	0,00%
1.3.20	COMP	COMP 09	POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO (15 x 20 x 40cm) COM PAREDES DE 15CM, PARA REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS COM DIMENSÕES INTERNAS DE 2,00M X 2,00M X 1,50M	UN	4,00	2.885,74	11.542,96	1,00	2.885,74	25,00%	4,00	11.542,96	100,00%	-	-	0,00%

206

João Pedro Santos de Souza
Engenheiro Civil
CPF: 17107998



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Contrato: 831101/2016

Pavimentação e Drenagem da Rua Canto do Céu e Rua Morro das Emerências (Parte)

Bairro: José Gonçalves

Sinapi Julho/2017

Não Desonerada

BDI = 18,00%

Contratada: Delfa Construção Serviços e Gerenciamento LTDA-EPP

Período: 25/06/2018 a 13/11/2018

Engenheiro Fiscal: João Pedro Souza

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			3ª MEDIÇÃO			ACUMULADO			SALDO		
					QUANT	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL	Quant Medida	Valor Medido	% Medida	Quant Acumulada	Valor Acumulado	% Acumulada	Quant Saldo	Valor Saldo	% Saldo
1.3.21	COMP	COMP 10	POCO DE VISTA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO (15 x 20 x 40cm) COM PAREDES DE 15CM, PARA REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS COM DIMENSÕES INTERNAS DE 1,20M X 1,20M X 1,20M	UN	10,00	2.003,01	20.030,10	4,00	8.012,04	40,00%	10,00	20.030,10	100,00%	-	-	0,00%
1.3.22	COMP	COMP 11	POCO DE VISTA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO (15 x 20 x 40cm) COM PAREDES DE 15CM, PARA REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS COM DIMENSÕES INTERNAS DE 1,50M X 1,50M X 2,50M	UN	1,00	2.973,22	2.973,22	1,00	2.973,22	100,00%	1,00	2.973,22	100,00%	-	-	0,00%
1.3.23	COMP	COMP 12	POCO DE VISTA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO (15 x 20 x 40cm) COM PAREDES DE 15CM, PARA REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS COM DIMENSÕES INTERNAS DE 1,50M X 1,50M X 1,20M	UN	13,00	2.329,20	30.279,60	11,00	25.621,20	84,62%	13,00	30.279,60	100,00%	-	-	0,00%
1.3.24	COMP	COMP 13	POCO DE VISTA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO (15 x 20 x 40cm) COM PAREDES DE 15CM, PARA REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS COM DIMENSÕES INTERNAS DE 1,50M X 1,50M X 1,30M	UN	1,00	2.383,86	2.383,86	1,00	2.383,86	100,00%	1,00	2.383,86	100,00%	-	-	0,00%
1.3.25	COMP	COMP 14	POCO DE VISTA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO (15 x 20 x 40cm) COM PAREDES DE 15CM, PARA REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS COM DIMENSÕES INTERNAS DE 1,50M X 1,50M X 2,00M	UN	1,00	2.724,11	2.724,11	1,00	2.724,11	100,00%	1,00	2.724,11	100,00%	-	-	0,00%
1.3.26	COMP	COMP 15	POCO DE VISTA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO (15 x 20 x 40cm) COM PAREDES DE 15CM, PARA REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS COM DIMENSÕES INTERNAS DE 1,20M X 1,20M X 1,30M	UN	1,00	2.039,50	2.039,50	1,00	2.039,50	100,00%	1,00	2.039,50	100,00%	-	-	0,00%
1.3.27	SINAPI	83627	TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P = CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	43,00	619,17	26.624,31	19,00	11.764,23	44,19%	21,00	13.002,57	48,84%	22,00	13.621,74	51,16%
1.3.28	COMP	COMP 16	CAIXA DE RALO EM CONCRETO PRE-MOLDADO, COM PAREDE DE 0,06M, NAS DIMENSÕES INTERNAS DE (0,30X0,90X0,80)M, PARA ÁGUAS PLUVIAIS, COM BASE EM CONCRETO SIMPLES (FCR=11 MPa), PREENCHIMENTO DA PERIFERIA DA GRELHA EM CONCRETO SIMPLES (FCR=15 MPa), REJUNTE DA BOLSA DO TUBO E DO PESCOÇO DA CAIXA PRE-MOLDADA EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:4, EM VOLUME, GRELHA DE FERRO FUNDIDO DE 135KG, EXCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO.(DESONERADO)	UN	86,00	820,63	70.574,18	49,00	40.210,87	56,98%	53,00	43.493,39	61,63%	33,00	27.080,79	38,37%

João Pedro Santos de Souza
Engenheiro Civil
CREA/RJ 2017107998



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Contrato: 831101/2016

Pavimentação e Drenagem da Rua Canto do Céu e Rua Morro das Emerências (Parte)

Bairro: José Gonçalves

Sinapi Julho/2017

Não Desonerada

BDI = 18,00%

Contratada: Dafia Construção Serviços e Gerenciamento LTDA-EPP

Período: 25/06/2018 a 13/11/2018

Engenheiro Fiscal: João Pedro Souza

CONTRATO																
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				3ª MEDIÇÃO				ACUMULADO				SALDO				
ITEM	FONTE	CÓDIGO		UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO C/BDI	PREÇO TOTAL	Quant. Medida	Valor Medido	% Medida	Quant. Acumulada	Valor Acumulado	% Acumulada	Quant. Saldo	Valor Saldo	% Saldo
1.3.29	COMP	COMP 17	CAIXA DE AREIA PARA RETENÇÃO DE RESÍDUOS EXECUTADA EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL (14 X 19 X 29 CM) COM DIMENSÕES DE 8,00M X 1,00M X 1,20M E TAMPA ESTRUTURADA COM PERFIS METÁLICOS	UN	4,00	3.482,46	13.929,84	0,00	-	0,00%	4,00	13.929,84	100,00%	-	-	0,00%
1.3.30	SINAPI	85366	DEMOLICAO MANUAL DE PAVIMENTACAO EM CONCRETO ASFALTICO, ESPESSURA 5CM	M2	285,00	31,35	8.934,75	140,00	4.389,00	49,12%	280,00	8.778,00	98,25%	5,00	156,75	1,75%
1.3.31	COMP	COMP 20	PARALELEPÍPEDOS COM LIMPEZA DE BETUME, ADERENTE SOBRE COLCHAO DE PO-DE-PEDRA, INCLUINDO FORNECIMENTO DO PO-DE-PEDRA, EXCLUSIVE REJUNTAMENTO E FORNECIMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS.	M2	312,00	50,11	15.634,32	0,00	-	0,00%	312,00	15.634,32	100,00%	-	-	0,00%
1.4 - PAVIMENTACAO							573.662,31		19.707,41	3,44%		19.707,41	3,44%		553.955,50	96,56%
1.4.1	SINAPI	74154/001	ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M3, DMT 50 A 200M	M3	1.253,31	5,06	6.341,75	0,00	-	0,00%	-	-	0,00%	1.253,31	6.341,75	100,00%
1.4.2	SINAPI	72844	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)	T	2.443,95	0,81	1.979,60	0,00	-	0,00%	-	-	0,00%	2.443,95	1.979,60	100,00%
1.4.3	SINAPI	72887	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	M3XKM	8.146,51	1,17	9.531,42	0,00	-	0,00%	-	-	0,00%	8.146,51	9.531,42	100,00%
1.4.4	SINAPI	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	6.266,58	1,49	9.337,20	0,00	-	0,00%	-	-	0,00%	6.266,58	9.337,20	100,00%
1.4.5	SINAPI	73817/001	EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - PO DE PEDRA	M3	626,65	112,30	70.372,80	28,50	3.200,55	4,55%	28,50	3.200,55	4,55%	598,15	67.172,25	95,45%
1.4.6	SINAPI	73711	BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA CORRIDA, INCLUSIVE COMPACTACAO	M3	626,65	114,76	71.914,35	28,50	3.270,66	4,55%	28,50	3.270,66	4,55%	598,15	68.643,69	95,45%
1.4.7	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_06/2016	M	2.396,36	43,20	103.522,75	0,00	-	0,00%	-	-	0,00%	2.396,36	103.522,75	100,00%
1.4.8	SINAPI	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_06/2016	M	180,50	48,06	8.674,83	0,00	-	0,00%	-	-	0,00%	180,50	8.674,83	100,00%
1.4.9	SINAPI	72945	IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM ADP CM-30	M2	6.266,58	5,05	31.646,23	285,00	1.439,25	4,55%	285,00	1.439,25	4,55%	5.981,58	30.206,98	95,45%

CREARJ 20171073998
Engenheiro CMI
João Pedro Santos de Souza



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Contrato: 831101/2016

Pavimentação e Drenagem da Rua Canô do Céu e Rua Morro das Emerências (Parte)

Bairro: José Gonçalves

Sinapi Julho/2017

Não Desonerada

BDI = 18,00%

Contratada: Daffa Construção Serviços e Gerenciamento LTDA-EPP

Período: 25/06/2018 a 13/11/2018

Engenheiro Fiscal: João Pedro Souza

CONTRATO																
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO (C/BDI)	PREÇO TOTAL	Quant. Medida	Valor Medido	% Medida	Quant. Acumulada	Valor Acumulado	% Acumulada	Quant. Saldo	Valor Saldo	% Saldo
1.4.10	SINAPI	96983	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESURA DE 4,0 CM EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF 03/2017	M3	250,66	1.034,82	259.387,88	11,40	11.796,95	4,55%	11,40	11.796,95	4,55%	239,26	247.591,03	95,45%
1.4.11	SINAPI	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF 06/2016	M	20,00	47,70	954,00	0,00	-	0,00%	-	-	0,00%	20,00	954,00	100,00%
1.5 - CALÇADA							66.080,43		0,00	0,00%		0,00	0,00%		66.080,43	100,00%
1.5.1	SINAPI	85422	PREPARO MANUAL DE TERRENO S/ RASPAGEM SUPERFICIAL	M2	1.198,18	9,64	11.550,46	0,00	-	0,00%	-	-	0,00%	1.198,18	11.550,46	100,00%
1.5.2	SINAPI	94981	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2016	M3	95,85	568,91	54.530,02	0,00	-	0,00%		-	0,00%	95,85	54.530,02	100,00%
1.6 - SINALIZAÇÃO VIÁRIA							26.128,83		0,00	0,00%		0,00	0,00%		26.128,83	100,00%
1.6.1	SINAPI	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	352,22	26,02	9.164,76	0,00	-	0,00%	-	-	0,00%	352,22	9.164,76	100,00%
1.6.2	COMP	COMP 18	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA - FORNECIMENTO E FIXAÇÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, EXCLUSIVE O TUBO	M2	8,04	946,24	7.607,77	0,00	-	0,00%	-	-	0,00%	8,04	7.607,77	100,00%
1.6.3	COMP	COMP 19	TUBO DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, COM DIAMETRO DE 2", DIN-2440, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	155,00	60,37	9.357,35	0,00	-	0,00%	-	-	0,00%	155,00	9.357,35	100,00%
TOTAL							1.447.850,10		330.489,76	22,83%		687.545,34	45,42%		790.304,76	54,58%
VALOR DO CONTRATO											R\$		1.447.850,10			
VALOR DA 2ª MEDIÇÃO											R\$		330.489,76			
VALOR ACUMULADO											R\$		687.545,34			
SALDO DO CONTRATO											R\$		790.304,76			
PERCENTUAL REALIZADO DO CONTRATO													45,42%			

209

João Pedro Santos de Souza
Engenheiro Civil
CREA/RJ 2017107998



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

MEMÓRIA DE CÁLCULO - 3ª MEDIÇÃO

Pavimentação e Drenagem da Rua Canto do Céu e Rua Morro das Emerências (Parte)

Bairro José Gonçalves

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.1.1. COMP 21 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL

22,83 %

COD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PR. UNITÁRIO	PR. TOTAL
2707	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO	H	2,80	R\$ 105,12	R\$ 294,34
4069	MESTRE DE OBRAS	H	5,60	R\$ 53,85	R\$ 301,56
				TOTAL UNITÁRIO	R\$ 595,90

CANTEIRO DE OBRAS E SERVIÇOS PRELIMINARES

1.2.1	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO			0,00	M2
1.2.2	74220/1	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X			0,00	M2
1.2.3	93208	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSIVE PRATELEIRAS. AF_02/2016			0,00	M2
1.2.4	93212	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSIVE MOBILIÁRIO. AF_02/2016			0,00	M2
1.2.5	93207	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSIVE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016			0,00	M2
1.2.6	41598	ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA TRIFÁSICA 40A EM POSTE MADEIRA			0,00	UN
1.2.7	74022/13	ENSAIO DE COMPACTAÇÃO - AMOSTRAS TRABALHADAS - SOLOS			0,00	UN
1.2.8	73900/12	ENSAIOS DE CONCRETO ASFALTICO			0,00	T
1.2.9	74022/30	ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO			0,00	UN

MOVIMENTO DE TERRA, CARGA, TRANSPORTE E DRENAGEM

1.3.1	90106	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015			486,51	M3
-------	-------	--	--	--	--------	----

Anexo Memória de Cálculo das Escavações, Redutores, Embasamento

= 486,51 m³

1.3.2	90108	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015			1.054,70	M3
-------	-------	--	--	--	----------	----

João Pedro Santos de Souza
Engenheiro Civil
RUBR 1 2017107998



MEMÓRIA DE CÁLCULO - 3ª MEDIÇÃO

Pavimentação e Drenagem da Rua Canto do Céu e Rua Morro das Emergências (Parte)

Bairro José Gonçalves

Anexo Memória de Cálculo das Escavações, Reaterros, Embasamento

$$= 1.054,70 \text{ m}^3$$

1.3.3 93379 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADORA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 426,84 M3

Anexo Memória de Cálculo das Escavações, Reaterros, Embasamento

$$= 426,84 \text{ m}^3$$

1.3.4 93381 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADORA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 921,64 M3

Anexo Memória de Cálculo das Escavações, Reaterros, Embasamento

$$= 921,64 \text{ m}^3$$

1.3.5 72844 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE) 0,00 T

Volume a Carregar	Empolamento (%)	Densidade	Total
0,00 m³ x	1,30 m³/m³ x	1,50 T/m³ =	0,00 T
		x 280,91 m	144,06
		-x 1,072,10 m	

1.3.6 72887 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA 0,00 M3XKM

Carga	Distância Média	Total
0,00 m³ x	6,50 km =	0,00 m³ x Km

1.3.7 738171 EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - PO DE PEDRA 84,40 M3

Anexo Memória de Cálculo das Escavações, Reaterros, Embasamento

$$= 84,40 \text{ m}^3$$

1.3.8 95566 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 72,00 M

Anexo Memória de Cálculo das Escavações, Reaterros, Embasamento

$$= 72,00 \text{ m}^3$$

1.3.9 92220 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 220,90 M

Anexo Memória de Cálculo das Escavações, Reaterros, Embasamento

$$= 220,90 \text{ m}^3$$

1.3.10 92221 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 0,00 M

Anexo Memória de Cálculo das Escavações, Reaterros, Embasamento

$$= 0,00 \text{ m}^3$$

João Pedro Santos de Souza
Engenheiro Civil
CREA/RJ 2017107998



MEMÓRIA DE CÁLCULO - 3ª MEDIÇÃO

Pavimentação e Drenagem da Rua Canto do Céu e Rua Morro das Emerências (Parte)

Boiro José Gonçalves

1.3.11 92223 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, AF_12/2015 287,46 M

Anexo Memória de Cálculo das Escavações, Recteiros, Embasamento = 287,46 m³

1.3.12 COMP 01 POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO (15 x 20 x 40cm) COM PAREDES DE 15CM, PARA REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS COM DIMENSÕES INTERNAS DE 1,20M X 1,20M X 1,50M 0,00 UN

1.3.13 COMP 02 POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO (15 x 20 x 40cm) COM PAREDES DE 15CM, PARA REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS COM DIMENSÕES INTERNAS DE 1,20M X 1,20M X 2,00M 2,00 UN

PV 21
PV 36

1.3.14 COMP 03 POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO (15 x 20 x 40cm) COM PAREDES DE 15CM, PARA REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS COM DIMENSÕES INTERNAS DE 1,50M X 1,50M X 1,90M 1,00 UN

1.3.15 COMP 04 POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO (15 x 20 x 40cm) COM PAREDES DE 15CM, PARA REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS COM DIMENSÕES INTERNAS DE 2,00M X 2,00M X 1,20M 0,00 UN

1.3.16 COMP 05 POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO (15 x 20 x 40cm) COM PAREDES DE 15CM, PARA REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS COM DIMENSÕES INTERNAS DE 2,00M X 2,00M X 2,08M 0,00 UN

1.3.17 COMP 06 POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO (15 x 20 x 40cm) COM PAREDES DE 15CM, PARA REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS COM DIMENSÕES INTERNAS DE 1,20M X 1,20M X 2,14M 0,00 UN

1.3.18 COMP 07 POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO (15 x 20 x 40cm) COM PAREDES DE 15CM, PARA REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS COM DIMENSÕES INTERNAS DE 2,00M X 2,00M X 1,87M 0,00 UN

1.3.19 COMP 08 POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO (15 x 20 x 40cm) COM PAREDES DE 15CM, PARA REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS COM DIMENSÕES INTERNAS DE 2,00M X 2,00M X 1,40M 3,00 UN

PV 24
PV 25
PV 26

1.3.20 COMP 09 POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO (15 x 20 x 40cm) COM PAREDES DE 15CM, PARA REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS COM DIMENSÕES INTERNAS DE 2,00M X 2,00M X 1,50M 1,00 UN

PV 29

João Pedro Santos de Souza
Engenheiro Civil
CREA/RJ 2017107998



MEMÓRIA DE CÁLCULO - 3ª MEDIÇÃO

Pavimentação e Drenagem da Rua Canto do Céu e Rua Morro das Emerências (Parte)

Boletim José Gonçalves

1.3.21	COMP 10	POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO (15 x 20 x 40cm) COM PAREDES DE 15CM, PARA REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS COM DIMENSÕES INTERNAS DE 1,20M X 1,20M X 1,20M	4,00	UN
		PV 31		
		PV 33		
		PV 34		
		PV 35		
1.3.22	COMP 11	POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO (15 x 20 x 40cm) COM PAREDES DE 15CM, PARA REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS COM DIMENSÕES INTERNAS DE 1,50M X 1,50M X 2,50M	1,00	UN
		PV 17		
1.3.23	COMP 12	POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO (15 x 20 x 40cm) COM PAREDES DE 15CM, PARA REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS COM DIMENSÕES INTERNAS DE 1,50M X 1,50M X 1,20M	11,00	UN
		PV 18		
1.3.24	COMP 13	POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO (15 x 20 x 40cm) COM PAREDES DE 15CM, PARA REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS COM DIMENSÕES INTERNAS DE 1,50M X 1,50M X 1,30M	1,00	UN
		PV 19		
1.3.25	COMP 14	POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO (15 x 20 x 40cm) COM PAREDES DE 15CM, PARA REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS COM DIMENSÕES INTERNAS DE 1,50M X 1,50M X 2,00M	1,00	UN
		PV 20		
1.3.26	COMP 15	POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO (15 x 20 x 40cm) COM PAREDES DE 15CM, PARA REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS COM DIMENSÕES INTERNAS DE 1,20M X 1,20M X 1,30M	1,00	UN
		PV 32		
1.3.27	83627	TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T; REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P = CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	19,00	UN
1.3.28	COMP 16	CAIXA DE RALO EM CONCRETO PRE-MOLDADO, COM PAREDE DE 0,06M; NAS DIMENSÕES INTERNAS DE (0,30X0,90X0,90)M, PARA ÁGUAS PLUVIAIS, COM BASE EM CONCRETO SIMPLES (FCK=11 MPa), PREENCHIMENTO DA PERIFERIA DA GRELHA EM CONCRETO SIMPLES (FCK=15 MPa), REJUNTE DA BOLSA DO TUBO E DO PESCOÇO DA CAIXA PRE-MOLDADA EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:4, EM VOLUME, GRELHA DE FERRO FUNDIDO DE 135KG, EXCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO.(DESONERADO)	49,00	UN
1.3.29	COMP 17	CAIXA DE AREIA PARA RETENÇÃO DE RESÍDUOS EXECUADA EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL (14 X 19 X 29 CM) COM DIMENSÕES DE 6,00M X 1,00M X 1,20M E TAMPA ESTRUTURADA COM PERFIS METÁLICOS	0,00	UN
1.3.30	85366	DEMOLICAO MANUAL DE PAVIMENTACAO EM CONCRETO ASFALTICO, ESPESSURA 5CM	140,00	M2

João Pedro Santos de Souza

Engenheiro Civil

CREA/RJ 2017107998



MEMÓRIA DE CÁLCULO - 3ª MEDIÇÃO

Pavimentação e Drenagem da Rua Canto do Céu e Rua Morro das Emerências (Parte)

Bairro José Gonçalves

1.3.31 COMP 20 - ARRANCAMENTO E REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍEDOS COM LIMPEZA DE BETUME, ADERENTE SOBRE COLCHÃO DE PO-DE-PEDRA, INCLUINDO FORNECIMENTO DO PO-DE-PEDRA, EXCLUSIVE REJUNTAMENTO E FORNECIMENTO DOS PARALELEPÍEDOS. (DESONERADO) 0,00 M2

PAVIMENTAÇÃO

1.4.1 74154/1 ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 3/4 HP E CACAMBA 6M3, DWT 50 A 200M 0,00 M3

$$6.266,58m^3 \times 0,20m = 1.253,31m^3$$

1.4.2 72844 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE) 0,00 T

Volume a Carregar	Empolamento (30%)	Densidade	Total
0,00 m³ x	1,30 x	1,50 T/m³	= 0,00 T

1.4.3 72887 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA 0,00 M3XKM

Carga	Distância Média	Total
0,00 m³ x	6,50 km =	0,00 m³ x Km

1.4.4 72961 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA 0,00 M2

1.4.5 73817/1 EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - PO DE PEDRA 28,50 M3

$$285,00m^2 \times 0,10m = 28,50m^3$$

1.4.6 73711 BASE PARA PAVIMENTAÇÃO COM BRITA CORRIDA, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO 28,50 M3

$$285,00m^2 \times 0,10m = 28,50m^3$$

1.4.7 94273 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 0,00 M

$$2,39\% \times 3,6m^2$$

1.4.8 94274 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 0,00 M

$$180,50m^2$$

1.4.9 72945 IMPRIMAÇÃO DE BASE DE PAVIMENTAÇÃO COM ADF CM-30 285,00 M2

1.4.10 95993 CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 4,0 CM EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 11,40 M3

João Pedro Santos de Souza
Engenheiro Civil
CPF: 017.107.998-01

[Assinatura]



MEMÓRIA DE CÁLCULO - 3ª MEDIÇÃO

Pavimentação e Drenagem da Rua Canto do Céu e Rua Morro das Emergências (Parte)

Barro José Gonçalves

$285,00m^2 \times 0,04m = 11,40 m^3$

1.4.11 94281 EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 0,00 M

CAIÇADAS E GRAMADOS

1.5.1 85422 PREPARO MANUAL DE TERRENO S/ RASPAGEM SUPERFICIAL 1.198,18m² 0,00 M2

1.5.2 94991 EXECUÇÃO DE PASSO (CAIÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 0,00 M3

$1.198,18m^2 \times 0,08m = 95,85m^3$

SINALIZAÇÃO VIÁRIA

1.6.1 72947 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO 0,00 M2

	Extensão	Largura média	Quantidade	Área
Rua Morro das Emergências Contínua	515,68 m	0,10 m	2,00 =	103,13m ²
Rua Morro das Emergências Seccionada 1:3	515,68 m	0,10 m	1,00 =	13,75m ²
Rua Canto do Céu Contínua	682,50 m	0,10 m	2,00 =	136,50m ²
Rua Canto do Céu Seccionada	682,50 m	0,10 m	1,00 =	18,20m ²

	Área	Quantidade
Travessias - Rua Morro das Emergências	13,44m ²	2,00 =
Travessias - Rua Canto do Céu	13,44m ²	4,00 =
		26,88m ²
		53,76m ²

1.6.2 COMP 18 PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA - FORNECIMENTO E FIXAÇÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, EXCLUSIVE O TUBO 0,00 M2

Placa	Quant.	Dimensões	Área	Área total
 R-19 Velocidade máxima permitida	15 unidades	D= 40cm	0,12	1,8
 R-6a Proibido Estacionar	16 unidades	D= 40cm	0,12	1,92

João Pedro Santos de Souza
Engenheiro Civil
CREA RJ 20171079998



MEMÓRIA DE CÁLCULO - 3ª MEDIÇÃO

Pavimentação e Drenagem da Rua Canto do Céu e Rua Morro das Emerências (Parte)

Bairro José Gonçalves


	R-28 Sentido Duplo de Circulação	9 unidades	D= 40cm	0,12	1,08
	R-33 - Sentido circular na Rotatória	2 unidades	D= 40cm	0,12	0,24
	Placa de logradouro	16 unidades	50cm x 25cm	0,125	2
	Travessia de Pedestres	2 unidades	50cm x 50cm	0,25	0,5
	Rua sem saída	2 unidades	50cm x 50cm	0,25	0,5
					8,04

1.6.3 COMP 19 TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, COM DIÂMETRO DE 2", DIN-2440. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (DESONERADO)

$$62 \text{ placas} \times 2,50\text{m} = 155,00\text{m}$$

0,00 M

CREA/RJ 2017 1079999-8
Engenheiro Civil
José Pedro Santos de Souza



Estado do Rio de Janeiro

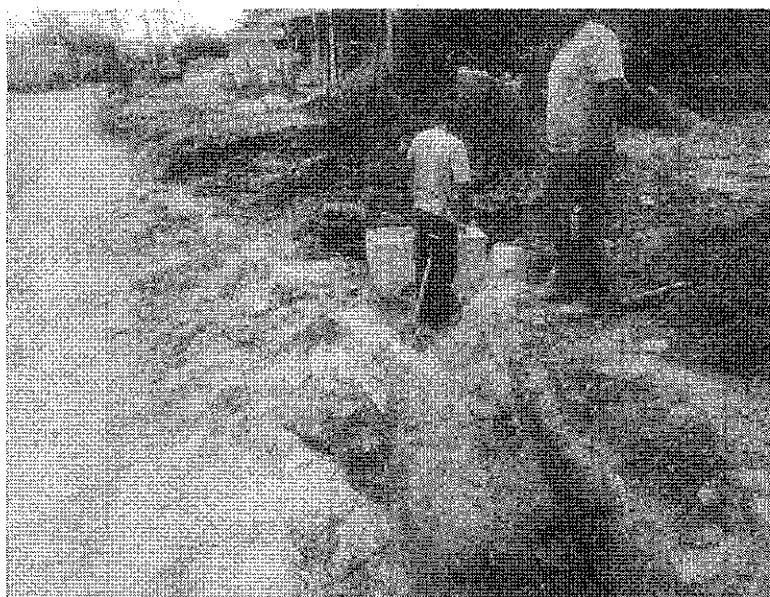
PREFEITURA MUNICIPAL DA ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Obra:	Pavimentação e Drenagem da Rua Canto do Céu e Rua Morro das Emerências
Local:	José Gonçalves
Empresa:	Dafra Construção Serviços e Gerenciamento LTDA-EPP
Engenheiro Fiscal:	João Pedro Souza


RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 3ª MEDIÇÃO


Limpeza do Terreno para Assentamento



Execução de Ramal e CX. Ralo

Folha ___/___	Contratada	Engenheiro da Contratante
------------------	------------	---------------------------


 João Pedro Santos de Souza
 Engenheiro Civil
 CREA/RJ 2017107998



Estado do Rio de Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DA ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Obra: Pavimentação e Drenagem da Rua Canto do Céu e Rua Morro das Emerências

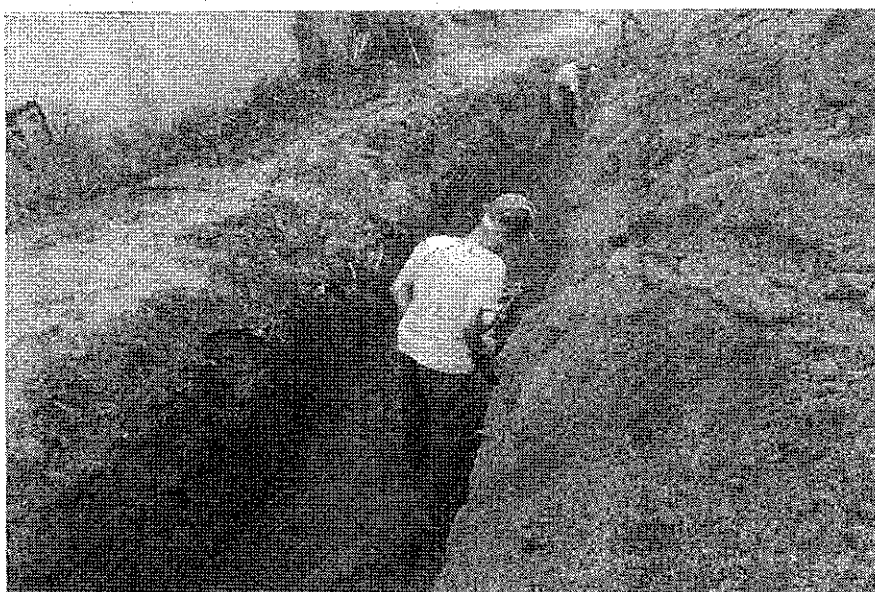
Local: José Gonçalves

Empresa: Dafla Construção Serviços e Gerenciamento LTDA-EPP

Engenheiro Fiscal: João Pedro Souza

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 3ª MEDIÇÃO

Assentamento e Embasamento de Tubulação.



Compactação de Tubulação


Folha

— / —

Contratada

Engenheiro da Contratante

João Pedro Santos de Souza
Engenheiro Civil
CREA/RJ 2017107998



Estado do Rio de Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DA ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Obra:	Pavimentação e Drenagem da Rua Canto do Céu e Rua Morro das Emerências
Local:	José Gonçalves
Empresa:	Dafra Construção Serviços e Gerenciamento LTDA-EPP
Engenheiro Fiscal:	João Pedro Souza

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 3ª MEDIÇÃO


Reaterro da Rua José Gonçalves



Execução de Recomposição de Asfalto na Rua José Gonçalves

Folha ___/___	Contratada	Engenheiro da Contratante
------------------	------------	---------------------------


 João Pedro Santos de Souza
 Engenheiro Civil
 CREA/RJ 2017107998



Estado do Rio de Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DA ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Obra:	Pavimentação e Drenagem da Rua Canto do Céu e Rua Morro das Emerências
Local:	José Gonçalves
Empresa:	Dafla Construção Serviços e Gerenciamento LTDA-EPP
Engenheiro Fiscal:	João Pedro Souza

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 3ª MEDIÇÃO

Preparo de Terreno



Preparo de Terreno e Assentamento de Meio Fio

Folha ___/___	Contratada	Engenheiro da Contratante
------------------	------------	---------------------------

João Pedro Santos de Souza
Engenheiro Civil
CREA/RJ 2017107998



Estado do Rio de Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DA ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

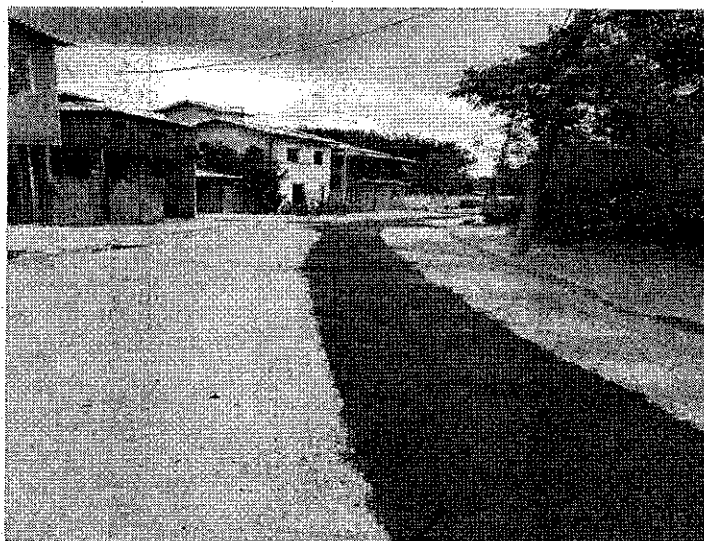
Obra: Pavimentação e Drenagem da Rua Canto do Céu e Rua Morro das Emerências

Local: José Gonçalves

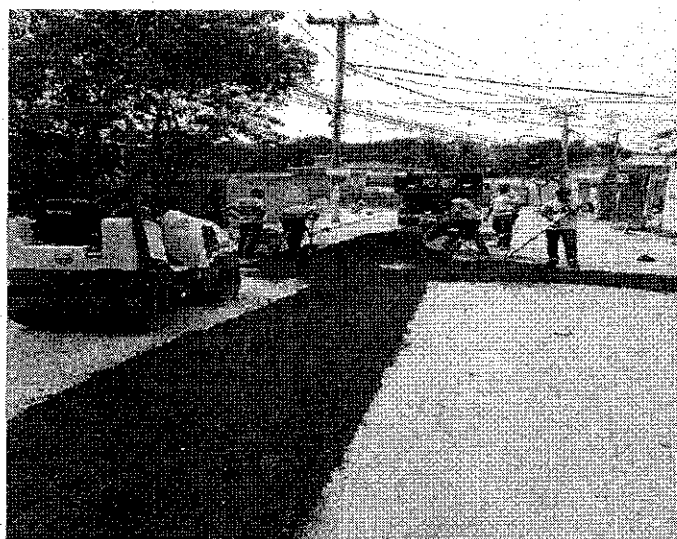
Empresa: Dafla Construção Serviços e Gerenciamento LTDA-EPP

Engenheiro: João Pedro Souza

Fiscal:

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 3ª MEDIÇÃO

Execução de Asfalto



Recomposição de asfalto

Folha

Contratada

Engenheiro da Contratante

João Pedro Santos de Souza
Engenheiro Civil
CRF A/RJ 2017187998



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DAFLA CONSTRUCAO SERVICOS E GERENCIAMENTO LTDA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 12.603.970/0001-60

Certidão n°: 171335629/2019

Expedição: 23/04/2019, às 13:45:36

Validade: 19/10/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que DAFLA CONSTRUCAO SERVICOS E GERENCIAMENTO LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 12.603.970/0001-60, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Dúvidas e sugestões: cdnt@tst.jus.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: DAFLA CONSTRUCAO SERVICOS E GERENCIAMENTO LTDA
CNPJ: 12.603.970/0001-60

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 13:04:55 do dia 01/03/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/08/2019.

Código de controle da certidão: F0CC.A10F.33B7.FC64

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

07/05/2019 09:02

IMPRIMIR

VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF****Inscrição:** 12603970/0001-60**Razão Social:** DAFLA CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E GERENCIAMENTO LTDA EPP**Endereço:** EST FRANCISCO DA CRUZ NUNES 8180 SALA 210 / ITAIPU /
NITEROI / RJ / 24340-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 05/05/2019 a 03/06/2019**Certificação Número:** 2019050503070992933361**Informação obtida em 07/05/2019, às 09:08:43.**

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Armação dos Búzios

CONTRATO Nº

010/2018

OBRA:

25-jun-18

Segunda-Feira

 OBRA DE PAV. E DRENAGEM DA RUA CANTO DO CÉU E RUA MORRO DAS EMERÊNCIAS (PARTE) NO
 ——— BAIRRO JOSÉ GOLÇALVES

TEMPO CLIMA

BOM	X	INSTÁVEL		CHUVOSO		IMPRATICÁVEL	
-----	---	----------	--	---------	--	--------------	--

Pessoal	
Função	Quant.
Engenheiro	1
Encarregado	1
Pedreiro	3
Servente	7
Carpinteiro/Armador	
Alceteiro	

Equipamento	
Descrição	Quant.
Caminhão Toco	1
Compactador sapo	2
Retro escavadeira	1

Serviços Realizados

*EXECUÇÃO DE ESCAÇÃO DO PV-10 AO PV 08

*COLOCAÇÃO DE TUBO DE 600MM

*EMBASAMENTO DE TUBULAÇÃO

*REATERRO MANUAL DE VALA E COMPACTAÇÃO

*EXECUÇÃO DE PV

*PREPARO DO TERRENO PARA RECOMPOSIÇÃO DO PARALELO


*EXECUÇÃO DE SUB-BASE

COMENTÁRIOS DO FISCAL:

COMENTÁRIOS DA EMPRESA:

RESP. PELA EMPRESA

ENG. FISCAL


 João Pedro Santos de Souza
 Engenheiro Civil
 CREA/RJ 2017101998

Armação dos Búzios

CONTRATO Nº

010/2018

OBRA:

26-jun-18

Terça-Feira

OBRA DE PAV. E DRENAGEM DA RUA CANTO DO CÉU E RUA MORRO DAS EMERÊNCIAS (PARTE) NO BAIRRO JOSÉ GOLÇALVES

TEMPO CLIMA

BOM	X	INSTÁVEL		CHUVOSO		IMPRATICÁVEL	
-----	---	----------	--	---------	--	--------------	--

Pessoal	
Função	Quant.
Engenheiro	1
Encarregado	1
Pedreiro	3
Servente	7
Carpinteiro/Armador	
Calceteiro	

Equipamento	
Descrição	Quant.
Caminhão Toco	1
Compactador sapo	2
Retro escavadeira	1

Serviços Realizados

- *EXECUÇÃO DE ESCAÇÃO DO PV-08 AO PV 09 E DO PV 08 AO PV 07
- *COLOCAÇÃO DE TUBO DE 500MM
- *EMBASAMENTO DE TUBULAÇÃO
- *REATERRO MANUAL DE VALA E COMPACTAÇÃO
- *EXECUÇÃO DE PV
- *PREPARO DO TERRENO PARA RECOMPOSIÇÃO DO PARALELO
- *EXECUÇÃO DE SUB-BASE

COMENTÁRIOS DO FISCAL:

COMENTÁRIOS DA EMPRESA:

RESP. PELA EMPRESA

ENG. FISCAL

João Pedro Santos de Souza
 Engenheiro Civil
 CREA/RJ 2017107998

Armação dos Búzios

CONTRATO Nº

010/2018

OBRA:

27-jun-18

Quarta-Feira

OBRA DE PAV. E DRENAGEM DA RUA CANTO DO CÉU E RUA MORRO DAS EMERÊNCIAS (PARTE) NO BAIRRO JOSÉ GOLÇALVES

TEMPO CLIMA

BOM	X	INSTÁVEL		CHUVOSO		IMPRATICÁVEL	
-----	---	----------	--	---------	--	--------------	--

Pessoal	
Função	Quant.
Engenheiro	1
Encarregado	1
Pedreiro	3
Servente	7
Carpinteiro/Armador	
Calceteiro	

Equipamento	
Descrição	Quant.
Caminhão Toco	1
Compactador sapo	2
Retro escavadeira	1

Serviços Realizados

- *EXECUÇÃO DE ESCAÇÃO DO PV-07 AO PV 06 E DO PV 06 AO PV 05
- *COLOCAÇÃO DE TUBO DE 500MM
- *EMBASAMENTO DE TUBULAÇÃO
- *REATERRO MANUAL DE VALA E COMPACTAÇÃO
- *RECOMPOSIÇÃO DO PARALELO

COMENTÁRIOS DO FISCAL:

COMENTÁRIOS DA EMPRESA:

RESP. PELA EMPRESA

ENG. FISCAL


 João Pedro Santos de Souza
 Engenheiro Civil
 CREA/RJ 2017107998



Diário de Obras

DIAS CORRIDO 74

Armação dos Búzios

CONTRATO Nº

010/2018

OBRA:

28-jun-18

Quinta-Feira

OBRA DE PAV. E DRENAGEM DA RUA CANTO DO CÉU E RUA MORRO DAS EMERÊNCIAS (PARTE) NO BAIRRO

TEMPO CLIMA

BOM	X	INSTÁVEL		CHUVOSO		IMPRATICÁVEL	
-----	---	----------	--	---------	--	--------------	--

Pessoal	
Função	Quant.
Engenheiro	1
Encarregado	1
Pedreiro	3
Servente	7
Carpinteiro/Armador	
Calceteiro	

Equipamento	
Descrição	Quant.
Caminhão Toco	1
Compactador sapo	2
Retro escavadeira	1

Serviços Realizados

EXECUÇÃO DE ESCAÇÃO

*COLOCAÇÃO DE TUBO DE 800MM

*EMBASAMENTO DE TUBULAÇÃO

*REATERRO MANUAL DE VALA E COMPACTAÇÃO

*RECOMPOSIÇÃO DO PARALELO

COMENTÁRIOS DO FISCAL:

COMENTÁRIOS DA EMPRESA:

RESP. PELA EMPRESA

ENG. FISCAL

João Pedro Santos de Souza
 Engenheiro Civil
 CREA/RJ 2017107998


DAFLA
 CONSTRUÇÃO | SERVIÇOS | GERENCIAMENTO

Diário de Obras

DIAS CORRIDO 75

Armação dos Búzios

CONTRATO Nº

010/2018

OBRA:

29-jun-18

Sexta-Feira

OBRA DE PAV. E DRENAGEM DA RUA CANTO DO CÉU E RUA MORRO DAS EMERÊNCIAS (PARTE) NO BAIRRO

TEMPO CLIMA

BOM	X	INSTÁVEL		CHUVOSO		IMPRATICÁVEL	
-----	---	----------	--	---------	--	--------------	--

Pessoal	
Função	Quant.
Engenheiro	1
Encarregado	1
Pedreiro	3
Servente	7
Carpinteiro/Armador	
Calceteiro	

Equipamento	
Descrição	Quant.
Caminhão Toco	1
Compactador sapo	2
Retro escavadeira	1

Serviços Realizados

EXECUÇÃO DE ESCAÇÃO

*COLOCAÇÃO DE TUBO DE 800MM

*EMBASAMENTO DE TUBULAÇÃO

*REATERRO MANUAL DE VALA E COMPACTAÇÃO

*RECOMPOSIÇÃO DO PARALELO

COMENTÁRIOS DO FISCAL:

COMENTÁRIOS DA EMPRESA:

RESP. PELA EMPRESA

ENG. FISCAL

João Pedro Santos de Souza
 Engenheiro Civil
 CREA/RJ 2017107998



Diário de Obras

DIAS CORRIDO 76 77

Armação dos Búzios

CONTRATO Nº

010/2018

OBRA

30-jun-18

01-jul-18

Sábado

Domingo

OBRA DE PAV. E DRENAGEM DA RUA CANTO DO CÉU E RUA MORRO DAS EMERÊNCIAS (PARTE) NO BAIRRO

TEMPO CLIMA

BOM

INSTÁVEL

CHUVOSO

IMPRATICÁVEL

Pessoal

Função	Quant.
Engenheiro	
Encarregado	
Pedreiro	
Servente	
Carpinteiro/Armador	
Calceteiro	

Equipamento

Descrição	Quant.
Caminhão Toco	
Compactador sapo	
Retro escavadeira	


Serviços Realizados

COMENTÁRIOS DO FISCAL:

COMENTÁRIOS DA EMPRESA:

RESP. PELA EMPRESA

ENG. FISCAL


 João Pedro Santos de Souza
 Engenheiro Civil
 CREA/RJ 2017107998



Diário de Obras

DIAS CORRIDO 78

Armação dos Búzios

CONTRATO Nº 010/2018

OBRA:

02-jul-18

Segunda-Feira

OBRA DE PAV. E DRENAGEM DA RUA CANTO DO CÉU E RUA MORRO DAS EMERÊNCIAS (PARTE) NO BAIRRO

TEMPO CLIMA

BOM	X	INSTÁVEL		CHUVOSO		IMPRATICÁVEL	
-----	---	----------	--	---------	--	--------------	--

Pessoal	
Função	Quant.
Engenheiro	1
Encarregado	1
Pedreiro	3
Servente	7
Carpinteiro/Armador	
Calceteiro	

Equipamento	
Descrição	Quant.
Caminhão Toco	1
Compactador sapo	2
Retro escavadeira	1

Serviços Realizados

EXECUÇÃO DE ESCAÇÃO DO PV-14 AO PV 13

*COLOCAÇÃO DE TUBO DE 600MM

*EMBASAMENTO DE TUBULAÇÃO

*REATERRO MANUAL DE VALA E COMPACTAÇÃO


*EXECUÇÃO DE PV

COMENTÁRIOS DO FISCAL:

COMENTÁRIOS DA EMPRESA:

RESP. PELA EMPRESA

ENG. FISCAL


 João Pedro Santos de Souza
 Engenheiro Civil
 CREA/RJ 2017107998



Diário de Obras

DIAS CORRIDO 79

Armação dos Búzios

CONTRATO Nº 010/2018

OBRA:

03-jul-18

Terça-Feira

OBRA DE PAV. E DRENAGEM DA RUA CANTO DO CÉU E RUA MORRO DAS EMERÊNCIAS (PARTE) NO BAIRRO

TEMPO CLIMA

BOM	X	INSTÁVEL		CHUVOSO		IMPRATICÁVEL	
-----	---	----------	--	---------	--	--------------	--

Pessoal	
Função	Quant.
Engenheiro	1
Encarregado	1
Pedreiro	3
Servente	7
Carpinteiro/Armador	
Calceteiro	

Equipamento	
Descrição	Quant.
Caminhão Toco	1
Compactador sapo	2
Retro escavadeira	1

Serviços Realizados

COLOCAÇÃO DE TAMPAS DE CONCRETO ARMADO 2 (1,80X1,80)

*COLOCAÇÃO DE TUBO DE 500MM

*EMBASAMENTO DE TUBULAÇÃO

*REATERRO MANUAL DE VALA E COMPACTAÇÃO

*EXECUÇÃO DE PV


COMENTÁRIOS DO FISCAL:

COMENTÁRIOS DA EMPRESA:

RESP. PELA EMPRESA

ENG. FISCAL

João Pedro Santos de Souza
Engenheiro Civil
CREA/RJ 2017107998



Diário de Obras

Armação dos Búzios

DIAS CORRIDO 80

CONTRATO Nº 010/2018

OBRA:

04-jul-18

Quarta-Feira

OBRA DE PAV. E DRENAGEM DA RUA CANTO DO CÉU E RUA MORRO DAS EMERÊNCIAS (PARTE) NO BAIRRO

TEMPO CLIMA

BOM	X	INSTÁVEL		CHUVOSO		IMPRATICÁVEL	
-----	---	----------	--	---------	--	--------------	--

Pessoal	
Função	Quant.
Engenheiro	1
Encarregado	1
Pedreiro	3
Servente	7
Carpinteiro/Armador	
Calceteiro	

Equipamento	
Descrição	Quant.
Caminhão Toco	1
Compactador sapo	2
Retro escavadeira	1

Serviços Realizados

- EXECUÇÃO DE ESCAÇÃO DO PV-14 AO PV 13
- *COLOCAÇÃO DE TUBO DE 500MM
- *EMBASAMENTO DE TUBULAÇÃO
- *REATERRO MANUAL DE VALA E COMPACTAÇÃO
- *EXECUÇÃO DE PV


COMENTÁRIOS DO FISCAL:

COMENTÁRIOS DA EMPRESA:

RESP. PELA EMPRESA

ENG. FISCAL

João Pedro Santos de Souza
Engenheiro Civil
CREA/RJ 2017107998



Diário de Obras

Armação dos Búzios

DIAS CORRIDO 81

CONTRATO Nº 010/2018

OBRA:

05-jul-18

Quinta-Feira

OBRA DE PAV. E DRENAGEM DA RUA CANTO DO CÉU E RUA MORRO DAS EMERÊNCIAS (PARTE) NO BAIRRO

TEMPO CLIMA

BOM	X	INSTÁVEL		CHUVOSO		IMPRATICÁVEL	
-----	---	----------	--	---------	--	--------------	--

Pessoal	
Função	Quant.
Engenheiro	1
Encarregado	1
Pedreiro	3
Servente	7
Carpinteiro/Armador	
Calceteiro	

Equipamento	
Descrição	Quant.
Caminhão Toco	1
Compactador sapo	2
Retro escavadeira	1

Serviços Realizados

- EXECUÇÃO DE ESCAÇÃO DO PV-5
- *COLOCAÇÃO DE TUBO DE 500MM
- *EMBASAMENTO DE TUBULAÇÃO
- *REATERRO MANUAL DE VALA E COMPACTAÇÃO
- *EXECUÇÃO DE PV

COMENTÁRIOS DO FISCAL:

COMENTÁRIOS DA EMPRESA:

RESP. PELA EMPRESA

ENG. FISCAL

João Pedro Santos de Souza
Engenheiro Civil
CREA/RJ 2017107998



Diário de Obras

DIAS CORRIDO 82

Armação dos Búzios

CONTRATO Nº

010/2018

OBRA:

06-jul-18

Sexta-Feira

OBRA DE PAV. E DRENAGEM DA RUA CANTO DO CÉU E RUA MORRO DAS EMERÊNCIAS (PARTE) NO BAIRRO

TEMPO CLIMA

BOM	X	INSTÁVEL		CHUVOSO		IMPRATICÁVEL	
-----	---	----------	--	---------	--	--------------	--

Pessoal	
Função	Quant.
Engenheiro	1
Encarregado	1
Pedreiro	3
Servente	7
Carpinteiro/Armador	
Calceteiro	

Equipamento	
Descrição	Quant.
Caminhão Toco	1
Compactador sapo	2
Retro escavadeira	1

Serviços Realizados

EXECUÇÃO DE TAMPAS DE CONCRETO ARMADO PARA PV'S

*EMBASAMENTO DE TUBULAÇÃO

*REATERRO MANUAL DE VALA E COMPACTAÇÃO


*EXECUÇÃO DE PV

COMENTÁRIOS DO FISCAL:

COMENTÁRIOS DA EMPRESA:

RESP. PELA EMPRESA

ENG. FISCAL


 João Pedro Santos de Souza
 Engenheiro Civil
 CREA/RJ 2017107998



DAFLA

CONSTRUÇÃO | SERVIÇOS | GERENCIAMENTO

Diário de Obras

DIAS CORRIDO 83

84

Armação dos Búzios

CONTRATO Nº

010/2018

OBRA

07-jul-18

08-jul-18

Sábado

Domingo

OBRA DE PAV. E DRENAGEM DA RUA CANTO DO CÉU E RUA MORRO DAS EMERÊNCIAS (PARTE) NO BAIRRO

TEMPO CLIMA

BOM		INSTÁVEL		CHUVOSO		IMPRATICÁVEL	
-----	--	----------	--	---------	--	--------------	--

Pessoal	
Função	Quant.
Engenheiro	
Encarregado	
Pedreiro	
Servente	
Carpinteiro/Armador	
Calceteiro	

Equipamento	
Descrição	Quant.
Caminhão Toco	
Compactador sapo	
Retro escavadeira	


Serviços Realizados

COMENTÁRIOS DO FISCAL:

COMENTÁRIOS DA EMPRESA:

RESP. PELA EMPRESA

ENG. FISCAL


 João Pedro Santos de Souza
 Engenheiro Civil
 CREA/RJ 2017107998

Armação dos Búzios

CONTRATO Nº

010/2018

OBRA:

09-jul-18

Segunda-Feira

OBRA DE PAV. E DRENAGEM DA RUA CANTO DO CÉU E RUA MORRO DAS EMERÊNCIAS (PARTE) NO BAIRRO

TEMPO CLIMA

BOM	X	INSTÁVEL		CHUVOSO		IMPRATICÁVEL	
-----	---	----------	--	---------	--	--------------	--

Pessoal	
Função	Quant.
Engenheiro	1
Encarregado	1
Pedreiro	3
Servente	7
Carpinteiro/Armador	
Calceteiro	

Equipamento	
Descrição	Quant.
Caminhão Toco	1
Compactador sapo	2
Retro escavadeira	1

Serviços Realizados

EXECUÇÃO DE DRENO COM KANAFLEX E BIDIN

COMENTÁRIOS DO FISCAL:

COMENTÁRIOS DA EMPRESA:

RESP. PELA EMPRESA

ENG. FISCAL


 João Pedro Santos de Souza
 Engenheiro Civil
 CREA/RJ 2017107998



Diário de Obras

DIAS CORRIDO 86

CONTRATO Nº 010/2018

Armação dos Búzios

OBRA:

10-jul-18

Terça-Feira

OBRA DE PAV. E DRENAGEM DA RUA CANTO DO CÉU E RUA MORRO DAS EMERÊNCIAS (PARTE) NO BAIRRO

TEMPO CLIMA

BOM		INSTÁVEL		CHUVOSO	X	IMPRATICÁVEL	
-----	--	----------	--	---------	---	--------------	--

Pessoal	
Função	Quant.
Engenheiro	1
Encarregado	1
Pedreiro	3
Servente	7
Carpinteiro/Armador	
Calceteiro	

Equipamento	
Descrição	Quant.
Caminhão Toco	1
Compactador sapo	2
Retro escavadeira	1

Serviços Realizados

CONCLUSÃO DO DRENO


COMENTÁRIOS DO FISCAL:

COMENTÁRIOS DA EMPRESA:

RESP. PELA EMPRESA

ENG. FISCAL

João Pedro Santos de Souza
Engenheiro Civil
CREA/RJ 2017107998



Diário de Obras

DIAS CORRIDO 87

Armação dos Búzios

CONTRATO Nº

010/2018

OBRA:

11-jul-18

Quarta-Feira

OBRA DE PAV. E DRENAGEM DA RUA CANTO DO CÉU E RUA MORRO DAS EMERÊNCIAS (PARTE) NO BAIRRO

TEMPO CLIMA

BOM		INSTÁVEL		CHUVOSO	X	IMPRATICÁVEL	
-----	--	----------	--	---------	---	--------------	--

Pessoal	
Função	Quant.
Engenheiro	1
Encarregado	1
Pedreiro	3
Servente	7
Carpinteiro/Armador	
Calceteiro	

Equipamento	
Descrição	Quant.
Caminhão Toco	1
Compactador sapo	2
Retro escavadeira	1

Serviços Realizados

EXECUÇÃO DE REBAIXAMENTO DE SOLO SATURADO


*EXECUÇÃO DE REFORÇO COM PEDRA DE MÃO

COMENTÁRIOS DO FISCAL:

COMENTÁRIOS DA EMPRESA:

RESP. PELA EMPRESA

ENG. FISCAL


 João Pedro Santos de Souza
 Engenheiro Civil
 CREA/RJ 2017107998

Diário de Obras

DIAS CORRIDO 88

Armação dos Búzios

CONTRATO Nº 010/2018

OBRA:

12-jul-18

Quinta-Feira

OBRA DE PAV. E DRENAGEM DA RUA CANTO DO CÉU E RUA MORRO DAS EMERÊNCIAS (PARTE) NO BAIRRO

TEMPO CLIMA

BOM	INSTÁVEL		CHUVOSO	X	IMPRATICÁVEL	
-----	----------	--	---------	---	--------------	--

Pessoal	
Função	Quant.
Engenheiro	1
Encarregado	1
Pedreiro	3
Servente	7
Carpinteiro/Armador	
Calceteiro	

Equipamento	
Descrição	Quant.
Caminhão Toco	1
Compactador sapo	2
Retro escavadeira	1

Serviços Realizados

EXECUÇÃO DE REDE DE TUBO DE CONCRETO DE 500 MM

*EMBASAMENTO DE TUBULAÇÃO


*REATERRO MANUAL DE VALA E COMPACTAÇÃO

COMENTÁRIOS DO FISCAL:

COMENTÁRIOS DA EMPRESA:

RESP. PELA EMPRESA

ENG. FISCAL


 João Pedro Santos de Souza
 Engenheiro Civil
 CREA/RJ 2017107998



Diário de Obras

Armação dos Búzios

DIAS CORRIDO 89

CONTRATO Nº

010/2018

OBRA:

13-jul-18

Sexta-Feira

OBRA DE PAV. E DRENAGEM DA RUA CANTO DO CÉU E RUA MORRO DAS EMERÊNCIAS (PARTE) NO BAIRRO

TEMPO CLIMA

BOM

INSTÁVEL

CHUVOSO

IMPRATICÁVEL

X

Pessoal

Função	Quant.
Engenheiro	1
Encarregado	1
Pedreiro	3
Servente	7
Carpinteiro/Armador	
Calceteiro	

Equipamento

Descrição	Quant.
Caminhão Toco	1
Compactador sapo	2
Retro escavadeira	1

Serviços Realizados

COMENTÁRIOS DO FISCAL:

COMENTÁRIOS DA EMPRESA:

RESP. PELA EMPRESA

ENG. FISCAL

João Pedro Santos de Souza
Engenheiro Civil
CREA/RJ 2017107998


DAFLA
 CONSTRUÇÃO | SERVIÇOS | GERENCIAMENTO

Diário de Obras

DIAS CORRIDO 90 91

Armação dos Búzios

CONTRATO Nº 010/2018

OBRA 14-jul-18 15-jul-18 Sábado Domingo

OBRA DE PAV. E DRENAGEM DA RUA CANTO DO CÉU E RUA MORRO DAS EMERÊNCIAS (PARTE) NO BAIRRO

TEMPO CLIMA

BOM INSTÁVEL CHUVOSO IMPRATICÁVEL

Pessoal	
Função	Quant.
Engenheiro	
Encarregado	
Pedreiro	
Servente	
Carpinteiro/Armador	
Calçeteiro	

Equipamento	
Descrição	Quant.
Caminhão Toco	
Compactador sapo	
Retro escavadeira	

Serviços Realizados

COMENTÁRIOS DO FISCAL:

COMENTÁRIOS DA EMPRESA:

RESP. PELA EMPRESA

ENG. FISCAL

João Pedro Santos de Souza
 Engenheiro Civil
 CREA/RJ 2017107998


DAFLA

CONSTRUÇÃO | SERVIÇOS | GERENCIAMENTO

Diário de Obras

DIAS CORRIDO 92

Armação dos Búzios

CONTRATO Nº

010/2018

OBRA:

16-jul-18

Segunda-Feira

OBRA DE PAV. E DRENAGEM DA RUA CANTO DO CÉU E RUA MORRO DAS EMERÊNCIAS (PARTE) NO BAIRRO

TEMPO CLIMA

BOM	X	INSTÁVEL		CHUVOSO		IMPRATICÁVEL	
-----	---	----------	--	---------	--	--------------	--

Pessoal

Função	Quant.
Engenheiro	1
Encarregado	1
Pedreiro	3
Servente	7
Carpinteiro/Armador	
Calceteiro	

Equipamento

Descrição	Quant.
Caminhão Toco	1
Compactador sapo	2
Retro escavadeira	1

Serviços Realizados

EXECUÇÃO DE PV 02 E PV 01

*ABERTURA DE PV 25 E PV 24

*COLOCAÇÃO DE TUBO DE 500MM

COMENTÁRIOS DO FISCAL:

COMENTÁRIOS DA EMPRESA:

RESP. PELA EMPRESA

ENG. FISCAL

João Pedro Santos de Souza
 Engenheiro Civil
 CREA/RJ 2017107998



Diário de Obras

DIAS CORRIDO 93

Armação dos Búzios

CONTRATO Nº 010/2018

OBRA:

17-jul-18

Terça-Feira

OBRA DE PAV. E DRENAGEM DA RUA CANTO DO CÉU E RUA MORRO DAS EMERÊNCIAS (PARTE) NO BAIRRO

TEMPO CLIMA

BOM	X	INSTÁVEL		CHUVOSO		IMPRATICÁVEL	
-----	---	----------	--	---------	--	--------------	--

Pessoal	
Função	Quant.
Engenheiro	1
Encarregado	1
Pedreiro	3
Servente	7
Carpinteiro/Armador	
Calceteiro	

Equipamento	
Descrição	Quant.
Caminhão Toco	1
Compactador sapo	2
Retro escavadeira	1

Serviços Realizados


EXECUÇÃO DE PV 25 E PV 24

COMENTÁRIOS DO FISCAL:

COMENTÁRIOS DA EMPRESA:

RESP. PELA EMPRESA

ENG. FISCAL


 João Pedro Santos de Souza
 Engenheiro Civil
 CREA/RJ 2017107995



Diário de Obras

DIAS CORRIDO 94

Armação dos Búzios

CONTRATO Nº

010/2018

OBRA:

18-jul-18

Quarta-Feira

OBRA DE PAV. E DRENAGEM DA RUA CANTO DO CÉU E RUA MORRO DAS EMERÊNCIAS (PARTE) NO BAIRRO

TEMPO CLIMA

BOM	X	INSTÁVEL		CHUVOSO		IMPRATICÁVEL	
-----	---	----------	--	---------	--	--------------	--

Pessoal	
Função	Quant.
Engenheiro	1
Encarregado	1
Pedreiro	3
Servente	7
Carpinteiro/Armador	
Calceteiro	

Equipamento	
Descrição	Quant.
Caminhão Toco	1
Compactador sapo	2
Retro escavadeira	1

serviços Realizados

EXECUÇÃO DE CAIXAS RALO

COMENTÁRIOS DO FISCAL:

COMENTÁRIOS DA EMPRESA:

RESP. PELA EMPRESA

ENG. FISCAL


 João Pedro Santos de Souza
 Engenheiro Civil
 CREA/RJ 2017107998

Armação dos Búzios

CONTRATO Nº

010/2018

OBRA:

19-jul-18

Quinta-Feira

OBRA DE PAV. E DRENAGEM DA RUA CANTO DO CÉU E RUA MORRO DAS EMERÊNCIAS (PARTE) NO BAIRRO

TEMPO CLIMA

BOM	X	INSTÁVEL		CHUVOSO		IMPRATICÁVEL	
-----	---	----------	--	---------	--	--------------	--

Pessoal	
Função	Quant.
Engenheiro	1
Encarregado	1
Pedreiro	3
Servente	7
Carpinteiro/Armador	
Calceteiro	

Equipamento	
Descrição	Quant.
Caminhão Toco	1
Compactador sapo	2
Retro escavadeira	1

Serviços Realizados

EXECUÇÃO DE PV 23

COMENTÁRIOS DO FISCAL:

COMENTÁRIOS DA EMPRESA:

RESP. PELA EMPRESA

ENG. FISCAL


 João Pedro Santos de Souza
 Engenheiro Civil
 CREA/RJ 2017107998



Diário de Obras

DIAS CORRIDO 97 98

Armação dos Búzios

CONTRATO Nº 010/2018

OBRA 21-jul-18 22-jul-18 Sábado Domingo

OBRA DE PAV. E DRENAGEM DA RUA CANTO DO CÉU E RUA MORRO DAS EMERÊNCIAS (PARTE) NO BAIRRO

TEMPO CLIMA

BOM INSTÁVEL CHUVOSO IMPRATICÁVEL

Pessoal	
Função	Quant.
Engenheiro	
Encarregado	
Pedreiro	
Servente	
Carpinteiro/Armador	
Calceteiro	

Equipamento	
Descrição	Quant.
Caminhão Toco	
Compactador sapo	
Retro escavadeira	


Serviços Realizados

COMENTÁRIOS DO FISCAL:

COMENTÁRIOS DA EMPRESA:

RESP. PELA EMPRESA

ENG. FISCAL


 João Pedro Santos de Souza
 Engenheiro Civil
 CREA/RJ 2017407998



Diário de Obras

DIAS CORRIDO 96

Armação dos Búzios

CONTRATO Nº

010/2018

OBRA:

20-jul-18

Sexta-Feira

OBRA DE PAV. E DRENAGEM DA RUA CANTO DO CÉU E RUA MORRO DAS EMERÊNCIAS (PARTE) NO BAIRRO

TEMPO CLIMA

BOM	X	INSTÁVEL		CHUVOSO		IMPRATICÁVEL	
-----	---	----------	--	---------	--	--------------	--

Pessoal	
Função	Quant.
Engenheiro	1
Encarregado	1
Pedreiro	3
Servente	7
Carpinteiro/Armador	
Calceteiro	

Equipamento	
Descrição	Quant.
Caminhão Toco	1
Compactador sapo	2
Retro escavadeira	1

Serviços Realizados

EXECUÇÃO DE LIMPEZA DAS RUAS CANTINHO DO CÉU E ESTRADA DAS EMERÊNCIAS

COMENTÁRIOS DO FISCAL:

COMENTÁRIOS DA EMPRESA:

RESP. PELA EMPRESA

ENG. FISCAL


 João Pedro Santos de Souza
 Engenheiro Civil
 CREA/RJ 2017107998



Diário de Obras

DIAS CORRIDO 99

Armação dos Búzios

CONTRATO Nº

010/2018

OBRA:

23-jul-18

Segunda-Feira

OBRA DE PAV. E DRENAGEM DA RUA CANTO DO CÉU E RUA MORRO DAS EMERÊNCIAS (PARTE) NO BAIRRO

TEMPO CLIMA

BOM	X	INSTÁVEL		CHUVOSO		IMPRATICÁVEL	
-----	---	----------	--	---------	--	--------------	--

Pessoal	
Função	Quant.
Engenheiro	1
Encarregado	1
Pedreiro	3
Servente	7
Carpinteiro/Armador	
Calceteiro	

Equipamento	
Descrição	Quant.
Caminhão Toco	1
Compactador sapo	2
Retro escavadeira	1

Serviços Realizados


EXECUÇÃO DOS PV'S, 22, 21 E 20

COMENTÁRIOS DO FISCAL:

COMENTÁRIOS DA EMPRESA:

RESP. PELA EMPRESA

ENG. FISCAL


 João Pedro Santos de Souza
 Engenheiro Civil
 CREA/RJ 2017107998


DAFLA
 CONSTRUÇÃO | SERVIÇOS | GERENCIAMENTO

Diário de Obras

DIAS CORRIDO 100

Armação dos Búzios

CONTRATO Nº

010/2018

OBRA:

24-jul-18

Terça-Feira

OBRA DE PAV. E DRENAGEM DA RUA CANTO DO CÉU E RUA MORRO DAS EMERÊNCIAS (PARTE) NO BAIRRO

TEMPO CLIMA

BOM	X	INSTÁVEL		CHUVOSO		IMPRATICÁVEL	
-----	---	----------	--	---------	--	--------------	--

Pessoal

Função	Quant.
Engenheiro	1
Encarregado	1
Pedreiro	3
Servente	7
Carpinteiro/Armador	
Calceteiro	

Equipamento

Descrição	Quant.
Caminhão Toco	1
Compactador sapo	2
Retro escavadeira	1

Serviços Realizados

ATERRAMENTO DAS MANILHAS DO PV 23 AO PV 20 COM BRITA CORRIDA

COMENTÁRIOS DO FISCAL:

COMENTÁRIOS DA EMPRESA:

RESP. PELA EMPRESA

ENG. FISCAL

João Pedro Santos de Souza
 Engenheiro Civil
 CREA/RJ 2017107998



Diário de Obras

DIAS CORRIDO 101

Armação dos Búzios

CONTRATO Nº

010/2018

OBRA:

25-jul-18

Quarta-Feira

OBRA DE PAV. E DRENAGEM DA RUA CANTO DO CÉU E RUA MORRO DAS EMERÊNCIAS (PARTE) NO BAIRRO

TEMPO CLIMA

BOM	X	INSTÁVEL		CHUVOSO		IMPRATICÁVEL	
-----	---	----------	--	---------	--	--------------	--

Pessoal	
Função	Quant.
Engenheiro	1
Encarregado	1
Pedreiro	3
Servente	7
Carpinteiro/Armador	
Calceteiro	

Equipamento	
Descrição	Quant.
Caminhão Toco	1
Compactador sapo	2
Retro escavadeira	1

Serviços Realizados


COLOCAÇÃO DE TAMPAS DE CONCRETO ARMADO NOS PV'S: 22, 21 E 20

COMENTÁRIOS DO FISCAL:

COMENTÁRIOS DA EMPRESA:

RESP. PELA EMPRESA

ENG. FISCAL


 João Pedro Santos de Souza
 Engenheiro Civil
 CREA/RJ 2017107998



Diário de Obras

DIAS CORRIDO 102

Armação dos Búzios

CONTRATO Nº

010/2018

OBRA:

26-jul-18

Quinta-Feira

OBRA DE PAV. E DRENAGEM DA RUA CANTO DO CÉU E RUA MORRO DAS EMERÊNCIAS (PARTE) NO BAIRRO

TEMPO CLIMA

BOM	X	INSTÁVEL		CHUVOSO		IMPRATICÁVEL	
-----	---	----------	--	---------	--	--------------	--

Pessoal

Função	Quant.
Engenheiro	1
Encarregado	1
Pedreiro	3
Servente	7
Carpinteiro/Armador	
Calceteiro	

Equipamento

Descrição	Quant.
Caminhão Toco	1
Compactador sapo	2
Retro escavadeira	1

Serviços Realizados

ABERTURA DE VALA DO PV 19 AO PV 18

COMENTÁRIOS DO FISCAL:

COMENTÁRIOS DA EMPRESA:

RESP. PELA EMPRESA

ENG. FISCAL

João Pedro Santos de Souza
Engenheiro Civil
CREA/RJ 2017107998


DAFLA
 CONSTRUÇÃO | SERVIÇOS | GERENCIAMENTO

Diário de Obras

DIAS CORRIDO 103

Armação dos Búzios

CONTRATO Nº 010/2018

OBRA:

27-jul-18

Sexta-Feira

OBRA DE PAV. E DRENAGEM DA RUA CANTO DO CÉU E RUA MORRO DAS EMERÊNCIAS (PARTE) NO BAIRRO

TEMPO CLIMA

BOM	X	INSTÁVEL		CHUVOSO		IMPRATICÁVEL	
-----	---	----------	--	---------	--	--------------	--

Pessoal	
Função	Quant.
Engenheiro	1
Encarregado	1
Pedreiro	3
Servente	7
Carpinteiro/Armador	
Calceteiro	

Equipamento	
Descrição	Quant.
Caminhão Toco	1
Compactador sapo	2
Retro escavadeira	1

Serviços Realizados

ABERTURA DE VALA ENTRE PV 18 E PV 17

COMENTÁRIOS DO FISCAL:

COMENTÁRIOS DA EMPRESA:

RESP. PELA EMPRESA

ENG. FISCAL

João Pedro Santos de Souza
 Engenheiro Civil
 CREA/RJ 2017107998



Diário de Obras

DIAS CORRIDO 104 105

Armação dos Búzios

CONTRATO Nº 010/2018

OBRA 28-jul-18 29-jul-18 Sábado Domingo

OBRA DE PAV. E DRENAGEM DA RUA CANTO DO CÉU E RUA MORRO DAS EMERÊNCIAS (PARTE) NO BAIRRO

TEMPO CLIMA

BOM INSTÁVEL CHUVOSO IMPRATICÁVEL

Pessoal	
Função	Quant.
Engenheiro	
Encarregado	
Pedreiro	
Servente	
Carpinteiro/Armador	
Calceteiro	

Equipamento	
Descrição	Quant.
Caminhão Toco	
Compactador sapo	
Retro escavadeira	

Serviços Realizados

COMENTÁRIOS DO FISCAL:

COMENTÁRIOS DA EMPRESA:

RESP. PELA EMPRESA

ENG. FISCAL

João Pedro Santos de Souza
Engenheiro Civil
CREA/RJ 2017107998



Diário de Obras

DIAS CORRIDO 106

Armação dos Búzios

CONTRATO Nº 010/2018

OBRA:

30-jul-18

Segunda-Feira

OBRA DE PAV. E DRENAGEM DA RUA CANTO DO CÉU E RUA MORRO DAS EMERÊNCIAS (PARTE) NO BAIRRO

TEMPO CLIMA

BOM	X	INSTÁVEL		CHUVOSO		IMPRATICÁVEL	
-----	---	----------	--	---------	--	--------------	--

Pessoal	
Função	Quant.
Engenheiro	1
Encarregado	1
Pedreiro	3
Servente	7
Carpinteiro/Armador	
Calceteiro	

Equipamento	
Descrição	Quant.
Caminhão Toco	1
Compactador sapo	2
Retro escavadeira	1

Serviços Realizados

EXECUÇÃO DOS PV'S 19 E 18

*CONSRTO DA REDE DA PROLAGOS

COMENTÁRIOS DO FISCAL:

COMENTÁRIOS DA EMPRESA:

RESP. PELA EMPRESA

ENG. FISCAL

João Pedro Santos de Souza
 Engenheiro Civil
 CREA/RJ 2017107998


DAFLA

CONSTRUÇÃO | SERVIÇOS | GERENCIAMENTO

Diário de Obras

DIAS CORRIDO 107

Armação dos Búzios

CONTRATO Nº

010/2018

OBRA:

31-jul-18

Terça-Feira

OBRA DE PAV. E DRENAGEM DA RUA CANTO DO CÉU E RUA MORRO DAS EMERÊNCIAS (PARTE) NO BAIRRO

TEMPO CLIMA

BOM	X	INSTÁVEL		CHUVOSO		IMPRATICÁVEL	
-----	---	----------	--	---------	--	--------------	--

Pessoal	
Função	Quant.
Engenheiro	1
Encarregado	1
Pedreiro	3
Servente	7
Carpinteiro/Armador	
Calceteiro	

Equipamento	
Descrição	Quant.
Caminhão Toco	1
Compactador sapo	2
Retro escavadeira	1

Serviços Realizados

EXECUÇÃO DO PV 17

COMENTÁRIOS DO FISCAL:

COMENTÁRIOS DA EMPRESA:

RESP. PELA EMPRESA

ENG. FISCAL

João Pedro Santos de Souza
 Engenheiro Civil
 CREA/RJ 2017407998


DAFLA

CONSTRUÇÃO | SERVIÇOS | GERENCIAMENTO

Diário de Obras

DIAS CORRIDO 108

Armação dos Búzios

CONTRATO Nº

010/2018

OBRA:

01-ago-18

Quarta-Feira

OBRA DE PAV. E DRENAGEM DA RUA CANTO DO CÉU E RUA MORRO DAS EMERÊNCIAS (PARTE) NO BAIRRO

TEMPO CLIMA

BOM		INSTÁVEL		CHUVOSO		IMPRATICÁVEL	X
-----	--	----------	--	---------	--	--------------	---

Pessoal

Função	Quant.
Engenheiro	1
Encarregado	1
Pedreiro	3
Servente	7
Carpinteiro/Armador	
Calceteiro	

Equipamento

Descrição	Quant.
Caminhão Toco	1
Compactador sapo	2
Retro escavadeira	1

Serviços Realizados

COMENTÁRIOS DO FISCAL:

COMENTÁRIOS DA EMPRESA:

RESP. PELA EMPRESA

ENG. FISCAL

João Pedro Santos de Souza
 Engenheiro Civil
 CREA/RJ 2017107998



Diário de Obras

DÍAS CORRIDO 109

Armação dos Búzios

CONTRATO Nº

010/2018

OBRA:

02-ago-18

Quinta-Feira

OBRA DE PAV. E DRENAGEM DA RUA CANTO DO CÉU E RUA MORRO DAS EMERÊNCIAS (PARTE) NO BAIRRO

TEMPO CLIMA

BOM		INSTÁVEL		CHUVOSO		IMPRATICÁVEL	X
-----	--	----------	--	---------	--	--------------	---

Pessoal	
Função	Quant.
Engenheiro	1
Encarregado	1
Pedreiro	3
Servente	7
Carpinteiro/Armador	
Calceteiro	

Equipamento	
Descrição	Quant.
Caminhão Toco	1
Compactador sapo	2
Retro escavadeira	1

Serviços Realizados

COLOCAÇÃO DOS TAMPÕES DE FERRO FUNDIDO

* EXECUÇÃO DE TAMPAS DE CONCRETO ARMADO

* DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO DE 500 MM

COMENTÁRIOS DO FISCAL:

COMENTÁRIOS DA EMPRESA:

RESP. PELA EMPRESA

ENG. FISCAL


 João Pedro Santos de Souza
 Engenheiro Civil
 CREA/RJ 2017107998



Diário de Obras

DIAS CORRIDO 110

Armação dos Búzios

CONTRATO Nº

010/2018

OBRA:

03-ago-18

Sexta-Feira

OBRA DE PAV. E DRENAGEM DA RUA CANTO DO CÉU E RUA MORRO DAS EMERÊNCIAS (PARTE) NO BAIRRO

TEMPO CLIMA

BOM		INSTÁVEL		CHUVOSO	X	IMPRATICÁVEL	
-----	--	----------	--	---------	---	--------------	--

Pessoal	
Função	Quant.
Engenheiro	1
Encarregado	1
Pedreiro	3
Servente	7
Carpinteiro/Armador	
Calceteiro	

Equipamento	
Descrição	Quant.
Caminhão Toco	1
Compactador sapo	2
Retro escavadeira	1

Serviços Realizados

COLOCAÇÃO DE TAMPA DE CONCRETO ARMADO NOS PV'S: 18 E 17

*DESCARGA DE TUBOS DE 800 MM

COMENTÁRIOS DO FISCAL:

COMENTÁRIOS DA EMPRESA:

RESP. PELA EMPRESA

ENG. FISCAL

João Pedro Santos de Souza
Engenheiro Civil
CREA/RJ 2017107998



Diário de Obras

DIAS CORRIDO 111 112

Armação dos Búzios

CONTRATO Nº 010/2018

OBRA 04-ago-18 05-ago-18 Sábado Domingo

OBRA DE PAV. E DRENAGEM DA RUA CANTO DO CÉU E RUA MORRO DAS EMERÊNCIAS (PARTE) NO BAIRRO

TEMPO CLIMA

BOM INSTÁVEL CHUVOSO IMPRATICÁVEL

Pessoal

Função	Quant.
Engenheiro	
Encarregado	
Pedreiro	
Servente	
Carpinteiro/Armador	
Calceteiro	

Equipamento

Descrição	Quant.
Caminhão Toco	
Compactador sapo	
Retro escavadeira	

Serviços Realizados

COMENTÁRIOS DO FISCAL:

COMENTÁRIOS DA EMPRESA:

RESP. PELA EMPRESA

ENG. FISCAL

João Pedro Santos de Souza
Engenheiro Civil
CREA/RJ 2017107998



Diário de Obras

DIAS CORRIDO 113

Armação dos Búzios

CONTRATO Nº

010/2018

OBRA:

06-ago-18

Segunda-Feira

OBRA DE PAV. E DRENAGEM DA RUA CANTO DO CÉU E RUA MORRO DAS EMERÊNCIAS (PARTE) NO BAIRRO

TEMPO CLIMA

BOM		INSTÁVEL	X	CHUVOSO		IMPRATICÁVEL	
-----	--	----------	---	---------	--	--------------	--

Pessoal	
Função	Quant.
Engenheiro	1
Encarregado	1
Pedreiro	3
Servente	7
Carpinteiro/Armador	
Calceteiro	

Equipamento	
Descrição	Quant.
Caminhão Toco	1
Compactador sapo	2
Retro escavadeira	1

Serviços Realizados


COLOCAÇÃO DE TUBOS DE 800 MM ENTRE PV 17 E PV 16

COMENTÁRIOS DO FISCAL:

COMENTÁRIOS DA EMPRESA:

RESP. PELA EMPRESA

ENG. FISCAL


 João Pedro Santos de Souza
 Engenheiro Civil
 CREA/RJ 2017107498



Diário de Obras

DIAS CORRIDO 114

Armação dos Búzios

CONTRATO Nº

010/2018

OBRA:

07-ago-18

Terça-Feira

OBRA DE PAV. E DRENAGEM DA RUA CANTO DO CÉU E RUA MORRO DAS EMERÊNCIAS (PARTE) NO BAIRRO

TEMPO CLIMA

BOM		INSTÁVEL		CHUVOSO		IMPRATICÁVEL	X
-----	--	----------	--	---------	--	--------------	---

Pessoal	
Função	Quant.
Engenheiro	1
Encarregado	1
Pedreiro	3
Servente	7
Carpinteiro/Armador	
Calceteiro	

Equipamento	
Descrição	Quant.
Caminhão Toco	1
Compactador sapo	2
Retro escavadeira	1

Serviços Realizados


DESCARGA DE TUBOS DE 500 MM

COMENTÁRIOS DO FISCAL:

COMENTÁRIOS DA EMPRESA:

RESP. PELA EMPRESA

ENG. FISCAL


 João Pedro Santos de Souza
 Engenheiro Civil
 CREA/RJ 2017107998



Diário de Obras

DIAS CORRIDO 115

CONTRATO Nº 010/2018

Armação dos Búzios

OBRA:

08-ago-18

Quarta-Feira

OBRA DE PAV. E DRENAGEM DA RUA CANTO DO CÉU E RUA MORRO DAS EMERÊNCIAS (PARTE) NO BAIRRO

TEMPO CLIMA

BOM	X	INSTÁVEL		CHUVOSO		IMPRATICÁVEL	
-----	---	----------	--	---------	--	--------------	--

Pessoal	
Função	Quant.
Engenheiro	1
Encarregado	1
Pedreiro	3
Servente	7
Carpinteiro/Armador	
Calceteiro	

Equipamento	
Descrição	Quant.
Caminhão Toco	1
Compactador sapo	2
Retro escavadeira	1

Serviços Realizados

EXECUÇÃO DE DRENAGEM DO PV 16 AO PV 15

COMENTÁRIOS DO FISCAL:

COMENTÁRIOS DA EMPRESA:

RESP. PELA EMPRESA

ENG. FISCAL

João Pedro Santos de Souza
Engenheiro Civil
CREA/RJ - 2017107998



Diário de Obras

DIAS CORRIDO 116

Armação dos Búzios

CONTRATO Nº 010/2018

OBRA: 09-ago-18 Quinta-Feira

OBRA DE PAV. E DRENAGEM DA RUA CANTO DO CÉU E RUA MORRO DAS EMERÊNCIAS (PARTE) NO BAIRRO

TEMPO CLIMA

BOM	X	INSTÁVEL		CHUVOSO		IMPRATICÁVEL	
-----	---	----------	--	---------	--	--------------	--

Pessoal	
Função	Quant.
Engenheiro	1
Encarregado	1
Pedreiro	3
Servente	7
Carpinteiro/Armador	
Calceteiro	

Equipamento	
Descrição	Quant.
Caminhão Toco	1
Compactador sapo	2
Retro escavadeira	1

Serviços Realizados

EXECUÇÃO DOS PV'S 17 E 16
* ATERRAMENTO E COMPACTAÇÃO DE VALA DE DRENAGEM

COMENTÁRIOS DO FISCAL:

COMENTÁRIOS DA EMPRESA:

RESP. PELA EMPRESA

ENG. FISCAL

João Pedro Santos de Souza
Engenheiro Civil
CREA/RJ 2017107938


DAFLA
 CONSTRUÇÃO | SERVIÇOS | GERENCIAMENTO

Diário de Obras

DIAS CORRIDO 117

Armação dos Búzios

CONTRATO Nº

010/2018

OBRA:

10-ago-18

Sexta-Feira

OBRA DE PAV. E DRENAGEM DA RUA CANTO DO CÉU E RUA MORRO DAS EMERÊNCIAS (PARTE) NO BAIRRO

TEMPO CLIMA

BOM	X	INSTÁVEL		CHUVOSO		IMPRATICÁVEL	
-----	---	----------	--	---------	--	--------------	--

Pessoal

Função	Quant.
Engenheiro	1
Encarregado	1
Pedreiro	3
Servente	7
Carpinteiro/Armador	
Calceteiro	

Equipamento

Descrição	Quant.
Caminhão Toco	1
Compactador sapo	2
Retro escavadeira	1

Serviços Realizados

ABERTURA DO PV 15

COMENTÁRIOS DO FISCAL:

COMENTÁRIOS DA EMPRESA:

RESP. PELA EMPRESA

ENG. FISCAL

João Pedro Santos de Souza
 Engenheiro Civil
 CREA/RJ 2017107998



Diário de Obras

DIAS CORRIDO 118 119

Armação dos Búzios

CONTRATO Nº

010/2018

OBRA

11-ago-18

12-ago-18

Sabado

Domingo

OBRA DE PAV. E DRENAGEM DA RUA CANTO DO CÉU E RUA MORRO DAS EMERÊNCIAS (PARTE) NO
BAIRRO JOSÉ GOLÇALVES

TEMPO CLIMA

BOM		INSTÁVEL		CHUVOSO		IMPRATICÁVEL	
-----	--	----------	--	---------	--	--------------	--

Pessoal	
Função	Quant.
Engenheiro	
Encarregado	
Pedreiro	
Servente	
Carpinteiro/Armador	
Alceteiro	

Equipamento	
Descrição	Quant.
Caminhão Toco	
Compactador sapo	
Retro escavadeira	

Serviços Realizados

COMENTÁRIOS DO FISCAL:

COMENTÁRIOS DA EMPRESA:

RESP. PELA EMPRESA

ENG. FISCAL

João Pedro Santos de Souza
Engenheiro Civil
CREA/RJ 2017107998



Diário de Obras

DIAS CORRIDO 120

Armação dos Búzios

CONTRATO Nº

010/2018

OBRA:

13-ago-18

Segunda-Feira

OBRA DE PAV. E DRENAGEM DA RUA CANTO DO CÉU E RUA MORRO DAS EMERÊNCIAS (PARTE) NO BAIRRO

TEMPO CLIMA

BOM	X	INSTÁVEL		CHUVOSO		IMPRATICÁVEL	
-----	---	----------	--	---------	--	--------------	--

Pessoal	
Função	Quant.
Engenheiro	1
Encarregado	1
Pedreiro	3
Servente	7
Carpinteiro/Armador	
Calceteiro	

Equipamento	
Descrição	Quant.
Caminhão Toco	1
Compactador sapo	2
Retro escavadeira	1

Serviços Realizados

COLOCAÇÃO DE TUBOS DE 500 MM ENTRE PV 15 ao PV 30

COMENTÁRIOS DO FISCAL:

COMENTÁRIOS DA EMPRESA:

RESP. PELA EMPRESA

ENG. FISCAL

João Pedro Santos de Souza
Engenheiro Civil
CREA/RJ 2017107998


DAFLA

CONSTRUÇÃO | SERVIÇOS | GERENCIAMENTO

Diário de Obras

DIAS CORRIDO 121

Armação dos Búzios

CONTRATO Nº

010/2018

OBRA:

14-ago-18

Terça-Feira

OBRA DE PAV. E DRENAGEM DA RUA CANTO DO CÉU E RUA MORRO DAS EMERÊNCIAS (PARTE) NO BAIRRO

TEMPO CLIMA

BOM	X	INSTÁVEL		CHUVOSO		IMPRATICÁVEL	
-----	---	----------	--	---------	--	--------------	--

Pessoal

Função	Quant.
Engenheiro	1
Encarregado	1
Pedreiro	3
Servente	7
Carpinteiro/Armador	
Calceteiro	

Equipamento

Descrição	Quant.
Caminhão Toco	1
Compactador sapo	2
Retro escavadeira	1

Serviços Realizados

COLOCAÇÃO DE TUBOS DE 500 MM ENTRE PV 30 ao PV 31

COMENTÁRIOS DO FISCAL:

COMENTÁRIOS DA EMPRESA:

RESP. PELA EMPRESA

ENG. FISCAL

João Pedro Santos de Souza
 Engenheiro Civil
 CREA/RJ 2017107998



Diário de Obras

DIAS CORRIDO 122

Armação dos Búzios

CONTRATO Nº

010/2018

OBRA:

15-ago-18

Quarta-Feira

OBRA DE PAV. E DRENAGEM DA RUA CANTO DO CÉU E RUA MORRO DAS EMERÊNCIAS (PARTE) NO BAIRRO

TEMPO CLIMA

BOM	X	INSTÁVEL		CHUVOSO		IMPRATICÁVEL	
-----	---	----------	--	---------	--	--------------	--

Pessoal	
Função	Quant.
Engenheiro	1
Encarregado	1
Pedreiro	3
Servente	7
Carpinteiro/Armador	
Calceteiro	

Equipamento	
Descrição	Quant.
Caminhão Toco	1
Compactador sapo	2
Retro escavadeira	1

Serviços Realizados

EXECUÇÃO DOS PV'S 30 E 31

COMENTÁRIOS DO FISCAL:

COMENTÁRIOS DA EMPRESA:

RESP. PELA EMPRESA

ENG. FISCAL

João Pedro Santos de Souza
 Engenheiro Civil
 CREA/RJ 2017107998



DAFLA
CONSTRUÇÃO | SERVIÇOS | GERENCIAMENTO

Diário de Obras

DIAS CORRIDO 123

Armação dos Búzios

CONTRATO Nº

010/2018

OBRA:

16-ago-18

Quinta-Feira

OBRA DE PAV. E DRENAGEM DA RUA CANTO DO CÉU E RUA MORRO DAS EMERÊNCIAS (PARTE) NO BAIRRO

TEMPO CLIMA

BOM	X	INSTÁVEL		CHUVOSO		IMPRATICÁVEL	
-----	---	----------	--	---------	--	--------------	--

Pessoal	
Função	Quant.
Engenheiro	1
Encarregado	1
Pedreiro	3
Servente	7
Carpinteiro/Armador	
Calceteiro	

Equipamento	
Descrição	Quant.
Caminhão Toco	1
Compactador sapo	2
Retro escavadeira	1

Serviços Realizados

COLOCAÇÃO DE TUBOS DE 500 MM DO PV 31 AO PV 32

COMENTÁRIOS DO FISCAL:

COMENTÁRIOS DA EMPRESA:

RESP. PELA EMPRESA

ENG. FISCAL

João Pedro Santos de Souza
Engenheiro Civil
CREA/RJ 2017107998

Armação dos Búzios

CONTRATO Nº

010/2018

OBRA:

17-ago-18

Sexta-Feira

OBRA DE PAV. E DRENAGEM DA RUA CANTO DO CÉU E RUA MORRO DAS EMERÊNCIAS (PARTE) NO BAIRRO

TEMPO CLIMA

BOM	X	INSTÁVEL		CHUVOSO		IMPRATICÁVEL	
-----	---	----------	--	---------	--	--------------	--

Pessoal	
Função	Quant.
Engenheiro	1
Encarregado	1
Pedreiro	3
Servente	7
Carpinteiro/Armador	
Calceteiro	

Equipamento	
Descrição	Quant.
Caminhão Toco	1
Compactador sapo	2
Retro escavadeira	1

Serviços Realizados


* EXECUÇÃO DO PV 32

COMENTÁRIOS DO FISCAL:

COMENTÁRIOS DA EMPRESA:

RESP. PELA EMPRESA

ENG. FISCAL


 João Pedro Santos de Souza
 Engenheiro Civil
 CREA/RJ 2017107998



Diário de Obras

DIAS CORRIDO 125 126

Armação dos Búzios

CONTRATO Nº

010/2018

OBRA

18-ago-18

19-ago-18

Sabado

Domingo

OBRA DE PAV. E DRENAGEM DA RUA CANTO DO CÉU E RUA MORRO DAS EMERÊNCIAS (PARTE) NO
BAIRRO JOSÉ GOLÇALVES

TEMPO CLIMA

BOM		INSTÁVEL		CHUVOSO		IMPRATICÁVEL	
-----	--	----------	--	---------	--	--------------	--

Pessoal	
Função	Quant.
Engenheiro	
Encarregado	
Pedreiro	
Servente	
Carpinteiro/Armador	
Calçeteiro	

Equipamento	
Descrição	Quant.
Caminhão Toco	
Compactador sapo	
Retro escavadeira	

Serviços Realizados

COMENTÁRIOS DO FISCAL:

COMENTÁRIOS DA EMPRESA:

RESP. PELA EMPRESA

ENG. FISCAL

João Pedro Santos de Souza
Engenheiro Civil
CREA/RJ 2017107998

Armação dos Búzios

CONTRATO Nº 010/2018

OBRA:

20-ago-18

Segunda-Feira

OBRA DE PAV. E DRENAGEM DA RUA CANTO DO CÉU E RUA MORRO DAS EMERÊNCIAS (PARTE) NO BAIRRO

TEMPO CLIMA

BOM	X	INSTÁVEL		CHUVOSO		IMPRATICÁVEL	
-----	---	----------	--	---------	--	--------------	--

Pessoal	
Função	Quant.
Engenheiro	1
Encarregado	1
Pedreiro	3
Servente	7
Carpinteiro/Armador	
Calçeteiro	

Equipamento	
Descrição	Quant.
Caminhão Toco	1
Compactador sapo	2
Retro escavadeira	1

Serviços Realizados

COLOCAÇÃO DE TUBOS DE 500 MM DO PV 32 ao PV 33

COMENTÁRIOS DO FISCAL:

COMENTÁRIOS DA EMPRESA:

RESP. PELA EMPRESA

ENG. FISCAL


 João Pedro Santos de Souza
 Engenheiro Civil
 CREA/RJ 2017107998

DIAS CORRIDO 128

Armação dos Búzios

CONTRATO Nº

010/2018

OBRA:

21-ago-18

Terça-Feira

OBRA DE PAV. E DRENAGEM DA RUA CANTO DO CÉU E RUA MORRO DAS EMERÊNCIAS (PARTE) NO BAIRRO

TEMPO CLIMA

BOM	X	INSTÁVEL		CHUVOSO		IMPRATICÁVEL	
-----	---	----------	--	---------	--	--------------	--

Pessoal

Função	Quant.
Engenheiro	1
Encarregado	1
Pedreiro	3
Servente	7
Carpinteiro/Armador	
Calceteiro	

Equipamento

Descrição	Quant.
Caminhão Toco	1
Compactador sapo	2
Retro escavadeira	1

Serviços Realizados

COLOCAÇÃO DE TUBOS DE 500 MM DO PV 33 AO PV 34

COMENTÁRIOS DO FISCAL:

COMENTÁRIOS DA EMPRESA:

RESP. PELA EMPRESA

ENG. FISCAL


 João Pedro Santos de Souza
 Engenheiro Civil
 CREA/RJ 2017107998



Diário de Obras

DIAS CORRIDO 129

Armação dos Búzios

CONTRATO Nº

010/2018

OBRA:

22-ago-18

Quarta-Feira

OBRA DE PAV. E DRENAGEM DA RUA CANTO DO CÉU E RUA MORRO DAS EMERÊNCIAS (PARTE) NO BAIRRO

TEMPO CLIMA

BOM	X	INSTÁVEL		CHUVOSO		IMPRATICÁVEL	
-----	---	----------	--	---------	--	--------------	--

Pessoal	
Função	Quant.
Engenheiro	1
Encarregado	1
Pedreiro	3
Servente	7
Carpinteiro/Armador	
Calceteiro	

Equipamento	
Descrição	Quant.
Caminhão Toco	1
Compactador sapo	2
Retro escavadeira	1

Serviços Realizados


COLOCAÇÃO DE TUBOS DE 500 MM DO PV 34 AO PV 35

COMENTÁRIOS DO FISCAL:

COMENTÁRIOS DA EMPRESA:

RESP. PELA EMPRESA

ENG. FISCAL


 João Pedro Santos de Souza
 Engenheiro Civil
 CREA/RJ 2017/107998



Diário de Obras

DIAS CORRIDO 130

Armação dos Búzios

CONTRATO Nº

010/2018

OBRA:

23-ago-18

Quinta-Feira

OBRA DE PAV. E DRENAGEM DA RUA CANTO DO CÉU E RUA MORRO DAS EMERÊNCIAS (PARTE) NO BAIRRO

TEMPO CLIMA

BOM	X	INSTÁVEL		CHUVOSO		IMPRATICÁVEL	
-----	---	----------	--	---------	--	--------------	--

Pessoal	
Função	Quant.
Engenheiro	1
Encarregado	1
Pedreiro	3
Servente	7
Carpinteiro/Armador	
Calceteiro	

Equipamento	
Descrição	Quant.
Caminhão Toco	1
Compactador sapo	2
Retro escavadeira	1

Serviços Realizados

EXECUÇÃO DOS PV'S 33, 34 E 35

COMENTÁRIOS DO FISCAL:

COMENTÁRIOS DA EMPRESA:

RESP. PELA EMPRESA

ENG. FISCAL

João Pedro Santos de Souza
Engenheiro Civil
CREA/RJ 2017107998


DAFLA

CONSTRUÇÃO | SERVIÇOS | GERENCIAMENTO

Diário de Obras

DIAS CORRIDO 131

Armação dos Búzios

CONTRATO Nº

010/2018

OBRA:

24-ago-18

Sexta-Feira

OBRA DE PAV. E DRENAGEM DA RUA CANTO DO CÉU E RUA MORRO DAS EMERÊNCIAS (PARTE) NO BAIRRO

TEMPO CLIMA

BOM		INSTÁVEL		CHUVOSO		IMPRATICÁVEL	X
-----	--	----------	--	---------	--	--------------	---

Pessoal	
Função	Quant.
Engenheiro	1
Encarregado	1
Pedreiro	3
Servente	7
Carpinteiro/Armador	
Calceteiro	

Equipamento	
Descrição	Quant.
Caminhão Toco	1
Compactador sapo	2
Retro escavadeira	1

Serviços Realizados

COMENTÁRIOS DO FISCAL:

COMENTÁRIOS DA EMPRESA:

RESP. PELA EMPRESA

ENG. FISCAL

João Pedro Santos de Souza
 Engenheiro Civil
 CREA/RJ 2017107998



Diário de Obras

DIAS CORRIDO 132 133

Armação dos Búzios

CONTRATO Nº

010/2018

OBRA 25-ago-18 26-ago-18 Sábado Domingo

OBRA DE PAV. E DRENAGEM DA RUA CANTO DO CÉU E RUA MORRO DAS EMERÊNCIAS (PARTE) NO
BAIRRO JOSÉ GOLÇALVES

TEMPO CLIMA

BOM INSTÁVEL CHUVOSO IMPRATICÁVEL

Pessoal

Função	Quant.
Engenheiro	
Encarregado	
Pedreiro	
Servente	
Carpinteiro/Armador	
Calceteiro	

Equipamento

Descrição	Quant.
Caminhão Toco	
Compactador sapo	
Retro escavadeira	

Serviços Realizados

COMENTÁRIOS DO FISCAL:

COMENTÁRIOS DA EMPRESA:

RESP. PELA EMPRESA

ENG. FISCAL

João Pedro Santos de Souza
Engenheiro Civil
CREA/RJ 2017107998



Diário de Obras

DIAS CORRIDO 134

Armação dos Búzios

CONTRATO Nº

010/2018

OBRA:

27-ago-18

Segunda-Feira

OBRA DE PAV. E DRENAGEM DA RUA CANTO DO CÉU E RUA MORRO DAS EMERÊNCIAS (PARTE) NO BAIRRO

TEMPO CLIMA

BOM	X	INSTÁVEL		CHUVOSO		IMPRATICÁVEL	
-----	---	----------	--	---------	--	--------------	--

Pessoal	
Função	Quant.
Engenheiro	1
Encarregado	1
Pedreiro	3
Servente	7
Carpinteiro/Armador	
Calceteiro	

Equipamento	
Descrição	Quant.
Caminhão Toco	1
Compactador sapo	2
Retro escavadeira	1

Serviços Realizados

REBAIXAMENTO NA RUA CANTINHO DO CEU

COMENTÁRIOS DO FISCAL:

COMENTÁRIOS DA EMPRESA:

RESP. PELA EMPRESA

ENG. FISCAL

João Pedro Santos de Souza
Engenheiro Civil
CREA/RJ 2017107998



Diário de Obras

DIAS CORRIDO 135

Armação dos Búzios

CONTRATO Nº

010/2018

OBRA:

28-ago-18

Terça-Feira

OBRA DE PAV. E DRENAGEM DA RUA CANTO DO CÉU E RUA MORRO DAS EMERÊNCIAS (PARTE) NO BAIRRO

TEMPO CLIMA

BOM	X	INSTÁVEL		CHUVOSO		IMPRATICÁVEL	
-----	---	----------	--	---------	--	--------------	--

Pessoal	
Função	Quant.
Engenheiro	1
Encarregado	1
Pedreiro	3
Servente	7
Carpinteiro/Armador	
Calceteiro	

Equipamento	
Descrição	Quant.
Caminhão Toco	1
Compactador sapo	2
Retro escavadeira	1

Serviços Realizados

REBAIXAMENTO NA RUA CANTINHO DO CEU

* LOCAÇÃO DE CAIXAS RALO

COMENTÁRIOS DO FISCAL:

COMENTÁRIOS DA EMPRESA:

RESP. PELA EMPRESA

ENG. FISCAL

João Pedro Santos de Souza
Engenheiro Civil
CREA/RJ 2017107998



Diário de Obras

DIAS CORRIDO 136

Armação dos Búzios

CONTRATO Nº

010/2018

OBRA:

29-ago-18

Quarta-Feira

OBRA DE PAV. E DRENAGEM DA RUA CANTO DO CÉU E RUA MORRO DAS EMERÊNCIAS (PARTE) NO BAIRRO

TEMPO CLIMA

BOM	X	INSTÁVEL		CHUVOSO		IMPRATICÁVEL	
-----	---	----------	--	---------	--	--------------	--

Pessoal	
Função	Quant.
Engenheiro	1
Encarregado	1
Pedreiro	3
Servente	7
Carpinteiro/Armador	
Calceteiro	

Equipamento	
Descrição	Quant.
Caminhão Toco	1
Compactador sapo	2
Retro escavadeira	1

Serviços Realizados


EXECUÇÃO DE RAMAIS E CAIXAS RALO DOS PV'S 30 E31


COMENTÁRIOS DO FISCAL:

COMENTÁRIOS DA EMPRESA:

RESP. PELA EMPRESA

ENG. FISCAL


 João Pedro Santos de Souza
 Engenheiro Civil
 CREA/RJ 2017107998



Diário de Obras

DIAS CORRIDO 137

Armação dos Búzios

CONTRATO Nº

010/2018

OBRA:

30-ago-18

Quinta-Feira

OBRA DE PAV. E DRENAGEM DA RUA CANTO DO CÉU E RUA MORRO DAS EMERÊNCIAS (PARTE) NO BAIRRO

TEMPO CLIMA

BOM	X	INSTÁVEL		CHUVOSO		IMPRATICÁVEL	
-----	---	----------	--	---------	--	--------------	--

Pessoal	
Função	Quant.
Engenheiro	1
Encarregado	1
Pedreiro	3
Servente	7
Carpinteiro/Armador	
Calceteiro	

Equipamento	
Descrição	Quant.
Caminhão Toco	1
Compactador sapo	2
Retro escavadeira	1

Serviços Realizados

EXECUÇÃO DOS RAMAIS E CAIXAS RALO DO PV 32

COMENTÁRIOS DO FISCAL:

COMENTÁRIOS DA EMPRESA:

RESP. PELA EMPRESA

ENG. FISCAL

João Pedro Santos de Souza
Engenheiro Civil
CREA/RJ 2017107998



Diário de Obras

DIAS CORRIDO 138

Armação dos Búzios

CONTRATO Nº 010/2018

OBRA:

31-ago-18

Sexta-Feira

OBRA DE PAV. E DRENAGEM DA RUA CANTO DO CÉU E RUA MORRO DAS EMERÊNCIAS (PARTE) NO BAIRRO

TEMPO CLIMA

BOM	X	INSTÁVEL		CHUVOSO		IMPRATICÁVEL	
-----	---	----------	--	---------	--	--------------	--

Pessoal	
Função	Quant.
Engenheiro	1
Encarregado	1
Pedreiro	3
Servente	7
Carpinteiro/Armador	
Calceteiro	

Equipamento	
Descrição	Quant.
Caminhão Toco	1
Compactador sapo	2
Retro escavadeira	1

Serviços Realizados


REBAIXAMENTO NA RUA DAS EMERENCIAS

COMENTÁRIOS DO FISCAL:

COMENTÁRIOS DA EMPRESA:

RESP. PELA EMPRESA

ENG. FISCAL


 João Pedro Santos de Souza
 Engenheiro Civil
 CREA/RJ 2017107998



Diário de Obras

DIAS CORRIDO 139 140

Armação dos Búzios

CONTRATO Nº

010/2018

OBRA

01-set-18

02-set-18

Sábado

Domingo

OBRA DE PAV. E DRENAGEM DA RUA CANTO DO CÉU E RUA MORRO DAS EMERÊNCIAS (PARTE) NO
BAIRRO JOSÉ GOLÇALVES

TEMPO CLIMA

BOM		INSTÁVEL		CHUVOSO		IMPRATICÁVEL	
-----	--	----------	--	---------	--	--------------	--

Pessoal	
Função	Quant.
Engenheiro	
Encarregado	
Pedreiro	
Servente	
Carpinteiro/Armador	
Calceteiro	

Equipamento	
Descrição	Quant.
Caminhão Toco	
Compactador sapo	
Retro escavadeira	


Serviços Realizados

COMENTÁRIOS DO FISCAL:

COMENTÁRIOS DA EMPRESA:

RESP. PELA EMPRESA

ENG. FISCAL


 João Pedro Santos de Souza
 Engenheiro Civil
 CREA/RJ 2017107998



Diário de Obras

DIAS CORRIDO 141

Armação dos Búzios

CONTRATO Nº

010/2018

OBRA:

03-set-18

Segunda-Feira

OBRA DE PAV. E DRENAGEM DA RUA CANTO DO CÉU E RUA MORRO DAS EMERÊNCIAS (PARTE) NO BAIRRO

TEMPO CLIMA

BOM		INSTÁVEL		CHUVOSO	X	IMPRATICÁVEL	
-----	--	----------	--	---------	---	--------------	--

Pessoal	
Função	Quant.
Engenheiro	1
Encarregado	1
Pedreiro	3
Servente	7
Carpinteiro/Armador	
Calceteiro	

Equipamento	
Descrição	Quant.
Caminhão Toco	1
Compactador sapo	2
Retro escavadeira	1

Serviços Realizados


REBAIXAMENTO NA RUA DAS EMERÊNCIAS

COMENTÁRIOS DO FISCAL:

COMENTÁRIOS DA EMPRESA:

RESP. PELA EMPRESA

ENG. FISCAL


 João Pedro Santos de Souza
 Engenheiro Civil
 CREA/RJ 2017107998



Diário de Obras

DIAS CORRIDO 142

Armação dos Búzios

CONTRATO Nº

010/2018

OBRA:

04-set-18

Terça-Feira

OBRA DE PAV. E DRENAGEM DA RUA CANTO DO CÉU E RUA MORRO DAS EMERÊNCIAS (PARTE) NO BAIRRO

TEMPO CLIMA

BOM	X	INSTÁVEL		CHUVOSO		IMPRATICÁVEL	
-----	---	----------	--	---------	--	--------------	--

Pessoal	
Função	Quant.
Engenheiro	1
Encarregado	1
Pedreiro	3
Servente	7
Carpinteiro/Armador	
Calceteiro	

Equipamento	
Descrição	Quant.
Caminhão Toco	1
Compactador sapo	2
Retro escavadeira	1

Serviços Realizados


EXECUÇÃO DE RAMAIS DE CAIXAS RALO NOS PV'S 21 E 22

COMENTÁRIOS DO FISCAL:

COMENTÁRIOS DA EMPRESA:

RESP. PELA EMPRESA

ENG. FISCAL


 João Pedro Santos de Souza
 Engenheiro Civil
 CREA/RJ 2017107998


DAFLA

CONSTRUÇÃO | SERVIÇOS | GERENCIAMENTO

Diário de Obras

DIAS CORRIDO 143

Armação dos Búzios

CONTRATO Nº

010/2018

OBRA:

05-set-18

Quarta-Feira

OBRA DE PAV. E DRENAGEM DA RUA CANTO DO CÉU E RUA MORRO DAS EMERÊNCIAS (PARTE) NO BAIRRO

TEMPO CLIMA

BOM		INSTÁVEL		CHUVOSO	X	IMPRATICÁVEL	
-----	--	----------	--	---------	---	--------------	--

Pessoal	
Função	Quant.
Engenheiro	1
Encarregado	1
Pedreiro	3
Servente	7
Carpinteiro/Armador	
Calceteiro	

Equipamento	
Descrição	Quant.
Caminhão Toco	1
Compactador sapo	2
Retro escavadeira	1

Serviços Realizados

EXECUÇÃO DE RAMAIS DE CAIXAS RALO NO PV 23

COMENTÁRIOS DO FISCAL:

COMENTÁRIOS DA EMPRESA:

RESP. PELA EMPRESA

ENG. FISCAL

João Pedro Santos de Souza
 Engenheiro Civil
 CREA/RJ 2017107998



Diário de Obras

DIAS CORRIDO 144

Armação dos Búzios

CONTRATO Nº

010/2018

OBRA:

06-set-18

Quinta-Feira

OBRA DE PAV. E DRENAGEM DA RUA CANTO DO CÉU E RUA MORRO DAS EMERÊNCIAS (PARTE) NO BAIRRO

TEMPO CLIMA

BOM		INSTÁVEL		CHUVOSO	X	IMPRATICÁVEL	
-----	--	----------	--	---------	---	--------------	--

Pessoal	
Função	Quant.
Engenheiro	1
Encarregado	1
Pedreiro	3
Servente	7
Carpinteiro/Armador	
Calceteiro	

Equipamento	
Descrição	Quant.
Caminhão Toco	1
Compactador sapo	2
Retro escavadeira	1

Serviços Realizados


COLOCAÇÃO DE CAIXAS RALO DOS PV'S 23,22 E 21

COMENTÁRIOS DO FISCAL:

COMENTÁRIOS DA EMPRESA:

RESP. PELA EMPRESA

ENG. FISCAL


 João Pedro Santos de Souza
 Engenheiro Civil
 CREA/RJ 2017101998



Diário de Obras

DIAS CORRIDO 145

Armação dos Búzios

CONTRATO Nº

010/2018

OBRA:

07-set-18

Sexta-Feira

OBRA DE PAV. E DRENAGEM DA RUA CANTO DO CÉU E RUA MORRO DAS EMERÊNCIAS (PARTE) NO BAIRRO

TEMPO CLIMA

BOM	X	INSTÁVEL		CHUVOSO		IMPRATICÁVEL	
-----	---	----------	--	---------	--	--------------	--

Pessoal	
Função	Quant.
Engenheiro	
Encarregado	
Pedreiro	
Servente	
Carpinteiro/Armador	
Calceteiro	

Equipamento	
Descrição	Quant.
Caminhão Toco	
Compactador sapo	
Retro escavadeira	

Serviços Realizados

PERIADO NACIONAL

COMENTÁRIOS DO FISCAL:

COMENTÁRIOS DA EMPRESA:

RESP. PELA EMPRESA

ENG. FISCAL

João Pedro Santos de Souza
Engenheiro Civil
CREA/RJ 2017107998



DAFLA
CONSTRUÇÃO | SERVIÇOS | GERENCIAMENTO

Diário de Obras

DIAS CORRIDO 146 147

Armação dos Búzios

CONTRATO Nº

010/2018

OBRA

08-set-18

09-set-18

Sábado

Domingo

OBRA DE PAV. E DRENAGEM DA RUA CANTO DO CÉU E RUA MORRO DAS EMERÊNCIAS (PARTE) NO
BAIRRO JOSÉ GOLÇALVES

TEMPO CLIMA

BOM		INSTÁVEL		CHUVOSO		IMPRATICÁVEL	
-----	--	----------	--	---------	--	--------------	--

Pessoal	
Função	Quant.
Engenheiro	
Encarregado	
Pedreiro	
Servente	
Carpinteiro/Armador	
Alceteiro	

Equipamento	
Descrição	Quant.
Caminhão Toco	
Compactador sapo	
Retro escavadeira	

Serviços Realizados

COMENTÁRIOS DO FISCAL:

COMENTÁRIOS DA EMPRESA:

RESP. PELA EMPRESA

ENG. FISCAL

João Paulo Santos de Souza
Engenheiro Civil
CREA/RJ 2017107998



Diário de Obras

DIAS CORRIDO 148

Armação dos Búzios

CONTRATO Nº

010/2018

OBRA:

10-set-18

Segunda-Feira

OBRA DE PAV. E DRENAGEM DA RUA CANTO DO CÉU E RUA MORRO DAS EMERÊNCIAS (PARTE) NO BAIRRO

TEMPO CLIMA

BOM	X	INSTÁVEL		CHUVOSO		IMPRATICÁVEL	
-----	---	----------	--	---------	--	--------------	--

Pessoal	
Função	Quant.
Engenheiro	1
Encarregado	1
Pedreiro	3
Servente	7
Carpinteiro/Armador	
Calceteiro	

Equipamento	
Descrição	Quant.
Caminhão Toco	1
Compactador sapo	2
Retro escavadeira	1

Serviços Realizados


ESTAQUEAMENTO NA RUA CANTINHO DO CEU E REBAIXAMENTO DA MESMA

COMENTÁRIOS DO FISCAL:

COMENTÁRIOS DA EMPRESA:

RESP. PELA EMPRESA

ENG. FISCAL


 João Pedro Santos de Souza
 Engenheiro Civil
 CREA/RJ 2017107998

Armação dos Búzios

CONTRATO Nº

010/2018

OBRA:

11-set-18

Terça-Feira

OBRA DE PAV. E DRENAGEM DA RUA CANTO DO CÉU E RUA MORRO DAS EMERÊNCIAS (PARTE) NO BAIRRO

TEMPO CLIMA

BOM	X	INSTÁVEL		CHUVOSO		IMPRATICÁVEL	
-----	---	----------	--	---------	--	--------------	--

Pessoal	
Função	Quant.
Engenheiro	1
Encarregado	1
Pedreiro	3
Servente	7
Carpinteiro/Armador	
Calceteiro	

Equipamento	
Descrição	Quant.
Caminhão Toco	1
Compactador sapo	2
Retro escavadeira	1

Serviços Realizados


ABERTURA DA CAIXA DE AREIA NA RUA IPÊ ROXO

COMENTÁRIOS DO FISCAL:

COMENTÁRIOS DA EMPRESA:

RESP. PELA EMPRESA

ENG. FISCAL


 João Pedro Santos de Souza
 Engenheiro Civil
 CREA/RJ 2017107998



Diário de Obras

DIAS CORRIDO 150

Armação dos Búzios

CONTRATO Nº

010/2018

OBRA:

12-set-18

Quarta-Feira

OBRA DE PAV. E DRENAGEM DA RUA CANTO DO CÉU E RUA MORRO DAS EMERÊNCIAS (PARTE) NO BAIRRO

TEMPO CLIMA

BOM	X	INSTÁVEL		CHUVOSO		IMPRATICÁVEL	
-----	---	----------	--	---------	--	--------------	--

Pessoal	
Função	Quant.
Engenheiro	1
Encarregado	1
Pedreiro	3
Servente	7
Carpinteiro/Armador	
Calceteiro	

Equipamento	
Descrição	Quant.
Caminhão Toco	1
Compactador sapo	2
Retro escavadeira	1

Serviços Realizados

ABERTURA DA CAIXA DE AREIA NA RUA SÃO PAULO

COMENTÁRIOS DO FISCAL:

COMENTÁRIOS DA EMPRESA:

RESP. PELA EMPRESA

ENG. FISCAL

João Pedro Santos de Souza
Engenheiro Civil
CREA/RJ 2017107998



DAFLA
CONSTRUÇÃO | SERVIÇOS | GERENCIAMENTO

Diário de Obras

DIAS CORRIDO 151

Armação dos Búzios

CONTRATO Nº

010/2018

OBRA:

13-set-18

Quinta-Feira

OBRA DE PAV. E DRENAGEM DA RUA CANTO DO CÉU E RUA MORRO DAS EMERÊNCIAS (PARTE) NO BAIRRO

TEMPO CLIMA

BOM X INSTÁVEL CHUVOSO IMPRATICÁVEL

Pessoal

Função	Quant.
Engenheiro	1
Encarregado	1
Pedreiro	3
Servente	7
Carpinteiro/Armador	
Calceteiro	

Equipamento

Descrição	Quant.
Caminhão Toco	1
Compactador sapo	2
Retro escavadeira	1

Serviços Realizados

EXECUÇÃO DE RAMAIS DE CAIXAS RALO DOS PV'S 13 E 12

COMENTÁRIOS DO FISCAL:

COMENTÁRIOS DA EMPRESA:

RESP. PELA EMPRESA

ENG. FISCAL

João Pedro Santos de Souza
Engenheiro Civil
CREA/RJ 2017107998



Diário de Obras

DIAS CORRIDO 152

Armação dos Búzios

CONTRATO Nº

010/2018

OBRA:

14-set-18

Sexta-Feira

OBRA DE PAV. E DRENAGEM DA RUA CANTO DO CÉU E RUA MORRO DAS EMERÊNCIAS (PARTE) NO BAIRRO

TEMPO CLIMA

BOM

X

INSTÁVEL

CHUVOSO

IMPRATICÁVEL

Pessoal

Função	Quant.
Engenheiro	1
Encarregado	1
Pedreiro	3
Servente	7
Carpinteiro/Armador	
Calceteiro	

Equipamento

Descrição	Quant.
Caminhão Toco	1
Compactador sapo	2
Retro escavadeira	1

Serviços Realizados

* EXECUÇÃO DE RAMAIS DE CAIXAS RALO DOS PV'S 11 E 16

COMENTÁRIOS DO FISCAL:

COMENTÁRIOS DA EMPRESA:

RESP. PELA EMPRESA

ENG. FISCAL


 João Pedro Santos de Souza
 Engenheiro Civil
 CREA/RJ 2017107998



Diário de Obras

DIAS CORRIDO 153 154

Armação dos Búzios

CONTRATO Nº

010/2018

OBRA 15-set-18 16-set-18 Sábado Domingo

OBRA DE PAV. E DRENAGEM DA RUA CANTO DO CÉU E RUA MORRO DAS EMERÊNCIAS (PARTE) NO
BAIRRO JOSÉ GOLÇALVES

TEMPO CLIMA

BOM INSTÁVEL CHUVOSO IMPRATICÁVEL

Pessoal	
Função	Quant.
Engenheiro	
Encarregado	
Pedreiro	
Servente	
Carpinteiro/Armador	
Alceteiro	

Equipamento	
Descrição	Quant.
Caminhão Toco	
Compactador sapo	
Retro escavadeira	

Serviços Realizados

COMENTÁRIOS DO FISCAL:

COMENTÁRIOS DA EMPRESA:

RESP. PELA EMPRESA

ENG. FISCAL

João Pedro Santos de Souza
Engenheiro Civil
CREA/RJ 2017107998



Diário de Obras

DIAS CORRIDO 155

Armação dos Búzios

CONTRATO Nº 010/2018

OBRA:

17-set-18

Segunda-Feira

OBRA DE PAV. E DRENAGEM DA RUA CANTO DO CÉU E RUA MORRO DAS EMERÊNCIAS (PARTE) NO BAIRRO

TEMPO CLIMA

BOM		INSTÁVEL		CHUVOSO	X	IMPRATICÁVEL	
-----	--	----------	--	---------	---	--------------	--

Pessoal	
Função	Quant.
Engenheiro	1
Encarregado	1
Pedreiro	3
Servente	7
Carpinteiro/Armador	
Calceteiro	

Equipamento	
Descrição	Quant.
Caminhão Toco	1
Compactador sapo	2
Retro escavadeira	1

Serviços Realizados

SEM CONDIÇÃO DE TRABALHO

COMENTÁRIOS DO FISCAL:

COMENTÁRIOS DA EMPRESA:

RESP. PELA EMPRESA

ENG. FISCAL

João Pedro Santos de Souza
Engenheiro Civil
CREA/RJ 2017107998

Diário de Obras

DIAS CORRIDO 156

Armação dos Búzios

CONTRATO Nº

010/2018

OBRA:

18-set-18

Terça-Feira

OBRA DE PAV. E DRENAGEM DA RUA CANTO DO CÉU E RUA MORRO DAS EMERÊNCIAS (PARTE) NO BAIRRO

TEMPO CLIMA

BOM		INSTÁVEL	X	CHUVOSO		IMPRATICÁVEL	
-----	--	----------	---	---------	--	--------------	--

Pessoal		Equipamento	
Função	Quant.	Descrição	Quant.
Engenheiro	1	Caminhão Toco	1
Encarregado	1	Compactador sapo	2
Pedreiro	3	Retro escavadeira	1
Servente	7		
Carpinteiro/Armador			
Calceteiro			

Serviços Realizados


ABERTURA DE CAIXA DE AREIA NA RUA SÃO LÁZARO

COMENTÁRIOS DO FISCAL:

COMENTÁRIOS DA EMPRESA:

RESP. PELA EMPRESA

ENG. FISCAL


 João Pedro Santos de Souza
 Engenheiro Civil
 CREA/RJ 2017107998



Diário de Obras

DIAS CORRIDO 157

Armação dos Búzios

CONTRATO Nº

010/2018

OBRA:

19-set-18

Quarta-Feira

OBRA DE PAV. E DRENAGEM DA RUA CANTO DO CÉU E RUA MORRO DAS EMERÊNCIAS (PARTE) NO BAIRRO

TEMPO CLIMA

BOM

X

INSTÁVEL

CHUVOSO

IMPRATICÁVEL

Pessoal

Função	Quant.
Engenheiro	1
Encarregado	1
Pedreiro	3
Servente	7
Carpinteiro/Armador	
Calceteiro	

Equipamento

Descrição	Quant.
Caminhão Toco	1
Compactador sapo	2
Retro escavadeira	1

Serviços Realizados

REBAIXAMENTO E RETIRADA DO MATERIAL NA RUA DAS EMERÊNCIAS

COMENTÁRIOS DO FISCAL:

COMENTÁRIOS DA EMPRESA:

RESP. PELA EMPRESA

ENG. FISCAL

João Pedro Santos de Souza
Engenheiro Civil
CREA/RJ 2017107998

Armação dos Búzios

CONTRATO Nº

010/2018

OBRA:

20-set-18

Quinta-Feira

OBRA DE PAV. E DRENAGEM DA RUA CANTO DO CÉU E RUA MORRO DAS EMERÊNCIAS (PARTE) NO BAIRRO

TEMPO CLIMA

BOM	X	INSTÁVEL		CHUVOSO		IMPRATICÁVEL	
-----	---	----------	--	---------	--	--------------	--

Pessoal	
Função	Quant.
Engenheiro	1
Encarregado	1
Pedreiro	3
Servente	7
Carpinteiro/Armador	
Calceteiro	

Equipamento	
Descrição	Quant.
Caminhão Toco	1
Compactador sapo	2
Retro escavadeira	1

Serviços Realizados


REBAIXAMENTO E RETIRADA DO MATERIAL NA RUA DAS EMERÊNCIAS

COMENTÁRIOS DO FISCAL:

COMENTÁRIOS DA EMPRESA:

RESP. PELA EMPRESA

ENG. FISCAL


 João Pedro Santos de Souza
 Engenheiro Civil
 CREA/RJ 2017107998



Diário de Obras

DIAS CORRIDO 159

Armação dos Búzios

CONTRATO Nº

010/2018

OBRA:

21-set-18

Sexta-Feira

OBRA DE PAV. E DRENAGEM DA RUA CANTO DO CÉU E RUA MORRO DAS EMERÊNCIAS (PARTE) NO BAIRRO

TEMPO CLIMA

BOM	X	INSTÁVEL		CHUVOSO		IMPRATICÁVEL	
-----	---	----------	--	---------	--	--------------	--

Pessoal	
Função	Quant.
Engenheiro	1
Encarregado	1
Pedreiro	3
Servente	7
Carpinteiro/Armador	
Calceteiro	

Equipamento	
Descrição	Quant.
Caminhão Toco	1
Compactador sapo	2
Retro escavadeira	1

Serviços Realizados

REBAIXAMENTO E RETIRADA DO MATERIAL NA RUA DAS EMERÊNCIAS

COMENTÁRIOS DO FISCAL:

COMENTÁRIOS DA EMPRESA:

RESP. PELA EMPRESA

ENG. FISCAL

João Pedro Santos de Souza
Engenheiro Civil
CREA/RJ 2017107998

Armação dos Búzios

CONTRATO Nº

010/2018

OBRA 22-set-18 23-set-18 Sábado Domingo

OBRA DE PAV. E DRENAGEM DA RUA CANTO DO CÉU E RUA MORRO DAS EMERÊNCIAS (PARTE) NO BAIRRO JOSÉ GOLÇALVES

TEMPO CLIMA

BOM		INSTÁVEL		CHUVOSO		IMPRATICÁVEL	
-----	--	----------	--	---------	--	--------------	--

Pessoal	
Função	Quant.
Engenheiro	
Encarregado	
Pedreiro	
Servente	
Carpinteiro/Armador	
Calceteiro	

Equipamento	
Descrição	Quant.
Caminhão Toco	
Compactador sapo	
Retro escavadeira	


Serviços Realizados

COMENTÁRIOS DO FISCAL:

COMENTÁRIOS DA EMPRESA:

RESP. PELA EMPRESA

ENG. FISCAL


 João Pedro Santos de Souza
 Engenheiro Civil
 CREA/RJ 2017107998

Armação dos Búzios

CONTRATO Nº

010/2018

OBRA:

24-set-18

Segunda-Feira

OBRA DE PAV. E DRENAGEM DA RUA CANTO DO CÉU E RUA MORRO DAS EMERÊNCIAS (PARTE) NO BAIRRO

TEMPO CLIMA

BOM	X	INSTÁVEL		CHUVOSO		IMPRATICÁVEL	
-----	---	----------	--	---------	--	--------------	--

Pessoal	
Função	Quant.
Engenheiro	1
Encarregado	1
Pedreiro	3
Servente	7
Carpinteiro/Armador	
Calceteiro	

Equipamento	
Descrição	Quant.
Caminhão Toco	1
Compactador sapo	2
Retro escavadeira	1

Serviços Realizados

REBAIXAMENTO E RETIRADA DO MATERIAL NA RUA DAS EMERÊNCIAS


* EXECUÇÃO DE CAIXA DE AREIA

COMENTÁRIOS DO FISCAL:

COMENTÁRIOS DA EMPRESA:

RESP. PELA EMPRESA

ENG. FISCAL


 João Pedro Santos de Souza
 Engenheiro Civil
 CREA/RJ 201710790-8

Armação dos Búzios

CONTRATO Nº

010/2018

OBRA:

25-set-18

Terça-Feira

OBRA DE PAV. E DRENAGEM DA RUA CANTO DO CÉU E RUA MORRO DAS EMERÊNCIAS (PARTE) NO BAIRRO

TEMPO CLIMA

BOM	X	INSTÁVEL		CHUVOSO		IMPRATICÁVEL	
-----	---	----------	--	---------	--	--------------	--

Pessoal	
Função	Quant.
Engenheiro	1
Encarregado	1
Pedreiro	3
Servente	7
Carpinteiro/Armador	
Calceteiro	

Equipamento	
Descrição	Quant.
Caminhão Toco	1
Compactador sapo	2
Retro escavadeira	1

Serviços Realizados

EXECUÇÃO DE CAIXA DE AREIA

COMENTÁRIOS DO FISCAL:

COMENTÁRIOS DA EMPRESA:

RESP. PELA EMPRESA

ENG. FISCAL

João Pedro Santos de Souza
 Engenheiro Civil
 CREA/RJ 2017107998



Diário de Obras

DIAS CORRIDO 164

Armação dos Búzios

CONTRATO Nº

010/2018

OBRA:

26-set-18

Quarta-Feira

OBRA DE PAV. E DRENAGEM DA RUA CANTO DO CÉU E RUA MORRO DAS EMERÊNCIAS (PARTE) NO BAIRRO

TEMPO CLIMA

BOM	X	INSTÁVEL		CHUVOSO		IMPRATICÁVEL	
-----	---	----------	--	---------	--	--------------	--

Pessoal	
Função	Quant.
Engenheiro	1
Encarregado	1
Pedreiro	3
Servente	7
Carpinteiro/Armador	
Calceteiro	

Equipamento	
Descrição	Quant.
Caminhão Toco	1
Compactador sapo	2
Retro escavadeira	1

Serviços Realizados

EXECUÇÃO DE CAIXA DE AREIA


* RETIRADA DE EXCESSO DE MATERIAL

COMENTÁRIOS DO FISCAL:

COMENTÁRIOS DA EMPRESA:

RESP. PELA EMPRESA

ENG. FISCAL


 João Pedro Santos de Souza
 Engenheiro Civil
 CREA/RJ 2017107998

Armação dos Búzios

CONTRATO Nº

010/2018

OBRA:

27-set-18

Quinta-Feira

OBRA DE PAV. E DRENAGEM DA RUA CANTO DO CÉU E RUA MORRO DAS EMERÊNCIAS (PARTE) NO BAIRRO

TEMPO CLIMA

BOM	X	INSTÁVEL		CHUVOSO		IMPRATICÁVEL	
-----	---	----------	--	---------	--	--------------	--

Pessoal	
Função	Quant.
Engenheiro	1
Encarregado	1
Pedreiro	3
Servente	7
Carpinteiro/Armador	
Calceteiro	

Equipamento	
Descrição	Quant.
Caminhão Toco	1
Compactador sapo	2
Retro escavadeira	1

Serviços Realizados

REBAIXAMENTO E PREPARAÇÃO DA BASE DA RUA JOSÉ GONÇALVES PRA COLOCAÇÃO DE CBUQ

COMENTÁRIOS DO FISCAL:

COMENTÁRIOS DA EMPRESA:

RESP. PELA EMPRESA

ENG. FISCAL

João Pedro Santos de Souza
 Engenheiro Civil
 CREA/RJ 2017107998



Diário de Obras

DIAS CORRIDO 166

Armação dos Búzios

CONTRATO Nº

010/2018

OBRA:

28-set-18

Sexta-Feira

OBRA DE PAV. E DRENAGEM DA RUA CANTO DO CÉU E RUA MORRO DAS EMERÊNCIAS (PARTE) NO BAIRRO

TEMPO CLIMA

BOM	X	INSTÁVEL		CHUVOSO		IMPRATICÁVEL	
-----	---	----------	--	---------	--	--------------	--

Pessoal	
Função	Quant.
Engenheiro	1
Encarregado	1
Pedreiro	3
Servente	7
Carpinteiro/Armador	
Calceteiro	

Equipamento	
Descrição	Quant.
Caminhão Toco	1
Compactador sapo	2
Retro escavadeira	1

Serviços Realizados

COLOCAÇÃO DO CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE NA RUA JOSÉ GONÇALVES

COMENTÁRIOS DO FISCAL:

COMENTÁRIOS DA EMPRESA:

RESP. PELA EMPRESA

ENG. FISCAL

João Pedro Santos de Souza
Engenheiro Civil
CREA/RJ 2017-107998

Armação dos Búzios

CONTRATO Nº

010/2018

OBRA 29-set-18 30-set-18 Sábado Domingo

 OBRA DE PAV. E DRENAGEM DA RUA CANTO DO CÉU E RUA MORRO DAS EMERÊNCIAS (PARTE) NO
 BAIRRO JOSÉ GOLÇALVES

TEMPO CLIMA

BOM		INSTÁVEL		CHUVOSO		IMPRATICÁVEL	
-----	--	----------	--	---------	--	--------------	--

Pessoal	
Função	Quant.
Engenheiro	
Encarregado	
Pedreiro	
Servente	
Carpinteiro/Armador	
Calçeteiro	

Equipamento	
Descrição	Quant.
Caminhão Toco	
Compactador sapo	
Retro escavadeira	


Serviços Realizados

COMENTÁRIOS DO FISCAL:

COMENTÁRIOS DA EMPRESA:

RESP. PELA EMPRESA

ENG. FISCAL


 João Pedro Santos de Souza
 Engenheiro Civil
 CREA/RJ 2017107998

Armação dos Búzios

CONTRATO Nº

010/2018

OBRA:

01-out-18

Segunda-Feira

OBRA DE PAV. E DRENAGEM DA RUA CANTO DO CÉU E RUA MORRO DAS EMERÊNCIAS (PARTE) NO BAIRRO

TEMPO CLIMA

BOM	X	INSTÁVEL		CHUVOSO		IMPRATICÁVEL	
-----	---	----------	--	---------	--	--------------	--

Pessoal	
Função	Quant.
Engenheiro	1
Encarregado	1
Pedreiro	3
Servente	7
Carpinteiro/Armador	
Calceteiro	

Equipamento	
Descrição	Quant.
Caminhão Toco	1
Compactador sapo	2
Retro escavadeira	1

Serviços Realizados

REBAIXAMENTO NA RUA DAS EMERENCIAS


* COLOCAÇÃO DE MEIOS FIO


COMENTÁRIOS DO FISCAL:

COMENTÁRIOS DA EMPRESA:

RESP. PELA EMPRESA

ENG. FISCAL


 João Pedro Santos de Souza
 Engenheiro Civil
 CREA/RJ 2017107998



Diário de Obras

DIAS CORRIDO 170

Armação dos Búzios

CONTRATO Nº

010/2018

OBRA:

02-out-18

Terça-Feira

OBRA DE PAV. E DRENAGEM DA RUA CANTO DO CÉU E RUA MORRO DAS EMERÊNCIAS (PARTE) NO BAIRRO JOSÉ

TEMPO CLIMA

BOM	X	INSTÁVEL		CHUVOSO		IMPRATICÁVEL	
-----	---	----------	--	---------	--	--------------	--

Pessoal	
Função	Quant.
Engenheiro	1
Encarregado	1
Pedreiro	3
Servente	7
Carpinteiro/Armador	
Calceteiro	

Equipamento	
Descrição	Quant.
Caminhão Toco	1
Compactador sapo	2
Retro escavadeira	1

Serviços Realizados

CONCLUSÃO DA COLOCAÇÃO DO CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE NA RUA JOSÉ GONÇALVES
 EXECUÇÃO DO QUEBRA MOLAS NA RUA JOSÉ GONÇALVES

COMENTÁRIOS DO FISCAL:

COMENTÁRIOS DA EMPRESA:

RESP. PELA EMPRESA

ENG. FISCAL

João Pedro Santos de Souza
 Engenheiro Civil
 CREA/RJ 2017107998



Diário de Obras

DIAS CORRIDO 171

Armação dos Búzios

CONTRATO Nº

010/2018

OBRA:

03-out-18

Quarta-Feira

OBRA DE PAV. E DRENAGEM DA RUA CANTO DO CÉU E RUA MORRO DAS EMERÊNCIAS (PARTE) NO BAIRRO

TEMPO CLIMA

BOM	X	INSTÁVEL		CHUVOSO		IMPRATICÁVEL	
-----	---	----------	--	---------	--	--------------	--

Pessoal	
Função	Quant.
Engenheiro	1
Encarregado	1
Pedreiro	3
Servente	7
Carpinteiro/Armador	
Calceteiro	

Equipamento	
Descrição	Quant.
Caminhão Toco	1
Compactador sapo	2
Retro escavadeira	1

Serviços Realizados

EXECUÇÃO DE MEIO FIO

COMENTÁRIOS DO FISCAL:

COMENTÁRIOS DA EMPRESA:

RESP. PELA EMPRESA

ENG. FISCAL

João Pedro Santos de Souza
Engenheiro Civil
CREA/RJ 2017107998

Diário de Obras

DIAS CORRIDO 172

Armação dos Búzios

CONTRATO Nº

010/2018

OBRA:

04-out-18

Quinta-Feira

OBRA DE PAV. E DRENAGEM DA RUA CANTO DO CÉU E RUA MORRO DAS EMERÊNCIAS (PARTE) NO BAIRRO

TEMPO CLIMA

BOM	X	INSTÁVEL		CHUVOSO		IMPRATICÁVEL	
-----	---	----------	--	---------	--	--------------	--

Pessoal	
Função	Quant.
Engenheiro	1
Encarregado	1
Pedreiro	3
Servente	7
Carpinteiro/Armador	
Calceteiro	

Equipamento	
Descrição	Quant.
Caminhão Toco	1
Compactador sapo	2
Retro escavadeira	1

Serviços Realizados

EXECUÇÃO DE MEIO FIO


* ESCORAMENTO E ATERRAMENTO DOS MEIOS FIO

COMENTÁRIOS DO FISCAL:

COMENTÁRIOS DA EMPRESA:

RESP. PELA EMPRESA

ENG. FISCAL


 João Pedro Santos de Souza
 Engenheiro Civil
 CREA/RJ 2017107398



Diário de Obras

DIAS CORRIDO 173

Armação dos Búzios

CONTRATO Nº

010/2018

OBRA:

05-out-18

Sexta-Feira

OBRA DE PAV. E DRENAGEM DA RUA CANTO DO CÉU E RUA MORRO DAS EMERÊNCIAS (PARTE) NO BAIRRO

TEMPO CLIMA

BOM		INSTÁVEL		CHUVOSO		IMPRATICÁVEL	X
-----	--	----------	--	---------	--	--------------	---

Pessoal

Função	Quant.
Engenheiro	1
Encarregado	1
Pedreiro	3
Servente	7
Carpinteiro/Armador	
Calceteiro	

Equipamento

Descrição	Quant.
Caminhão Toco	1
Compactador sapo	2
Retro escavadeira	1

Serviços Realizados

ACABAMENTO DE CAIXA DE AREIA

COMENTÁRIOS DO FISCAL:

COMENTÁRIOS DA EMPRESA:

RESP. PELA EMPRESA

ENG. FISCAL

João Pedro Santos de Souza
Engenheiro Civil
CREA/RJ 2017107998



Diário de Obras

DIAS CORRIDO 174 175

Armação dos Búzios

CONTRATO Nº

010/2018

OBRA

06-out-18

07-out-18

Sábado

Domingo

OBRA DE PAV. E DRENAGEM DA RUA CANTO DO CÉU E RUA MORRO DAS EMERÊNCIAS (PARTE) NO
BAIRRO JOSÉ GOLÇALVES

TEMPO CLIMA

BOM

INSTÁVEL

CHUVOSO

IMPRATICÁVEL

Pessoal

Função	Quant.
Engenheiro	
Encarregado	
Pedreiro	
Servente	
Carpinteiro/Armador	
Alceteiro	

Equipamento

Descrição	Quant.
Caminhão Toco	
Compactador sapo	
Retro escavadeira	

Serviços Realizados

COMENTÁRIOS DO FISCAL:

COMENTÁRIOS DA EMPRESA:

RESP. PELA EMPRESA

ENG. FISCAL

João Pedro Santos de Souza
Engenheiro Civil
CREA/RJ 2017107998



Diário de Obras

DIAS CORRIDO 176

Armação dos Búzios

CONTRATO Nº 010/2018

OBRA:

08-out-18

Segunda-Feira

OBRA DE PAV. E DRENAGEM DA RUA CANTO DO CÉU E RUA MORRO DAS EMERÊNCIAS (PARTE) NO BAIRRO

TEMPO CLIMA

BOM	X	INSTÁVEL		CHUVOSO		IMPRATICÁVEL	
-----	---	----------	--	---------	--	--------------	--

Pessoal	
Função	Quant.
Engenheiro	1
Encarregado	1
Pedreiro	3
Servente	7
Carpinteiro/Armador	
Calceteiro	

Equipamento	
Descrição	Quant.
Caminhão Toco	1
Compactador sapo	2
Retro escavadeira	1

Serviços Realizados

EXECUÇÃO DE GRADE DE CAIXA DE AREIA

* COLOCAÇÃO DE MEIOS FIO

COMENTÁRIOS DO FISCAL:

COMENTÁRIOS DA EMPRESA:

RESP. PELA EMPRESA

ENG. FISCAL

João Pedro Santos de Souza
Engenheiro Civil
CREA/RJ 2017107998



Diário de Obras

DIAS CORRIDO 177

Armação dos Búzios

CONTRATO Nº

010/2018

OBRA:

09-out-18

Terça-Feira

OBRA DE PAV. E DRENAGEM DA RUA CANTO DO CÉU E RUA MORRO DAS EMERÊNCIAS (PARTE) NO BAIRRO

TEMPO CLIMA

BOM	X	INSTÁVEL		CHUVOSO		IMPRATICÁVEL	
-----	---	----------	--	---------	--	--------------	--

Pessoal	
Função	Quant.
Engenheiro	1
Encarregado	1
Pedreiro	3
Servente	7
Carpinteiro/Armador	
Calceteiro	

Equipamento	
Descrição	Quant.
Caminhão Toco	1
Compactador sapo	2
Retro escavadeira	1

Serviços Realizados

EXECUÇÃO DE CAIXAS RALO

* EXECUÇÃO DE MEIOS FIO

COMENTÁRIOS DO FISCAL:

COMENTÁRIOS DA EMPRESA:

RESP. PELA EMPRESA

ENG. FISCAL

João Pedro Santos de Souza
Engenheiro Civil
CREA/RJ 2017107998



Diário de Obras

DIAS CORRIDO 178

Armação dos Búzios

CONTRATO Nº

010/2018

OBRA:

10-out-18

Quarta-Feira

OBRA DE PAV. E DRENAGEM DA RUA CANTO DO CÉU E RUA MORRO DAS EMERÊNCIAS (PARTE) NO BAIRRO

TEMPO CLIMA

BOM	X	INSTÁVEL		CHUVOSO		IMPRATICÁVEL	
-----	---	----------	--	---------	--	--------------	--

Pessoal

Função	Quant.
Engenheiro	1
Encarregado	1
Pedreiro	3
Servente	7
Carpinteiro/Armador	
Calceteiro	

Equipamento

Descrição	Quant.
Caminhão Toco	1
Compactador sapo	2
Retro escavadeira	1

Serviços Realizados

ACABAMENTO DE CAIXA DE AREIA

* EXECUÇÃO DE MEIOS FIO

COMENTÁRIOS DO FISCAL:

COMENTÁRIOS DA EMPRESA:

RESP. PELA EMPRESA

ENG. FISCAL

João Pedro Santos de Souza
Engenheiro Civil
CREA/RJ. 20171079-2



Diário de Obras

DIAS CORRIDO 179

Armação dos Búzios

CONTRATO Nº 010/2018

OBRA:

11-out-18

Quinta-Feira

OBRA DE PAV. E DRENAGEM DA RUA CANTO DO CÉU E RUA MORRO DAS EMERÊNCIAS (PARTE) NO BAIRRO

TEMPO CLIMA

BOM	X	INSTÁVEL		CHUVOSO		IMPRATICÁVEL	
-----	---	----------	--	---------	--	--------------	--

Pessoal	
Função	Quant.
Engenheiro	1
Encarregado	1
Pedreiro	3
Servente	7
Carpinteiro/Armador	
Calceteiro	

Equipamento	
Descrição	Quant.
Caminhão Toco	1
Compactador sapo	2
Retro escavadeira	1

Serviços Realizados

FABRICAÇÃO DE CAIXAS RALO DE CONCRETO ARMADO

* LIMPEZA DA OBRA

COMENTÁRIOS DO FISCAL:

COMENTÁRIOS DA EMPRESA:

RESP. PELA EMPRESA

ENG. FISCAL

João Pedro Santos de Souza
Engenheiro Civil
CREA/RJ 2017107998



Diário de Obras

DIAS CORRIDO 180

Armação dos Búzios

CONTRATO Nº 010/2018

OBRA:

12-out-18

Sexta-Feira

OBRA DE PAV. E DRENAGEM DA RUA CANTO DO CÊU E RUA MORRO DAS EMERÊNCIAS (PARTE) NO BAIRRO

TEMPO CLIMA

BOM		INSTÁVEL		CHUVOSO		IMPRATICÁVEL	
-----	--	----------	--	---------	--	--------------	--

Pessoal	
Função	Quant.
Engenheiro	
Encarregado	
Pedreiro	
Servente	
Carpinteiro/Armador	
Calceteiro	

Equipamento	
Descrição	Quant.
Caminhão Toco	
Compactador sapo	
Retro escavadeira	

Serviços Realizados
FERIADO

COMENTÁRIOS DO FISCAL:

COMENTÁRIOS DA EMPRESA:

RESP. PELA EMPRESA

ENG. FISCAL

João Pedro Santos de Souza
Engenheiro Civil
CREA/RJ 201710799-8

Armação dos Búzios

CONTRATO Nº

010/2018

OBRA 13-out-18 14-out-18 Sábado Domingo

OBRA DE PAV. E DRENAGEM DA RUA CANTO DO CÉU E RUA MORRO DAS EMERÊNCIAS (PARTE) NO BAIRRO JOSÉ GOLÇALVES

TEMPO CLIMA

BOM		INSTÁVEL		CHUVOSO		IMPRATICÁVEL	
-----	--	----------	--	---------	--	--------------	--

Pessoal	
Função	Quant.
Engenheiro	
Encarregado	
Pedreiro	
Servente	
Carpinteiro/Armador	
Calceteiro	

Equipamento	
Descrição	Quant.
Caminhão Toco	
Compactador sapo	
Retro escavadeira	

Serviços Realizados

COMENTÁRIOS DO FISCAL:

COMENTÁRIOS DA EMPRESA:

RESP. PELA EMPRESA

ENG. FISCAL

João Pedro Santos de Souza
 Engenheiro Civil
 CREA/RJ 2017107998

Armação dos Búzios

CONTRATO Nº

010/2018

OBRA:

15-out-18

Segunda-Feira

OBRA DE PAV. E DRENAGEM DA RUA CANTO DO CÉU E RUA MORRO DAS EMERÊNCIAS (PARTE) NO BAIRRO

TEMPO CLIMA

BOM	X	INSTÁVEL		CHUVOSO		IMPRATICÁVEL	
-----	---	----------	--	---------	--	--------------	--

Pessoal	
Função	Quant.
Engenheiro	1
Encarregado	1
Pedreiro	3
Servente	7
Carpinteiro/Armador	
Calceteiro	

Equipamento	
Descrição	Quant.
Caminhão Toco	1
Compactador sapo	2
Retro escavadeira	1

Serviços Realizados

FABRICAÇÃO DE CAIXAS RALO DE CONCRETO ARMADO

* COLOCAÇÃO DE MEIOS FIOS

COMENTÁRIOS DO FISCAL:

COMENTÁRIOS DA EMPRESA:

RESP. PELA EMPRESA

ENG. FISCAL

João Pedro Santos de Souza
 Engenheiro Civil
 CREA/RJ 2017107998

Armação dos Búzios

CONTRATO Nº 010/2018

OBRA:

16-out-18

Terça-Feira

OBRA DE PAV. E DRENAGEM DA RUA CANTO DO CÉU E RUA MORRO DAS EMERÊNCIAS (PARTE) NO BAIRRO

TEMPO CLIMA

BOM	X	INSTÁVEL		CHUVOSO		IMPRATICÁVEL	
-----	---	----------	--	---------	--	--------------	--

Pessoal	
Função	Quant.
Engenheiro	1
Encarregado	1
Pedreiro	3
Servente	7
Carpinteiro/Armador	
Calceteiro	

Equipamento	
Descrição	Quant.
Caminhão Toco	1
Compactador sapo	2
Retro escavadeira	1

Serviços Realizados


COLOCAÇÃO DE MEIOS FIOS

COMENTÁRIOS DO FISCAL:

COMENTÁRIOS DA EMPRESA:

RESP. PELA EMPRESA

ENG. FISCAL


 João Pedro Santos de Souza
 Engenheiro Civil
 CREA/RJ 2017107998



Diário de Obras

DIAS CORRIDO 185

Armação dos Búzios

CONTRATO Nº

010/2018

OBRA:

17-out-18

Quarta-Feira

OBRA DE PAV. E DRENAGEM DA RUA CANTO DO CÉU E RUA MORRO DAS EMERÊNCIAS (PARTE) NO BAIRRO

TEMPO CLIMA

BOM	X	INSTÁVEL		CHUVOSO		IMPRATICÁVEL	
-----	---	----------	--	---------	--	--------------	--

Pessoal	
Função	Quant.
Engenheiro	1
Encarregado	1
Pedreiro	3
Servente	7
Carpinteiro/Armador	
Calceteiro	

Equipamento	
Descrição	Quant.
Caminhão Toco	1
Compactador sapo	2
Retro escavadeira	1

Serviços Realizados

PREPARAÇÃO DE TERRENO PARA COLOCAÇÃO DE MEIOS FIO


* COLOCAÇÃO DE MEIOS FIOS

COMENTÁRIOS DO FISCAL:

COMENTÁRIOS DA EMPRESA:

RESP. PELA EMPRESA

ENG. FISCAL


 João Pedro Santos de Souza
 Engenheiro Civil
 CREA/RJ 2017107998

Armação dos Búzios

CONTRATO Nº

010/2018

OBRA:

18-out-18

Quinta-Feira

OBRA DE PAV. E DRENAGEM DA RUA CANTO DO CÉU E RUA MORRO DAS EMERÊNCIAS (PARTE) NO BAIRRO

TEMPO CLIMA

BOM	X	INSTÁVEL		CHUVOSO		IMPRATICÁVEL	
-----	---	----------	--	---------	--	--------------	--

Pessoal	
Função	Quant.
Engenheiro	1
Encarregado	1
Pedreiro	3
Servente	7
Carpinteiro/Armador	
Calceteiro	

Equipamento	
Descrição	Quant.
Caminhão Toco	1
Compactador sapo	2
Retro escavadeira	1

Serviços Realizados

FABRICAÇÃO DE CAIXAS RALO DE CONCRETO ARMADO


* COLOCAÇÃO DE MEIOS FIOS

COMENTÁRIOS DO FISCAL:

COMENTÁRIOS DA EMPRESA:

RESP. PELA EMPRESA

ENG. FISCAL


 João Pedro Santos da Souza
 Engenheiro Civil
 CREA/RJ 2017/107998



Diário de Obras

DIAS CORRIDO 187

Armação dos Búzios

CONTRATO Nº

010/2018

OBRA:

19-out-18

Sexta-Feira

OBRA DE PAV. E DRENAGEM DA RUA CANTO DO CÉU E RUA MORRO DAS EMERÊNCIAS (PARTE) NO BAIRRO

TEMPO CLIMA

BOM	X	INSTÁVEL		CHUVOSO		IMPRATICÁVEL	
-----	---	----------	--	---------	--	--------------	--

Pessoal	
Função	Quant.
Engenheiro	1
Encarregado	1
Pedreiro	3
Servente	7
Carpinteiro/Armador	
Calceteiro	

Equipamento	
Descrição	Quant.
Caminhão Toco	1
Compactador sapo	2
Retro escavadeira	1

Serviços Realizados

COLOCAÇÃO DE MEIOS FIOS

* LIMPEZA DA OBRA

COMENTÁRIOS DO FISCAL:

COMENTÁRIOS DA EMPRESA:

RESP. PELA EMPRESA

ENG. FISCAL

João Pedro Santos de Souza
Engenheiro Civil
CREA/RJ 2017107998



Diário de Obras

DIAS CORRIDO 188 189

Armação dos Búzios

CONTRATO Nº

010/2018

OBRA 20-out-18 21-out-18 Sábado Domingo

OBRA DE PAV. E DRENAGEM DA RUA CANTO DO CÉU E RUA MORRO DAS EMERÊNCIAS (PARTE) NO
BAIRRO JOSÉ GOLÇALVES

TEMPO CLIMA

BOM INSTÁVEL CHUVOSO IMPRATICÁVEL

Pessoal	
Função	Quant.
Engenheiro	
Encarregado	
Pedreiro	
Servente	
Carpinteiro/Armador	
Calçeteiro	

Equipamento	
Descrição	Quant.
Caminhão Toco	
Compactador sapo	
Retro escavadeira	

Serviços Realizados

COMENTÁRIOS DO FISCAL:

COMENTÁRIOS DA EMPRESA:

RESP. PELA EMPRESA

ENG. FISCAL

João Pedro Santos de Souza
Engenheiro Civil
CREA/RJ-2017/107998

Diário de Obras

DIAS CORRIDO 190

Armação dos Búzios

CONTRATO Nº 010/2018

OBRA:

22-out-18

Segunda-Feira

OBRA DE PAV. E DRENAGEM DA RUA CANTO DO CÉU E RUA MORRO DAS EMERÊNCIAS (PARTE) NO BAIRRO

TEMPO CLIMA

BOM	X	INSTÁVEL		CHUVOSO		IMPRATICÁVEL	
-----	---	----------	--	---------	--	--------------	--

Pessoal	
Função	Quant.
Engenheiro	1
Encarregado	1
Pedreiro	3
Servente	7
Carpinteiro/Armador	
Calceteiro	

Equipamento	
Descrição	Quant.
Caminhão Toco	1
Compactador sapo	2
Retro escavadeira	1

Serviços Realizados

EXECUÇÃO DE REBAIXAMENTO DE CALÇADA


* ACABAMENTO DE CAIXAS RALO

COMENTÁRIOS DO FISCAL:

COMENTÁRIOS DA EMPRESA:

RESP. PELÁ EMPRESA

ENG. FISCAL



João Pedro Santos de Souza
Engenheiro Civil
CREA/RJ 2017101998



Diário de Obras

DIAS CORRIDO 191

Armação dos Búzios

CONTRATO Nº

010/2018

OBRA:

23-out-18

Terça-Feira

OBRA DE PAV. E DRENAGEM DA RUA CANTO DO CÉU E RUA MORRO DAS EMERÊNCIAS (PARTE) NO BAIRRO

TEMPO CLIMA

BOM	X	INSTÁVEL		CHUVOSO		IMPRATICÁVEL	
-----	---	----------	--	---------	--	--------------	--

Pessoal	
Função	Quant.
Engenheiro	1
Encarregado	1
Pedreiro	3
Servente	7
Carpinteiro/Armador	
Calceteiro	

Equipamento	
Descrição	Quant.
Caminhão Toco	1
Compactador sapo	2
Retro escavadeira	1

Serviços Realizados

PREPARAÇÃO DE TERRENO PARA COLOCAÇÃO DE MEIOS FIO


* COLOCAÇÃO DE MEIOS FIOS

COMENTÁRIOS DO FISCAL:

COMENTÁRIOS DA EMPRESA:

RESP. PELA EMPRESA

ENG. FISCAL


 João Pedro Santos de Souza
 Engenheiro Civil
 CREA/RJ 2017107998


DAFLA

CONSTRUÇÃO | SERVIÇOS | GERENCIAMENTO

Diário de Obras

DIAS CORRIDO 193

Armação dos Búzios

CONTRATO Nº

010/2018

OBRA:

25-out-18

Quinta-Feira

OBRA DE PAV. E DRENAGEM DA RUA CANTO DO CÉU E RUA MORRO DAS EMERÊNCIAS (PARTE) NO BAIRRO

TEMPO CLIMA

BOM		INSTÁVEL		CHUVOSO		IMPRATICÁVEL	X
-----	--	----------	--	---------	--	--------------	---

Pessoal

Função	Quant.
Engenheiro	1
Encarregado	1
Pedreiro	3
Servente	7
Carpinteiro/Armador	
Calceteiro	

Equipamento

Descrição	Quant.
Caminhão Toco	1
Compactador sapo	2
Retro escavadeira	1

Serviços Realizados

COMENTÁRIOS DO FISCAL:

COMENTÁRIOS DA EMPRESA:

RESP. PELA EMPRESA

ENG. FISCAL

João Pedro Santos de Souza
 Engenheiro Civil
 CREA/RJ 2017107998



DAFLA
CONSTRUÇÃO | SERVIÇOS | GERENCIAMENTO

Diário de Obras

DIAS CORRIDO 192

Armação dos Búzios

CONTRATO Nº

010/2018

OBRA:

24-out-18

Quarta-Feira

OBRA DE PAV. E DRENAGEM DA RUA CANTO DO CÉU E RUA MORRO DAS EMERÊNCIAS (PARTE) NO I

TEMPO CLIMA

BOM	X	INSTÁVEL		CHUVOSO		IMPRATICÁVEL
-----	---	----------	--	---------	--	--------------

Pessoal	
Função	Quant.
Engenheiro	1
Encarregado	1
Pedreiro	3
Servente	7
Carpinteiro/Armador	
Calceteiro	

Equipamento
Descrição
Caminhão Toco
Compactador sapo
Retro escavadeira

Serviços Realizados

* PREPARAÇÃO DE TERRENO PARA COLOCAÇÃO DE MEIOS FIO

* COLOCAÇÃO DE MEIOS FIOS

COMENTÁRIOS DO FISCAL:

COMENTÁRIOS DA EMPRESA:

RESP. PELA EMPRESA

ENG. FISCAL

João Pedro Santos de Souza
Engenheiro Civil
CREA RJ 2017107998

Armação dos Búzios

CONTRATO Nº

010/2018

OBRA:

26-out-18

Sexta-Feira

OBRA DE PAV. E DRENAGEM DA RUA CANTO DO CÉU E RUA MORRO DAS EMERÊNCIAS (PARTE) NO BAIRRO

TEMPO CLIMA

BOM		INSTÁVEL		CHUVOSO	X	IMPRATICÁVEL	
-----	--	----------	--	---------	---	--------------	--

Pessoal	
Função	Quant.
Engenheiro	1
Encarregado	1
Pedreiro	3
Servente	7
Carpinteiro/Armador	
Calceteiro	

Equipamento	
Descrição	Quant.
Caminhão Toco	1
Compactador sapo	2
Retro escavadeira	1

Serviços Realizados

ACABAMENTO DE CAIXAS RALO

COMENTÁRIOS DO FISCAL:

COMENTÁRIOS DA EMPRESA:

RESP. PELA EMPRESA

ENG. FISCAL

João Pedro Santos da Souza
 Engenheiro Civil
 CREA/RJ 2017107998



Diário de Obras

DIAS CORRIDO 195 196

Armação dos Búzios

CONTRATO Nº 010/2018

OBRA 27-out-18 28-out-18 Sábado Domingo

OBRA DE PAV. E DRENAGEM DA RUA CANTO DO CÉU E RUA MORRO DAS EMERÊNCIAS (PARTE) NO BAIRRO JOSÉ GOLÇALVES

TEMPO CLIMA

BOM INSTÁVEL CHUVOSO IMPRATICÁVEL

Pessoal	
Função	Quant.
Engenheiro	
Encarregado	
Pedreiro	
Servente	
Carpinteiro/Armador	
Alceteiro	

Equipamento	
Descrição	Quant.
Caminhão Toco	
Compactador sapo	
Retro escavadeira	

Serviços Realizados


COMENTÁRIOS DO FISCAL:

COMENTÁRIOS DA EMPRESA:

RESP. PELA EMPRESA

ENG. FISCAL

João Pedro Santos de Souza
Engenheiro Civil
CREA RJ 2017107998



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO

Folha: 333

Ao Escritório de Gestão e Projetos,

Encaminho este processo administrativo para que sejam informados os valores discriminados para pagamento da NF nº 06.

Sem mais para o momento, após atendimento do solicitado, favor retornar o processo a esta Secretaria para que seja elaborado o demonstrativo de pagamento e o checklist.

Armação dos Búzios, 07 de junho de 2019

Atenciosamente,

Nicole Speroni Gomes

Gerente de Obras e Saneamento

Nicole Speroni Gomes

SEC. DE OBRAS E SANEAMENTO

Gerente de Obras e Saneamento

Mat. 16 626



Prefeitura da Cidade de Armação dos Búzios
Secretaria Planejamento e Projetos
Escritório de Gestão de Projetos

Processo: 6445/2018


fls: 334

Prezados,


Informo que o pagamento da 3ª medição no valor de **R\$ 330.489,76** deverá ser feito integralmente com verba de contrapartida.

Atenciosamente,

Armação dos Búzios, 07 de junho de 2019.



ALBERTO F. DA V. JORDÃO CORDEIRO
Secretário Especial de Projetos e Convênios



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Processo: 611/2017

Contrato Convênio N°: 831101/2016

Nota Fiscal n°: 6

Medição: 3ª

Valor total Nota Fiscal	R\$ 330.489,76	Empenho	Fonte
Contrapartida	R\$ 330.489,76	493/18	175


Paulo Abranches Guedes Junior
Secretário Municipal de Obras e Saneamento

Eng. Paulo Abranches
SECRETÁRIO DE OBRAS
E SANEAMENTO
Mat. 12.976

Armação dos Búzios, 13 de novembro de 2018.

A

Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - Armação dos Búzios -RJ.

REFERÊNCIA: CONTRATO Nº 010/2018.

Prezados Senhores,

A **DAFLA CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E GERENCIAMENTO LTDA- EPP**, CNPJ 12.603.970/0001-60, neste ato representada por seu sócio, **DANILO BRAZ PEREIRA**, portador da carteira de identidade nº 13287187-2 IFP-RJ e CPF nº 096.787.977-98, vem, respeitosamente, perante a ilustre presença de Vossa Senhoria, dentro do prazo legal, apresentar Ofício de **Solicitação de Suspensão de Prazo Contratual**, expondo para tanto os fatos e fundamentos a seguir deduzidos:

Dos Fatos:

A Empresa qualificada acima participou e foi declarada vencedora da **Concorrência Pública 005/2017**, conforme processo licitatório homologado e publicado;

Em 09 de Abril de 2018, a Secretaria Municipal de Obras e Saneamento, através de seu Secretário, expediu **AUTORIZAÇÃO PARA INÍCIO DE OBRA** à empresa DAFLA, obedecendo integralmente às especificações e determinações do Projeto Básico e Contrato nº 010/2018.

Conforme Ordem de Serviço expedida, a obra foi iniciada no prazo autorizado e feita a 1ª medição de obra, juntamente com o Engenheiro



designado pela Secretaria Municipal de Obras, no valor de R\$134.842,88 (cento e trinta e quatro mil, oitocentos e quarenta e dois reais e oitenta e oito centavos). Em 11 de junho de 2018, emitida a Nota Fiscal referente à 1ª Medição, com pagamento efetuado 15 (quinze) dias depois.

A 2ª medição da obra foi feita, normalmente, pela Secretaria Municipal de Obras, e no dia 17 de Julho de 2018 foi emitida a NF referente à respectiva medição, no valor de R\$192.212,70 (cento e noventa e dois mil, duzentos e doze reais e setenta centavos), no entanto, até hoje, dia 13 de novembro de 2018, 119 (cento e dezenove) dias após a sua emissão, ainda não houve sua quitação.

Ressaltamos que mesmo com todos os problemas de atrasos, a obra continua com força total. Engenheiros responsáveis da Secretaria Municipal de obras sempre presentes fiscalizando e acompanhando e, com isso, inclusive já com a 3ª medição prevista no valor de R\$422.447,54 (quatrocentos e vinte e dois mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos).

Neste sentido, da emissão da Nota Fiscal da 2ª medição até hoje, dia 13 de novembro de 2018, são 119 (cento e dezenove) dias de atraso! Se contabilizarmos o período que compreende o recebimento da 1ª e única medição quitada até hoje, são 140 (cento e quarenta) dias de execução de obra sem pagamento algum com um crédito de R\$615.660,24 (seiscentos e quinze mil, seiscentos e sessenta reais e vinte e quatro centavos) referente à 2ª e 3ª medições, sem contabilizarmos serviços executados que dariam uma 4ª medição ainda não formalizada!

Apesar de todo nosso esforço em manter o andamento da obra, não nos resta outra alternativa, diante dos fatos apresentados e da falta de pagamento, solicitar, à Vossa Senhoria, a **Suspensão do Contrato**

conforme determina a Lei 8.666/93, no seu artigo 78, até que o pagamento seja regularizado.

Vejamos:

Artigo 78, Inciso XV da Lei 8.666/93:

XV - o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes de obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação;

Nos colocamos à disposição para esclarecimentos necessários.

Att.

DAFLA CONSTRUÇÃO SERVIÇOS
E GERENCIAMENTO LTDA - EPP
CNPJ: 12.603.970/0001-60



DANILO BRAZ PEREIRA

DAFLA CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E GERENCIAMENTO LTDA - EPP



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO

339


Armação dos Búzios, 13 de novembro de 2018

Ref.: Pedido de paralisação da obra de Pavimentação e Drenagem da Rua Canto do Céu e Rua Morro das Emerências (parte) no bairro José Gonçalves

Processo: 611/2017

Contrato: 010/2018


Em atendimento ao pedido de paralisação feito pela empresa DAFLA CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E GERENCIAMENTO LTDA EPP, declaramos estar ciente e de acordo.



João Pedro Santos de Souza

Gerente de Saneamento

Engenheiro Civil Fiscal – CREA/RJ 2017107998




Paulo Abranches Guedes Junior

Secretário Municipal de Obras e Saneamento

Eng. Paulo Abranches

SECRETÁRIO DE OBRAS
E SANEAMENTO

Mat. 12.974



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO

Armação dos Búzios, 07 de junho de 2019

REINÍCIO DE PRAZO CONTRATUAL

Ref.: Pavimentação e Drenagem da Rua Canto do Céu e Rua Morro das Emergências (parte) no bairro José Gonçalves

Processo: 611/2017

Contrato: 010/2018

Informo o reinício do prazo contratual a contar de 11 de junho de 2019, tendo em vista a necessidade da realização de pagamento à empresa.


Prazo: 04/11/2019

Sendo o que temos até o presente, firma,

Atenciosamente,

Paulo Abranches Guedes Junior
Secretário Municipal de Obras e Saneamento

Eng. Paulo Abranches
SECRETÁRIO DE OBRAS
E SANEAMENTO
Mat. 12.974



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO

Processo Nº: 6445/2018 | Folha: 341

EXAME

CONTRATO: 010/2018

CONTRATADO: DAFLA CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E GERENCIAMENTO LTDA-EPP

OBJETO: Pavimentação e Drenagem da Rua Canto do Céu e Rua Morro das Emergências (Parte)

VALOR TOTAL DA OBRA: R\$ 1.447.850,10


VALOR DA 3ª MEDIÇÃO: R\$ 330.489,76


PERÍODO DA MEDIÇÃO: 25/06/2018 à 13/11/2018

TÉRMINO: 04/11/2019

ITEM	DESCRIÇÃO	CUMPRIMENTO		
		SIM	N.A.	FLS.
1	Foi apresentada Carta da Empresa?	X	-	201
2	Foi apresentado o Atestado de Execução do Contrato?	X	-	202
3	Existe vigência contratual para o período em questão?	X	-	66 à 83 e 336 a 340
4	Há Portaria de Nomeação Fiscal, caso tenha-se feito necessário?	X	-	07
5	Foi apresentada Nota Fiscal?	X	-	203
6	A Nota Fiscal está devidamente atestada por dois funcionários, sendo um deles o fiscal do contrato?	X	-	203
7	Foi apresentada Planilha de Medição a qual se refere?	X	-	204 à 209
8	Foi apresentada Memória de Cálculo?	X	-	210 à 216
9	Foi apresentado o Cronograma Físico-Financeiro?	X	-	118
10	Foi apresentado Relatório Fotográfico?	X	-	217 à 221
11	Foram apresentadas as certidões da empresa?	X	-	222 à 224
12	Foi anexado o Diário de Obra devidamente preenchido?	X	-	225 à 332
13	Foi anexada a cópia da Nota de Empenho?	X	-	162
14	Foi anexado o Demonstrativo de Pagamento?	X	-	335

Encaminham-se os autos para análise inicial do Patrimônio, Coordenadoria de Fiscalização e posteriormente seja remetida à Liquidação para que sejam tomadas as devidas providências quanto ao pagamento por parte da Prefeitura Municipal de Armação dos Búzios.


Nicole Speroni Gomes
Gerente de Obras e Saneamento
Nicole Speroni Gomes
SEC. DE OBRAS E SANEAMENTO
Gerente de Obras e Saneamento
Mat. 16 626



PREFEITURA DA CIDADE DE ARMACAO DOS BUZIOS

3426

13/06/2019 12:05:47

Estrada da Usina, 600
Centro
Armação dos Búzios
RJ

Detalhe do Bem

Código:	Nome:			
66665	MORRO DAS EMERÊNCIAS - RECUPERAÇÃO DA ESTRADA			
Nº da Plaqueta:	051298			
Nº de Nota Fiscal:	201800000000004	Valor Incorporado:	134.842,88	Data da Posse: 15/06/2018
Nº do Empenho:	258/2018	Nº do Processo:	6445/2018	Valor Atual: 657.545,34
Fornecedor	DAFLA CONSTRUCAO SERVICOS E GERENC			Nº da Licitação: 005/2017

Unidade Gestora	Centro de Custo	
Prefeitura Municipal de Armação dos Búzios	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SANEAMENTO	
Local SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO		
Plano de Contas	Grupo	Situação
30-30202 BENS IMÓVEIS DE INFRA ESTRUTURA	201	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM
		IMÓVEL

1ª MEDIÇÃO: Serviço de Recuperação da Estrada Morro das Emerências. Processo de Origem nº 00611/2017. Processo de Pagamento nº 06445/2018. Empenhos nº 000257 e 000258/2018. Nota Fiscal nº 201800000000004.

Reavaliações

Data:	Valor:	Observação:	Nota fiscal	Fornecedores
Processo: 6445		Ano do Processo: 2018		
Empenho: 258		Ano do Empenho: 2018		
24/07/2018	192.212,70	2ª MEDIÇÃO: Serviço de Recuperação da Estrada Morro das Emerências. Processo de Origem nº 00611/2017. Processo de Pagamento nº 06445/2018. Empenhos nº 000257 e 000258/2018. Nota Fiscal nº 201800000000008	201800000000	DAFLA CONSTRUCAO SERVICOS
13/06/2019	330.489,76	3ª MEDIÇÃO: Serviço de Recuperação da Estrada Morro das Emerências. Processo de Origem nº 00611/2017. Processo de Pagamento nº 06445/2018. Empenhos nº 000257 e 000258/2018. Nota Fiscal nº 201900000000006	201900000000	DAFLA CONSTRUCAO SERVICOS

Características Veículos

Soma das Reavaliações: 522.702,46

Placa:	Chassi:	Espécie - Tipo:
Combustível:	Ano Fabricação:	Renavam:
Ano - Modelo:	Cor Predominante:	



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Armação dos Búzios

Folha nº 343

Folha de Informação

Anexada ao Processo nº

6445 / 2018

Rubrica do Funcionário

AO FISCAL

Em atenção solicitação
P.O3 de 13/06/19, requere
uma análise quanto a
retenção.

Em 18/06/19

Maria Elizabeth da Silva
Agente Fazendário
Mat. n° 3348

Parecer fiscal

Pela retenção do ISSQN na
NFe no 06/2019, de fls 203,
no valor de R\$ 330.489,76
com aplicação de alíquota
de 5% (cinco por cento).

Em 18.06.2019

Marcelo Pacheco Fernandes
Agente Fiscal Fazendário
Mat: n° 18779

A LIQUIDACÃO

Encaminhe-lhe o presente
processo após emitir o comprovante
de retenção sobre a nota fiscal
de 00%.

em 19/06/2019

19858



PREFEITURA DA CIDADE DE ARMACAO DOS BUZIOS
Secretária Municipal de Fazenda - SEMFA
ISS RETENCAO PREFEITURA

PRESTADOR CÓDIGO: 890913	PRESTADORA EMPRESA: DAFLA CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E GERENCIAMENT		
TOMADORA CÓDIGO: 918	TOMADORA EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS		
TIPO / NOME LOGRADOURO: RUA DA USINA VELHA		NÚMERO: 600	
COMPLEMENTO:		BAIRRO: CENTRO	
MUNICÍPIO: Armação dos Búzios		UF: RJ	
Nº DAM 17494434	Nº Lançamento 2111521		
BASE DE CÁLCULO: 330.489,76	ALÍQUOTA: 5,00 %	VALOR DO IMPOSTO: 16.524,49	VALOR TOTAL: 16.524,49
PARCELA: 1/1	MES REFERÊNCIA: MAIO	EXERCÍCIO: 2019	DATA DE VENCIMENTO: 10/06/2019
OBSERVAÇÕES: comprovante fiscal de retenção sobre a nota fiscal nº 006/2019 - processo			

Data de Emissão 19/06/2019 9:36:39 Emitido por: claudenir



PREFEITURA DA CIDADE DE ARMACAO DOS BUZIOS
Secretária Municipal de Fazenda - SEMFA
ISS RETENCAO PREFEITURA

PARCELA: 1/1		VENCIMENTO: 10/06/2019	
INSCRIÇÃO:	EMPRESA: DAFLA CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E GERENCIA	Nº DAM: 17494434	
INSTRUÇÕES:			
		(+) VALOR DEVIDO - R\$	16.524,49
		(-) VALOR DESCONTO - R\$	0,00
		(+) CORREÇ. MONET. - R\$	0,00
		(+) MULTA DE MORA - R\$	0,00
		(+) JUROS DE MORA - R\$	0,00
		(+) TAXA EMIS. GUIA - R\$	0,00
		(=) VALOR A PAGAR - R\$	\$16.524,49

81660000165.4 24494849201.6 90610000000.7 01749443405.7



Data de Emissão 19/06/2019 9:36:39 Emitido por: claudenir

ISS RETIDO PELA PREFEITURA

395

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 12.603.970/0001-60**Razão Social:** DAFLA CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E GERENCIAMENTO LTDA EPP**Endereço:** EST FRANCISCO DA CRUZ NUNES / 8180 / ITAIPU NITEROI - RJ

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.


O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 12/06/2019 a 11/07/2019**Certificação Número:** 2019061203481820367109

Informação obtida em 19/06/2019 10:10:17

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

OK



PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
COORDENADORIA DE LIQUIDAÇÃO

DEMONSTRATIVO DE VALORES PARA RETENÇÃO

CONTRATO: 010/2018 **CONTRATADO:** DAFLA CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E GERENCIAMENTO LTDA EPP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM DA RUA CANTO DO CÉU E RUA MORRO DAS EMERÊNCIAS (PARTE) NO BAIRRO JOSÉ GONÇALVES.

VALOR BRUTO: R\$ 330.489,76 **PERÍODO:** 25/06/2018 A 13/11/2018 **TERMINO:** 04/11/2019

RETENÇÃO				
TRIBUTO	ALÍQUOTA	FATOR	VALOR	FUNDAMENTO
INSS	0%	100%	-	Art. 112, C/c Art. 149, VII, IN 971/2009 - Para os casos de obra
IR	0,0%	100,00	-	Exceção ao Art. 647, §1, 17.
ISS	5%	100%	16.524,49	Despacho exarado pela GEFIS à fl. 344

OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL: NÃO

VALOR TOTAL DA RETENÇÃO: 16.524,49

VALOR LÍQUIDO A PAGAR: 313.965,27

Armação dos Búzios, 19 de junho de 2019



PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
COORDENADORIA DE LIQUIDAÇÃO
EXAME PARA LIQUIDAÇÃO

CONTRATO: 010/2018 **CONTRATADO:** DAFLA CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E GERENCIAMENTO LTDA EPP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM DA RUA CANTO DO CÉU E RUA MORRO DAS EMERÊNCIAS (PARTE) NO BAIRRO JOSÉ GONÇALVES.

VALOR BRUTO: R\$ 330.489,76 **PERÍODO:** 25/06/2018 À 13/11/2018 **TERMINO:** 04/11/2019

ITEM	DESCRIÇÃO	CUMPRIMENTO		
		SIM	N.A	FLS
1	Foi apresentada relatório/medição do serviço?	X		204
2	Foi apresentada relatório do fiscal do contrato?	X		202
3	Os itens, quantidades e preços unitários estão de acordo com a proposta e com o cronograma físico financeiro ou cronograma de execução?	X		22
4	Em caso de registro de preço, foi verificado o saldo de ata?		X	-
5	Existe vigência contratual para o período em questão?	X		66/339/340
	Há manifestação do setor de patrimônio quando se trata de bens permanentes ou obras	X		342
7	Há manifestação do setor de contabilidade quando se trata de bens permanentes ou obras		X	-
8	A nota fiscal está dentro da validade, sem rasuras, e foi verificada sua autenticidade?	X		203
9	A natureza da operação está de acordo com o tipo de documento fiscal emitido	X		203
10	A nota fiscal está atestada por 2 funcionários sendo um deles o fiscal do contrato	X		203
11	Se convênio, foi observado a indicação do mesmo na nota fiscal		X	-
12	a nota de empenho está assinada e preenchida corretamente	X		162
13	a fonte orçamentária está de acordo com a legislação em vigor	X		162
14	observou-se a retenção dos tributos (IRRF, ISSQN, INSS)	X		346
15	foi apresentada a regularidade perante o INSS e FGTS	X		223/345
16	o endereço e CNPJ das certidões é o mesmo da nota fiscal	X		203
17	Verificou-se GEFIP, bem como pagamento da GPS E GRF se o serviço envolve mão de obra?		X	-
18	Há saldo de empenho para quitação da despesa?	X		162
19	Há designação do gerente fiscal do contrato?	X		7
20	A nota está direcionada ao fundo competente?	X		203

☐ ECER CONCLUSIVO

Sr(a) Secretário(a),

Em análise da documentação acostada ao presente, não encontra esta coordenadoria de liquidação qualquer óbice para liquidação da despesa. Sugerindo desta forma a remessa à Coordenadoria do Tesouro para análise e emissão da ordem de pagamento.

Armação dos Búzios, 19 de junho de 2019

VICTOR AGUIAR DA SILVA
 Coordenador de Liquidação

De acordo, à Coordenadoria do Tesouro, autorizo o prosseguimento na liquidação da despesa e emissão da ordem de pagamento conforme informado acima.

PAULO ABRANCHES GUEDES JÚNIOR
 Secretário Municipal de Obras e Saneamento
 Ordenador da Despesa

**PREFEITURA MUN. DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS**

ESTRADA DA USINA, N. 600

CENTRO

ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

- RJ

C.N.P.J.: 01.616.171/0001-02



Processo: 6445/2018

Data: 16/10/19

Folha: 348

Rubrica: 2

Nota de Liquidação

Processo: 6445/2018		Data: 16/10/2019		OP: 192338	
Credor: 9658 - DAFLA CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E GERENCIAMENTO LTDA					
Endereço: ESTRADA FRANCISCO DA CRUZ NUNES NÚMERO 8180 SALA 210					
Bairro: ITAIPU					
Cidade: NITERÓI - RJ					
CNPJ/CPF: 12.603.970/0001-60					
Beneficiário: DAFLA CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E GERENCIAMENTO LTDA					
Histórico: CONTRATO Nº. 010/2018 DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS RUAS CANTO DO CÉU E MORRO DAS EMERÊNCIAS NO BAIRRO DE JOSÉ GONÇALVES REFERENTE AO PERÍODO DE 25/06/18 A 13/11/18 (3ª MEDIÇÃO) CONFORME NF. 201900000000006 À FL. 203.					
Dotações					
Empenho: 493/2018 - RESTOS A PAGAR FONTE: 175 - M.C.DANOS URBANÍSTICOS					
Unidade: 01.07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO					
Função: 15 - URBANISMO					
Proj/Ativ: 1.232 Sistema de drenagem dos bairros					
Sub-Função: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA					
Elem. Desp.: 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES					
Programa: 0028 - Infraestrutura Urbana					
SALDO ANT. DO EMPENHO	VALOR BRUTO LIQUIDADO	RETENÇÕES/CONSIGNAÇÕES	LIQUIDAÇÃO	SALDO DO EMPENHO	
330.794,52	330.489,76	16.524,49	313.965,27	304,76	
Descontos					
RETENÇÃO					
1118023101002 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Retenção					
16.524,49					
TOTAL: 16.524,49					
VALOR BRUTO		TOTAL RETIDO		TOTAL LÍQUIDO	
330.489,76		16.524,49		313.965,27	
VALOR LÍQUIDO POR EXTENSO					
trezentos e treze mil, novecentos e sessenta e cinco reais e vinte e sete centavos					
A Liquidação da despesa Contraída pela nota de empenho acima citada foi realizada pela coordenadoria de liquidação através do laudo de conferência.			Face a Liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou ao seu procurador conforme Artigo 64 da Lei 4.320/64.		
 ANA PAULA FIGUEIREDO NOGUEIRA Gerente de Ordem de Pagamento			 AKIHIRO SUMAVIELLE TOKUDA Secretário M. de Obras e Saneamento		

3461

Cadastro Localizar

Empenho	Saldo Atual Liquidação	Valor da Retenção *
493/2018	313,965,27	16.524,49
Cód. *	Conta *	Tipo
1118023101002	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Retenção (NE)	

Empenho	Conta	Valor da Retenção
1 493/2018	1118023101002 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Retenção	16.524,49

Total Retido

16.524,49

Processo: 6445/18

Fl. 350

Coordenadoria de Tesouro, 16 de Outubro de 2019.

À Secretaria de Obras e Saneamento,

Encaminhamos processo de pagamento para análise prévia e autorização do Ordenador de Despesa.

Atenciosamente,



Arthur de Oliveira Tardelli
Coordenador do Tesouro

fechar X

Loading Image...

Usuário: JUR DE OLIVEIRA TARDELLI

CPF: 154.777-16

21/10/2019 09:57 - n/a Sair do Sistema

351

Cadastro
Programa
Propostas
Execução
Inf. Gerenciais
Cadastros
Acomp. e Fiscalização
Prestação de Contas
Administração
TCE
Verificação de Regularidade

Principal Consultar Convênio Ingresso de Contrapartida

Pagamento a Favorecido com OBTV

00 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Convênio 831101/2016

Convênio

Documento de Liquidação

Detalhes do Pagamento

Histórico

Anexos

Dados do Documento de Liquidação

Documento de Liquidação *

201900000000006 - DAFLA CONSTRUCAO SERVICOS E GERENCIAMENTO LTDA. ▼

Tipo de Pagamento

☒ Pagamento Total ☐ Pagamento Parcial

Valor Original

R\$ 330.489,76

Valor Líquido Atual

R\$ 313.965,27

Tipo

NOTA FISCAL

Data de Emissão

16/05/2019

Favorecido

CNPJ/CPF/IG

12.603.970/0001-60

Nome/Razão Social

DAFLA CONSTRUCAO SERVICOS E GERENCIAMENTO LTDA.

Domicílio Bancário do Favorecido

Banco

104

Agência

3022

Conta-Corrente

6249

Processo de Execução

Número

005/2017

Modalidade

CONCORRENCIA

Contrato Vinculado

000010/2018

Data de Assinatura

20/03/2018

352

Itens de Despesa

Descrição	Valor Unitário (R\$)	Quantidade	Valor Total (R\$)
3ª medição	330.489,76	1	330.489,76

Rateio por Natureza de Despesa

Natureza de Despesa	Valor Rateado (R\$)
44905199 - OBRAS E INSTALACOES	330.489,76

Tributos

Extera	Tributo	Aliquota (%)	Valor (R\$)
MUNICIPAL	ISS	5,00	16.524,49

Contribuições

Não há registros a exibir.

Outras Retenções

Não há registros a exibir.


[Voltar](#)

Coordenadoria de Tesouro, 21 de Agosto de 2019.

A Secretaria de Planejamento e Projetos,

Após o pagamento encaminho processo para prosseguimento.

Atenciosamente,



Arthur de Oliveira Tardelli
Coordenador do Tesouro



ANÁLISE DO CONVÊNIO

CONTRATO: MORRO DAS EMERÊNCIAS

PARCELA	ORIGEM DO RECURSO	EMPENHO	VALOR	TOTAL DA PARCELA	TOTAL PAGO
1º PAGAMENTO	CONVÊNIO	258/18	R\$ 124.842,88	R\$ 134.842,88	R\$ 657.545,34
	CONTRAPARTIDA	257/18	R\$ 10.000,00		
2º PAGAMENTO	CONVÊNIO	258/18	R\$ 85.157,12	R\$ 192.212,70	
	CONTRAPARTIDA	493/18	R\$ 107.055,58		
3º PAGAMENTO	CONTRAPARTIDA	493/18	R\$ 330.489,76	R\$ 330.489,76	
4º PAGAMENTO	CONVÊNIO				
	CONTRAPARTIDA				
5º PAGAMENTO	CONVÊNIO				
	CONTRAPARTIDA				

VALOR DO CONVÊNIO	R\$ 1.000.000,00
TOTAL PAGO CONVÊNIO	R\$ 210.000,00
RESTOS A PAGAR =	R\$ 790.000,00

VALOR DA CONTRAPARTIDA	R\$ 447.850,10
TOTAL PAGO CONTRAPARTIDA	R\$ 447.545,34
RESTOS A PAGAR =	R\$ 304,76


VALOR ATUAL DO CONTRATO	R\$ 1.447.850,10
TOTAL PAGO	R\$ 657.545,34
RESTOS A PAGAR =	R\$ 790.304,76


VALOR ORIGINAL DO CONTRATO	R\$ 1.447.850,10
VALOR DO ADITIVO	R\$ 0,00
VALOR ATUAL DO CONTRATO	R\$ 1.447.850,10

DATA DO LEVANTAMENTO - 21/10/2019

Após análise do EGP, segue para a Controladoria Geral PARA PROSSEGUIMENTO.

Armação dos Búzios, 21/10/2019.


Érica Sanchez Muniz de Oliveira
Gerente



PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BUZIOS
CONTROLADORIA -GERAL DO MUNICÍPIO

Processo: 6445/2018 - Fls.355

Armação dos Búzios, 22/10/2019

À Secretaria Municipal de Obras e Saneamento,

Em atenção ao presente processo administrativo vimos tecer as seguintes considerações:
Trata-se de processo cujo pedido é a sua análise, por esta COGEM.
Neste sentido, no que tange ao procedimento de pagamento da despesa ora faturada, observa-se que foram atendidos os seguintes itens:

ITEM	DESCRIÇÃO	CUMPRIMENTO			FLS.
		SIM	NÃO	N. A.	
1	Foi realizado cálculo de retenção de impostos?	X			346
2	Foi Realizado exame para liquidação?	X			347
3	O Empenho está devidamente assinado pelo ordenador da despesa?	X			162
4	O Empenho está de acordo com o credor e o objeto?	X			162
5	A Ordem de Pagamento está devidamente assinada pelo ordenador da despesa?	X			348
6	O pagamento foi realizado através da conta bancária com recursos na mesma fonte de empenho?	X			351
7	O pagamento foi creditado devidamente na conta indicada pelo credor?	X			203

Neste sentido, visto o atendimento dos itens acima, sugerimos o retorno dos autos à Secretaria de origem para prosseguimento do presente.

Atenciosamente,

Jeferson Teixeira Terra
Controlador Geral do Município
Portaria 2185 de 14/10/2019, BO nº 1006
